

システムバス 御見積書

御名前 東北-郡山SR SB3 様

業者 様

商品名 PREDECENCIA プレデンシア

商品
御見積金額 ￥2,344,600 (税込 ￥2,579,060)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

作成日 2025年8月2日
プラン番号 7201A-2505-0407T
現場番号 C6432074

タカラスタANDARD株式会社
◆郡山営業所
福島県郡山市名郷田1丁目30
TEL 024-922-7617 / FAX 024-922-7823

◆郡山ショールーム
TEL 024-922-7617 / FAX 024-922-7630

※ 商品御見積金額には商品組付費と現場配送費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		央戸

◆ 御見積仕様	
《システムバス》	
ユニットサイズ	1620(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	ピエトラグレイジュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	ブランソルベ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ブランソルベ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ページュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ホワイトオニキス
パネルカラー(周辺)	アウリジーナフィオリート
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

- ◆ 御確認事項
- ☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます。
 - ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、又はカタログにてよくご確認下さいませ。
 - ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
 - ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

◆ 備考

御名前 東北-郡山SR SB3

様

現場番号	C6432074	プラン番号	7201A-2505-0407T	作成日	2025/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,314,000	1,314,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(20サイズ)	1	+14,500	+14,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・周辺プレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・ピエトラグレイジュ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシヤスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
16	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
17	洗い場用水栓	ヒロカルシャワー(手元止水):SB280LABHK	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	クォーツストーンカウンター	1	+138,000	+138,000
20	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
21	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
22	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺プレミアムクラス)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
23	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
24	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
25	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
26	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー/ライト対応用)	1	+91,000	+91,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+139,000	+139,000
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		

御名前 東北-郡山SR SB3 様

現場番号	C6432074	プラン番号	7201A-2505-0407T	作成日	2025/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	クリアタイプ クリア	1		
33	ハンドバー	メタル I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
34	収納棚	収納棚なし	1	-17,000	-17,000
35	どこでもラック	風呂フタフック(ホワイテ)	1	+2,100	+2,100
36	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
37	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
38	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
39	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
40	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			40		¥2,090,100

商品総合計	40	¥2,090,100
-------	----	------------


商品組付費		数量	金額
1	本体組付費	1	246,500
商品組付費合計			¥246,500

その他費用		数量	金額
	現場配送費	1	8,000
配送費他合計			¥8,000


商品御見積金額	¥2,344,600
---------	------------

- ※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
- ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
- 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

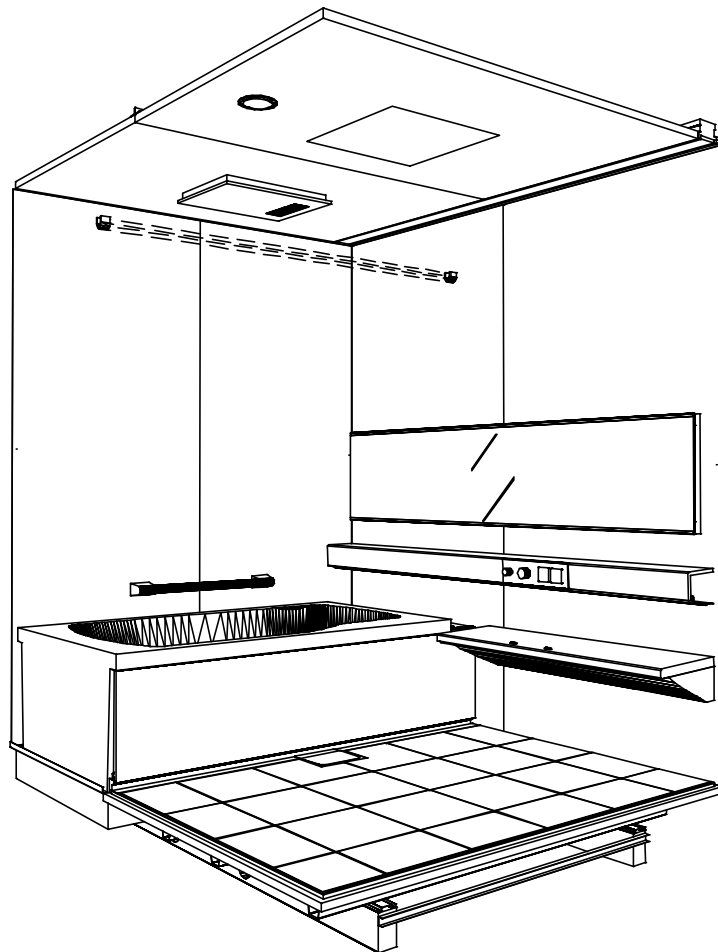

鳥瞰図

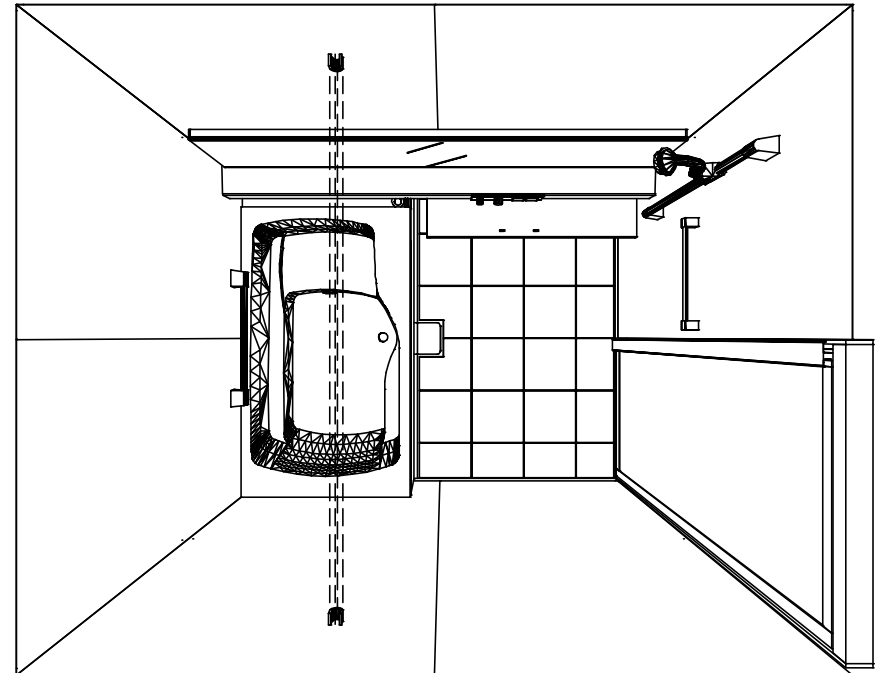

1620

フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 東北-郡山SR SB3様邸

現場番号： C6432074

郡山営業所

PREDENCIA プレデンスシア

プラン番号： 7201A-2505-0407T

担当営業：

姿図

作成日： 2025年8月2日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

カウンター面



浴槽側面

洗面側面


カウンター前面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法 18mmを含みます。

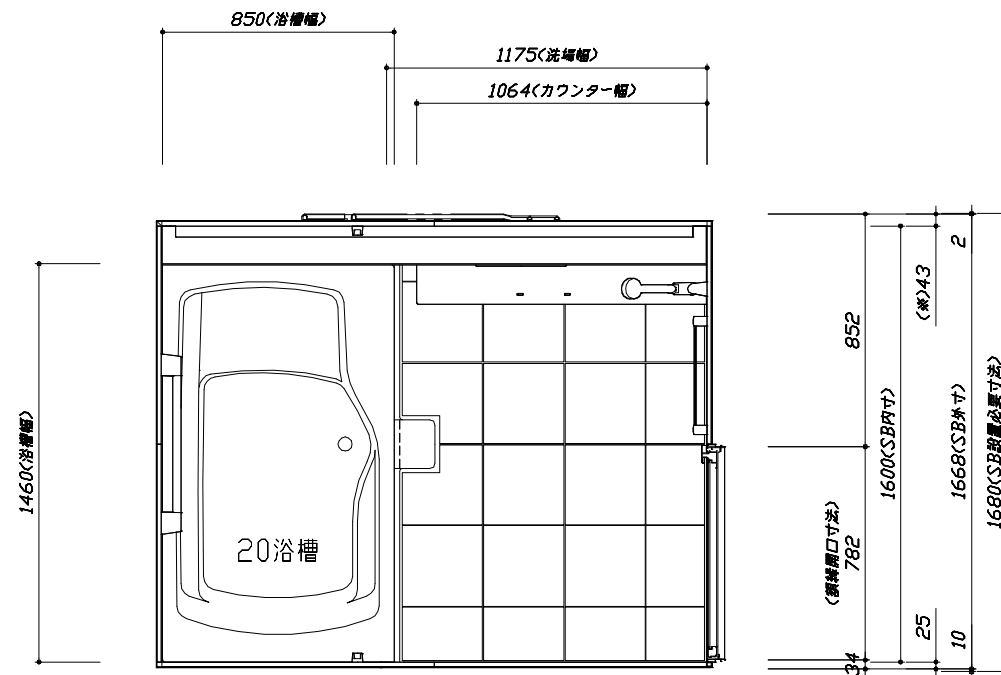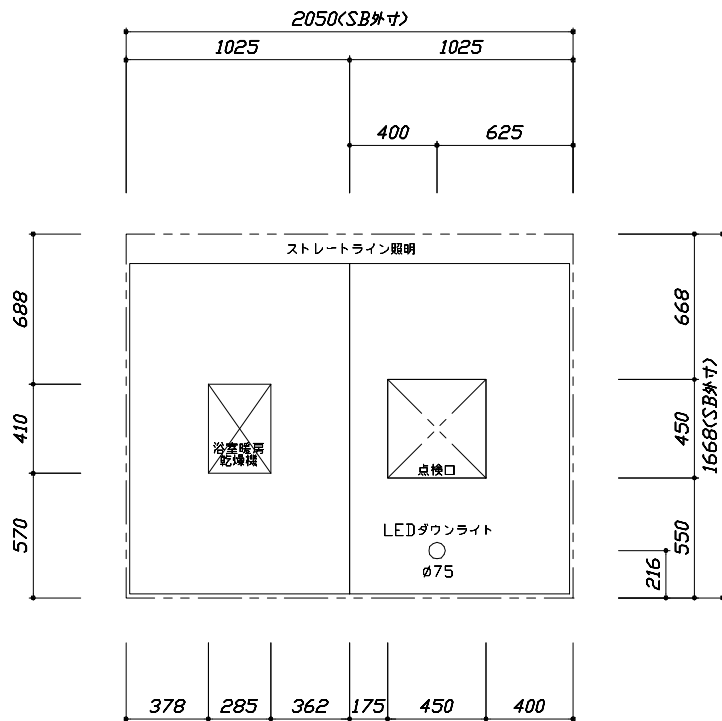

< 天井伏図 >

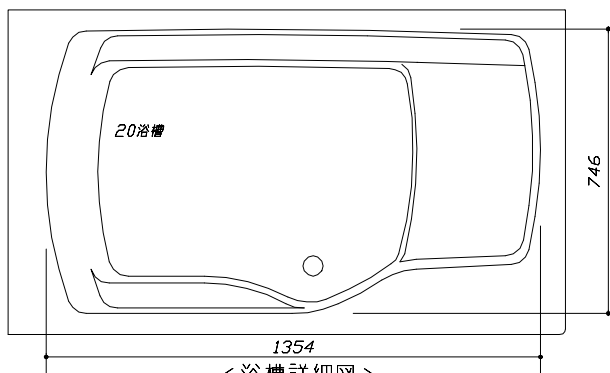

< 浴槽詳細図 >



< 平面図 >

Takara standard
タカスタンダード株式会社



現場名称： 東北一郡山SR SB3様邸
現場番号： C6432074
郡山営業所

PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 7201A-2505-0407T
担当営業：


施工図1
縮 尺： 1:25,20
作成日： 2025年8月2日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

・のレギュラーオプションは各図面ですべての屋根・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼書、設置業者の方に必ず確認し頂きますようお願いいたします。
 ・土間は茶台図面より下のクリア方法を考慮して仕上げてください。
 ・ドラァングル下道とSBFLの段差は8mmに仕上げます。
 ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
 ・天井の寸法はご確認願います。
 ・外寸は突出部を含みます。
 ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

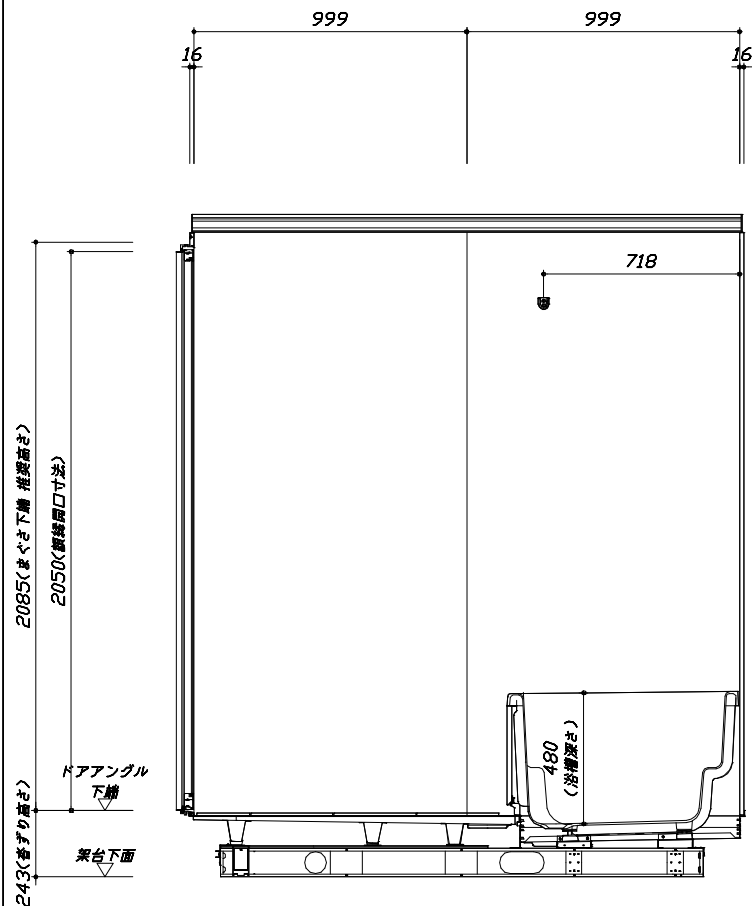

<カウンタ-対面図>


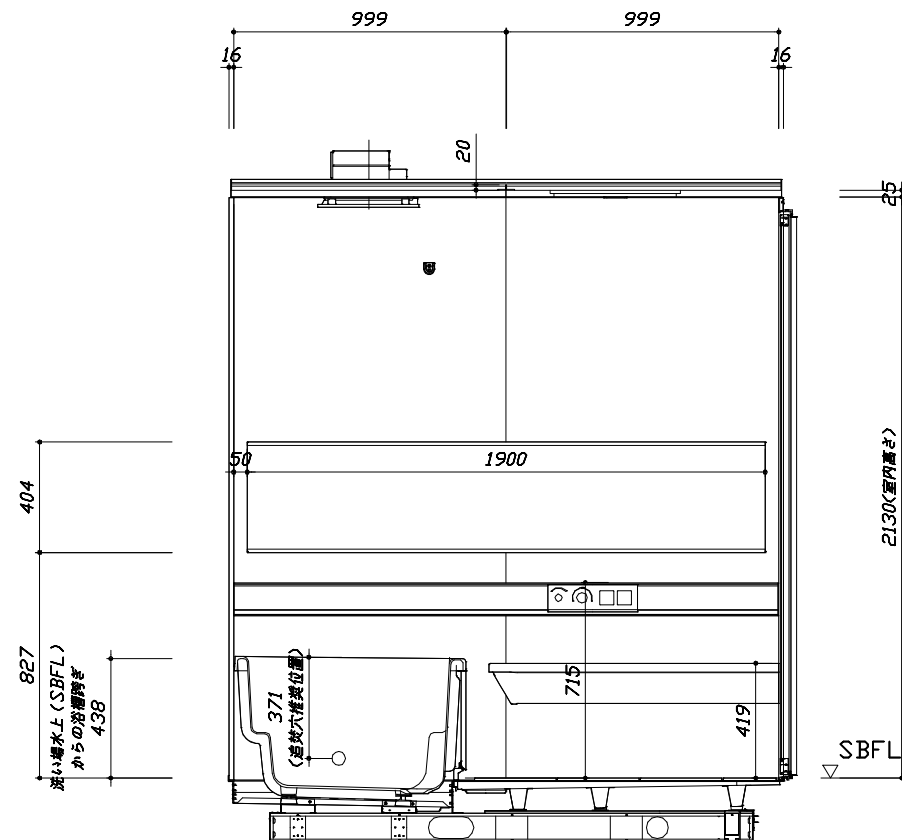


＜カウンタ一面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間：架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

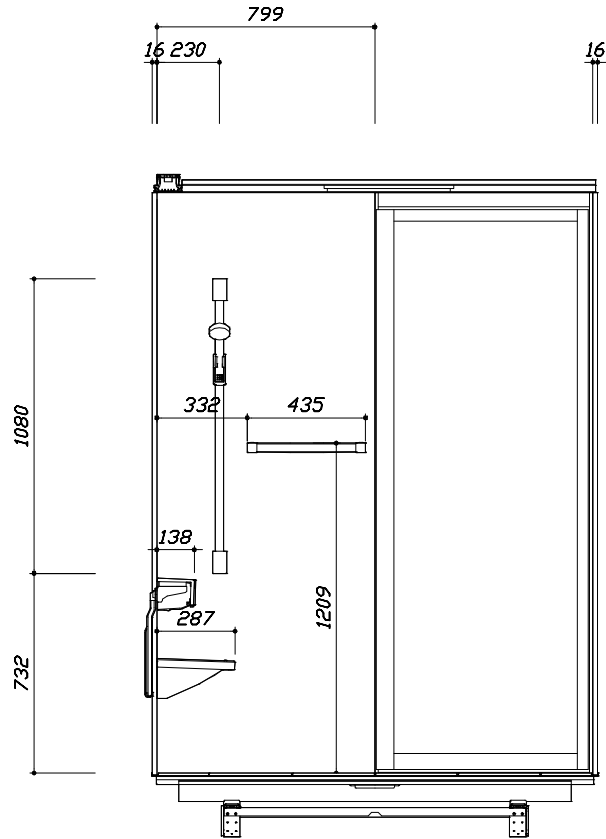

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

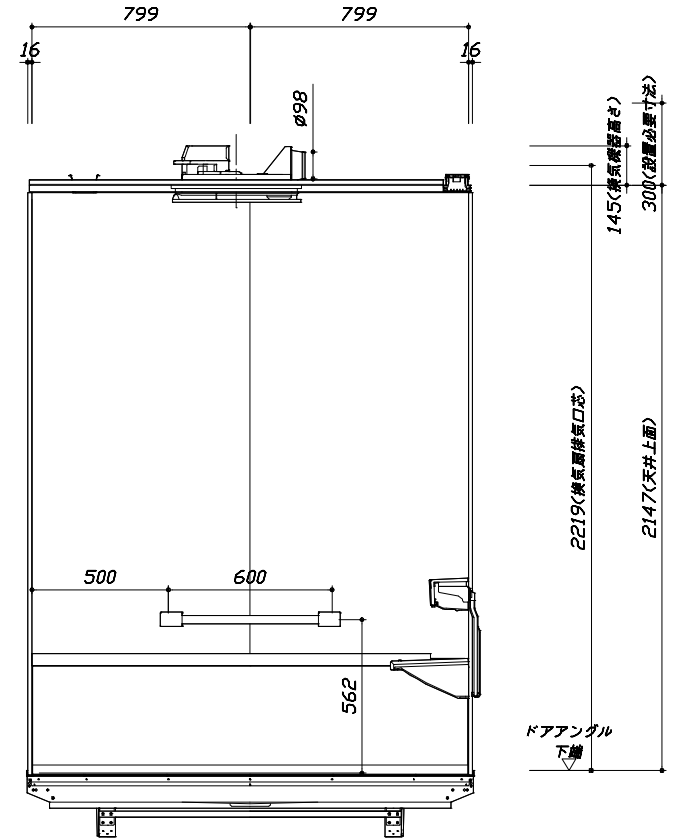

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東北一郡山SR SB3様邸
現場番号： C6432074
郡山営業所


PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 7201A-2505-0407T
担当営業：

施工図3 縮 尺： 1:20
作成日： 2025年8月2日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

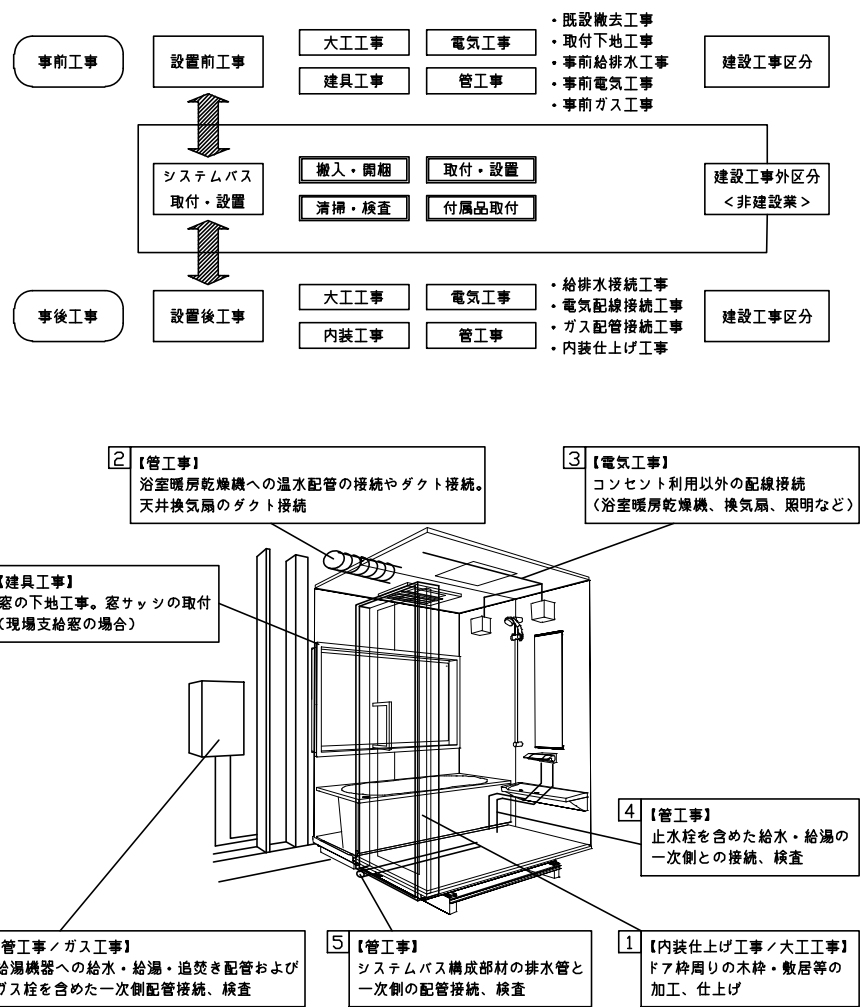


■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
	建設工事 外区分		架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トロッパ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トロッパ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 2 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
			内装仕上げ工事	○	○						床、ドア廻縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりて打設してください。



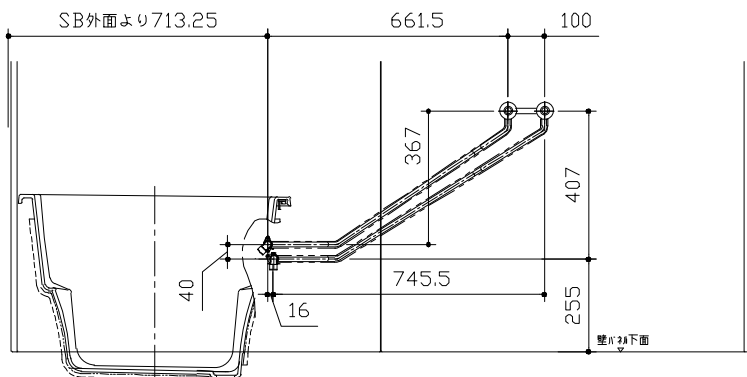


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

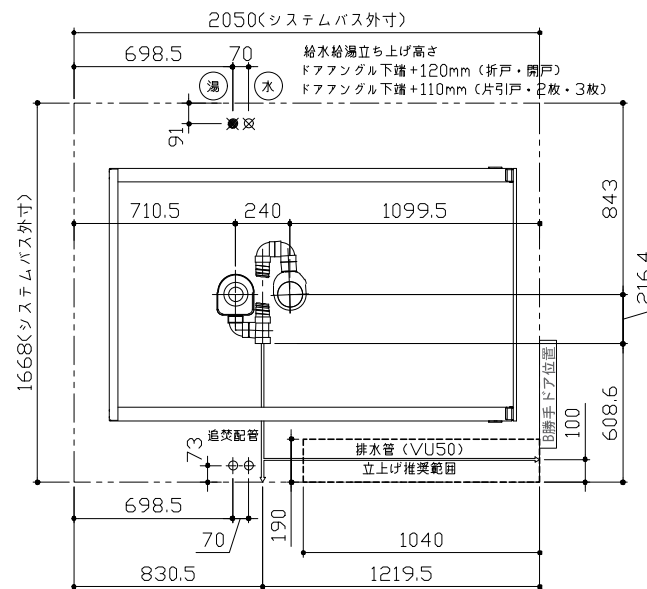

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

Takara standard
タカラストANDARD株式会社

現場名称： 東北一郡山SR SB3様邸
現場番号： C6432074
郡山営業所

PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 7201A-2505-0407T
担当営業： 担当アドバイザー：

排水配管図
作成日： 2025年8月2日





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

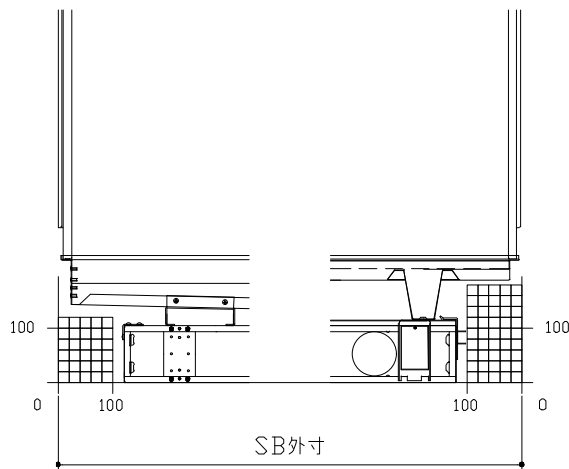


A矢視

B矢視

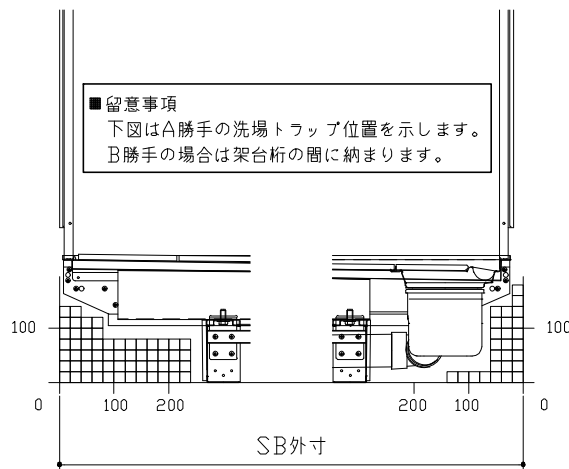

C矢視



D矢視

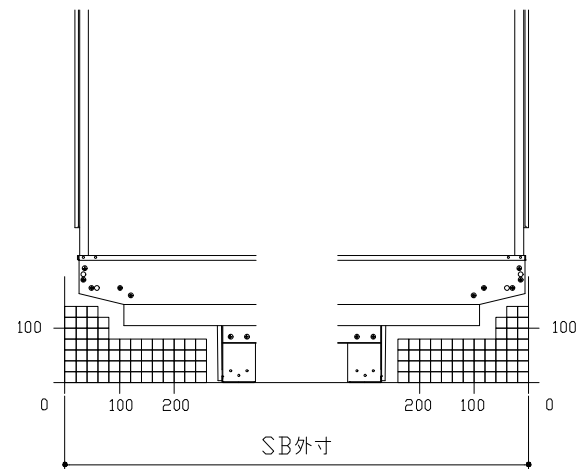


E矢視

F矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

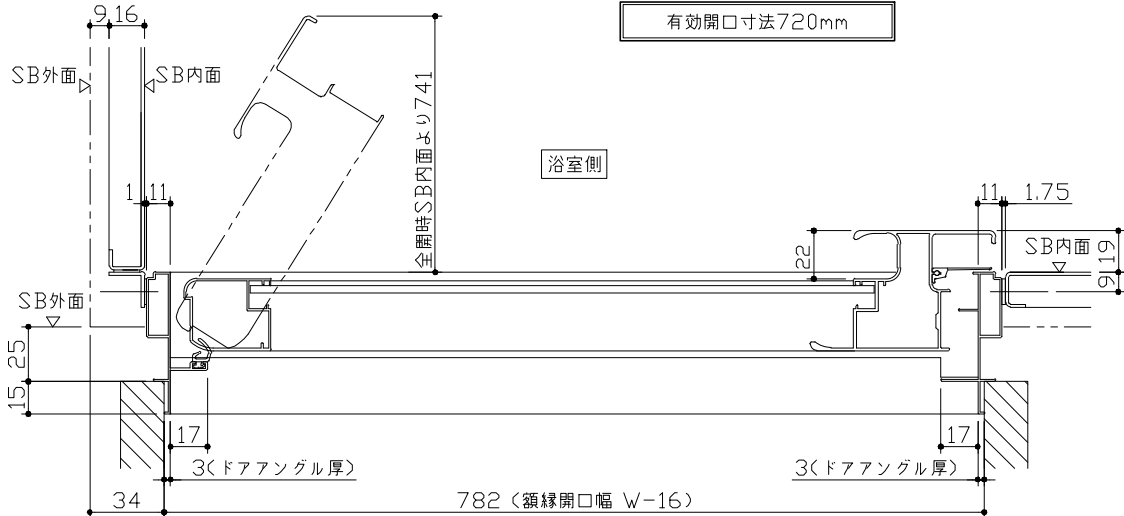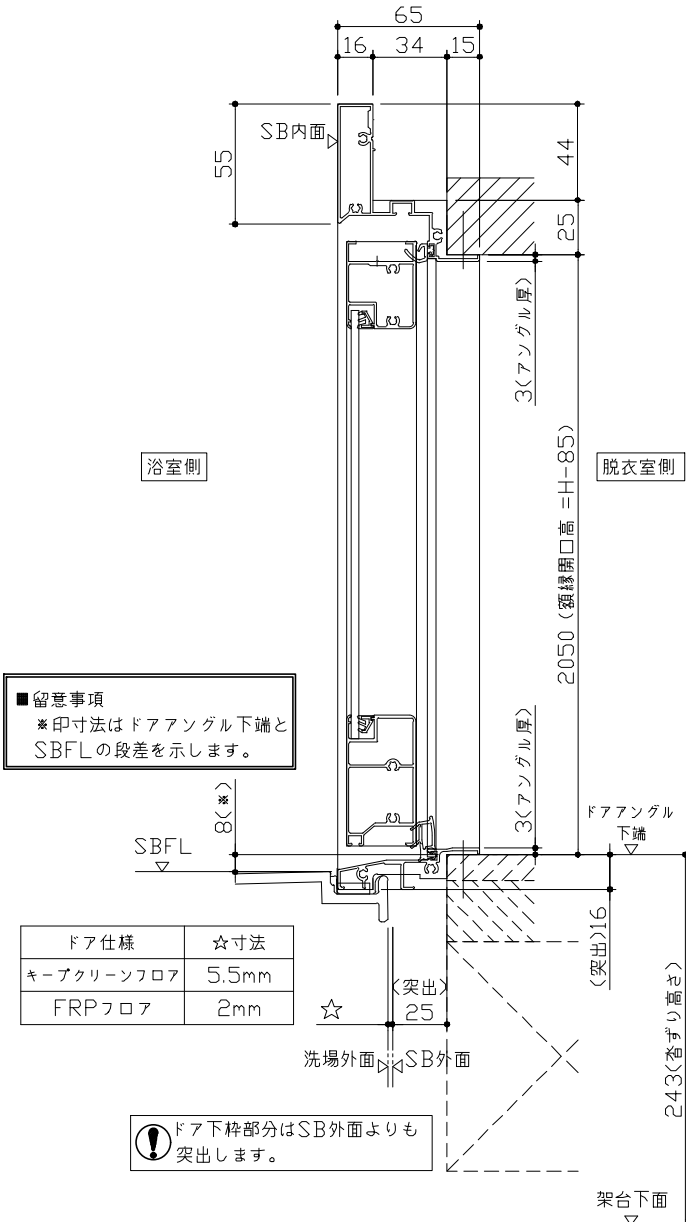


ドア開き角度65°以上でタオル掛けと
干渉の恐れがあります。

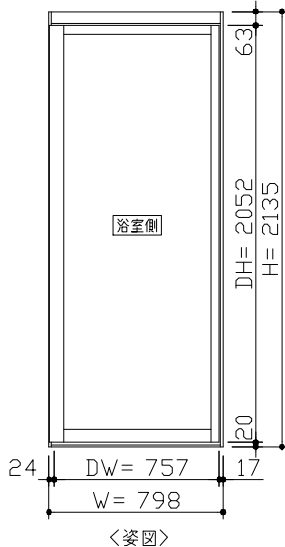


-

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



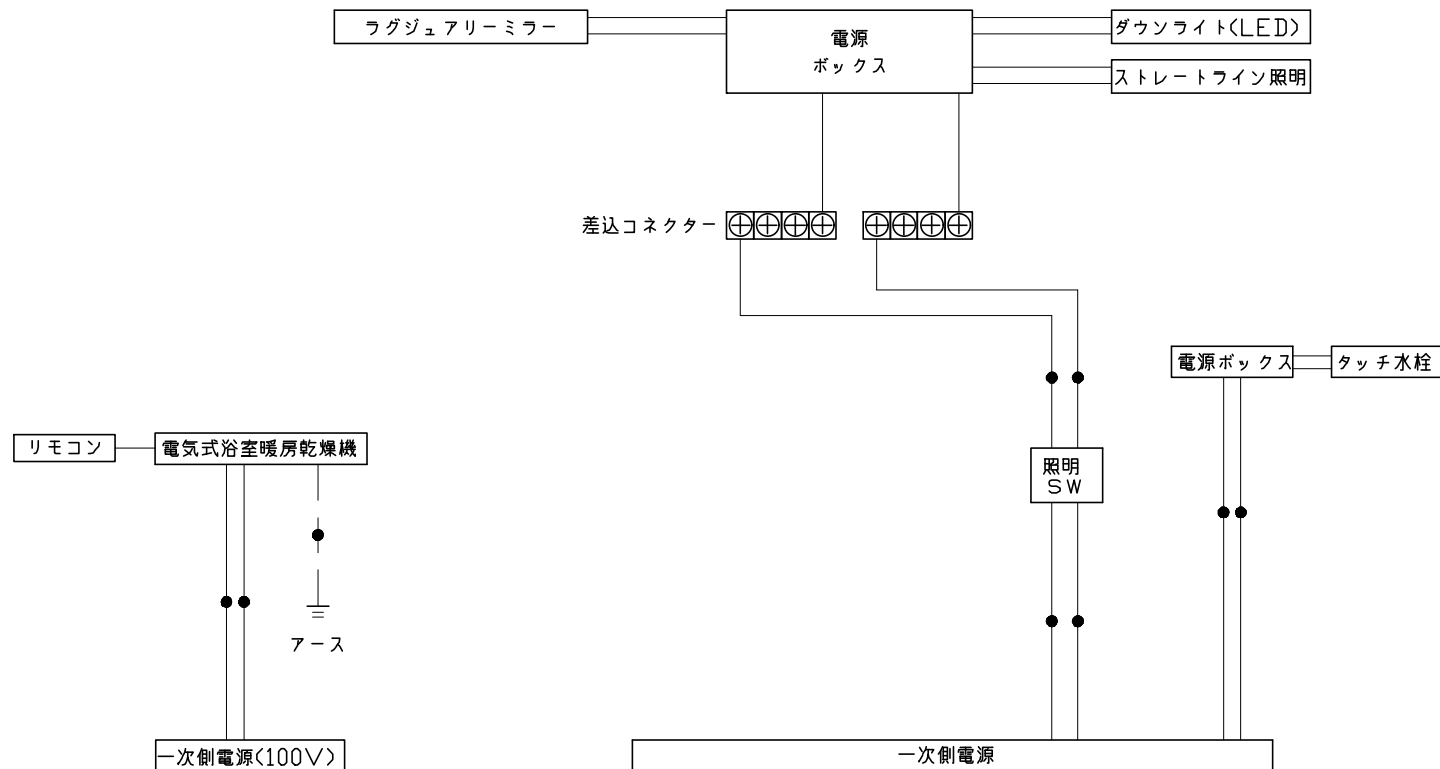

* 浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。



アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

[illegible]

Technical drawing of a sink water tap assembly, showing side and top views with dimensions and labels.

Side View (Left):

- 壁パネル内面 (177)
- ハンドル前面
- カウンタ前面
- PJ 1/2
- 6
- 60
- 62
- 59
- カラン吐水面
- G 1/2
- シャワーホース接続面
- 96
- 92
- 54
- 136

Top View (Right):

- 100
- PJ 1/2
- 87
- 90.5
- 64
- 100
- 160
- 245

照明

ストリートライン照明
LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)

天井厚み 25

100

40

2018

100

ダウンライト

φ75 (天井開口)

63.6

天井厚み 25

5.7

φ90

換気機器

リモコンコード長さ: 5m
 外形: 縦120mm×横116mm

管工事

The diagram illustrates the dimensions of a ventilation unit in two views:

- Front View (Top):** Shows a unit with a total width of 280 mm (body dimension) and a base width of 372 mm (grill). A central circular duct has a diameter of $\phi 100$ mm. The unit is mounted on a ceiling with a thickness of 25 mm.
- Side View (Bottom):** Shows the unit's profile with a total height of 145 mm (body dimension) and a base height of 38 mm. The side grill has a height of 72 mm (exhaust). The unit is mounted on a ceiling with a thickness of 25 mm. The base width is 400 mm (body dimension) and 472 mm (grill). The label "システムバス天井" (System Bath Ceiling) is present on the left.

シャワーフックスライドバー

材質
 パイプ部: ステンレス
 台座部: ABS、POM等
 フック部: ABS等

取付部分詳細

パネル表面
 皿タッピンネジ

ミラー

材: SUS304 t0.8、PMMA
ミラー: 表面防曇コートあり
LED: 13W

The technical drawing illustrates the dimensions of a mirror unit. The front view shows a main rectangular mirror area with a width of 1900 mm (labeled '鏡本体') and a height of 400 mm (labeled '鏡本体'). The mirror is divided into sections with widths of 79 mm, 570 mm, 601.5 mm, 570 mm, and 79 mm. The total width of the unit, including side panels, is 305 mm. The side view shows a total depth of 41 mm, with a 5 mm gap (labeled '5 (隙)') between the mirror and the side panel. The side panel has a thickness of 359 mm. The unit is labeled '(取付穴ピッチ)' for mounting hole pitch.

1900 (鏡本体)

400 (鏡本体)

79 570 601.5 570 79

305

359

14.5

(取付穴ピッチ)

41

5 (隙)

(取付穴ピッチ)

パネル割図		ミラー		シャワーフックスライドバー	
ΛK20C2D 0999 R<JWX ΛK20C1D 0999 L<JWX ΛK16NW 0799 <JAF ΛK16NW 0799 <JAF ΛK18AD 0999 <JAF ΛK18B 0999 <JAF ΛK16A 0799 <JAF BL勝手		ΛK20C2D 0999 R<JWX ΛK20C1D 0999 L<JWX ※ : 現地加工φ18 ※ : 現地加工φ3.5 870 300 300 870 1224 1050 865		ΛK16A 0799 <JAF 799 214 33 33 33 33 754 1774 現地加工 : φ3.5	
ランドリーパイプ		タオル掛け			
ΛK20C1D 0999 L<JWX ΛK18AD 0999 <JAF 999 250 266 718 現地加工 : φ3.5		ΛK16A 0799 <JAF 799 450 50 1200 現地加工 : φ3.5 ■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称 : 東北一郡山SR SB3様邸 現場番号 : C6432074 郡山営業所		PREDENCIA プレデンスシア プラン番号 : 7201A-2505-0407T 担当営業 :	
				穴開け指示図 1/1 作成日 : 2025年8月2日 担当アドバイザー :	
