

システムバス 御見積書

御名前 東北-郡山SR SB5 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

商品
御見積金額 **¥1,266,000** (税込 ¥1,392,600)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

作成日 2025年8月2日
プラン番号 7201A-2505-0408T
現場番号 C6304875

タカラスタANDARD株式会社
◆郡山営業所
福島県郡山市名郷田1丁目30
TEL 024-922-7617 / FAX 024-922-7823

◆郡山ショールーム
TEL 024-922-7617 / FAX 024-922-7630

※ 商品御見積金額には商品組付費と現場配送費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616 (AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	チェッポビアンコ
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	ー
カウンター/下カバーカラー	ー
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

☆御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2週間程度いただきます。
☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、又はカタログにてよくご確認下さいませ。
☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		央戸

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 東北-郡山SR SB5

様

現場番号	C6304875	プラン番号	7201A-2505-0408T	作成日	2025/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	769,000	769,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン/周辺レギュラークラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・チェッポビアンコ)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレー	1	+199,000	+199,000
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9032HT 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1	-8,000	-8,000
19	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032HT	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-37,000	-37,000
22	シャワーフック	シャワーフックKJ	1	+2,000	+2,000
23	シャワーフックスライドバー	なし	1	-5,000	-5,000
24	浴室パネル	プレミアムクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	+15,000	+15,000
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプなし	1	-2,800	-2,800
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(昼白色)	1	+41,000	+41,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 東北-郡山SR SB5 様

現場番号	C6304875	プラン番号	7201A-2505-0408T	作成日	2025/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ミラーなし	1	-18,000	-18,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
37	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホホワイト)	1	+4,000	+4,000
38	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
39	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
40	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
41	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
42	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
システムバス合計			42		¥1,073,000

商品総合計	42	¥1,073,000
-------	----	------------


商品組付費			数量	金額
1	本体組付費		1	185,000
商品組付費合計				¥185,000

その他費用			数量	金額
	現場配送費		1	8,000
配送費他合計				¥8,000


商品御見積金額	¥1,266,000
---------	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

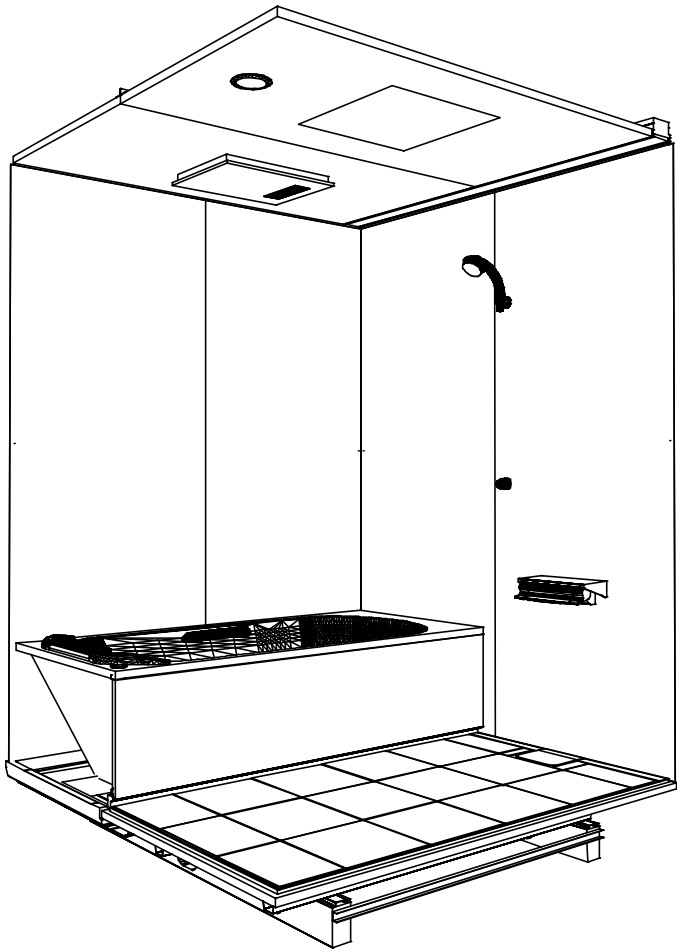


鳥瞰図

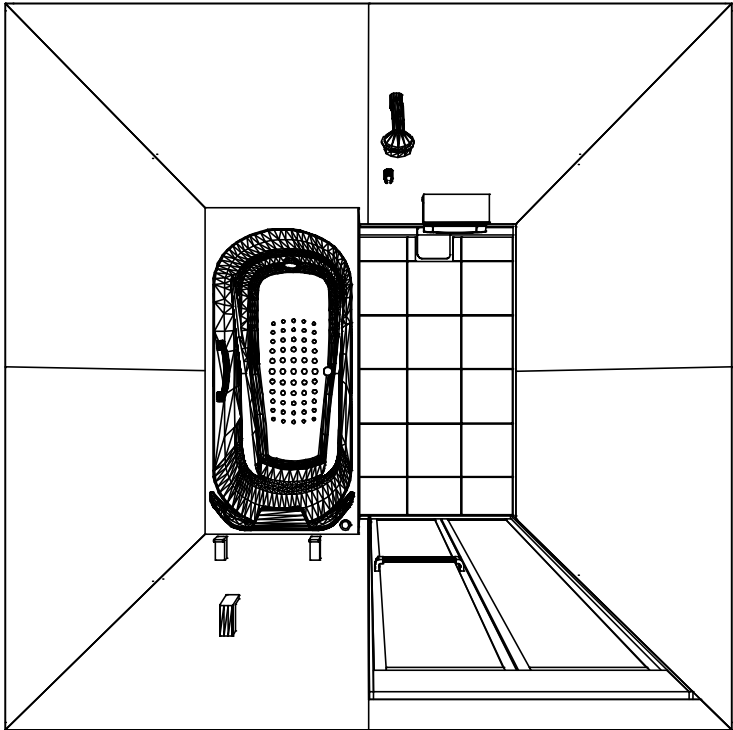


1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。





■ 留意事項
※ 印寸法は給水給湯管の
突出寸法 18mm を含みます。

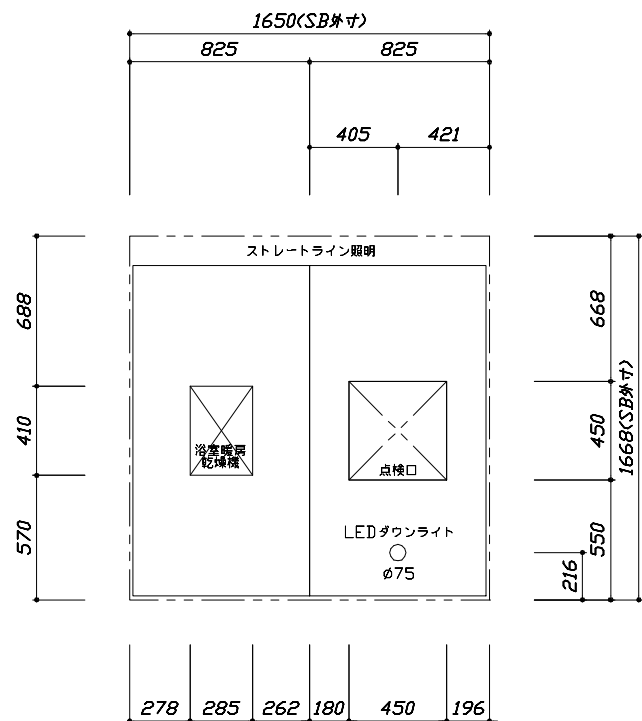

< 天井伏図 >

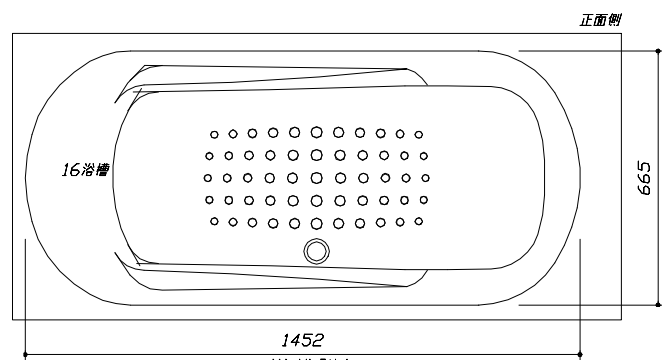

< 浴槽詳細図 >

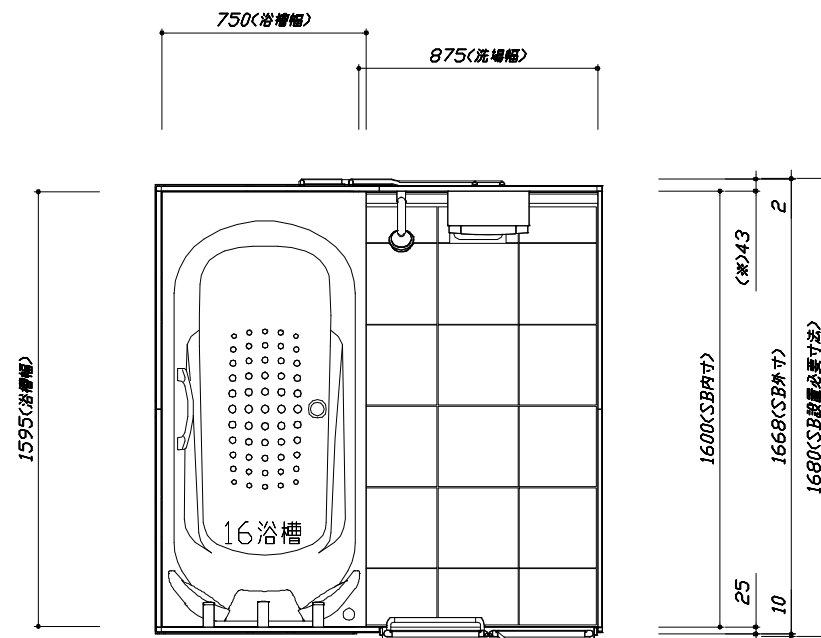

< 平面図 >

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 東北一郡山SR SB5様邸
現場番号： C6304875
郡山営業所



GRANSPA グランspa
プラン番号： 7201A-2505-0408T
担当営業：

施工図1
縮 尺： 1:25,20
作成日： 2025年8月2日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

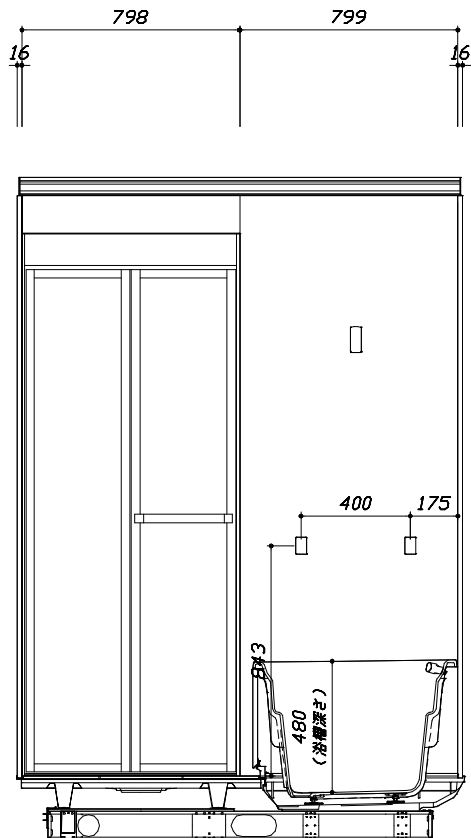

<カウンター対面図>



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

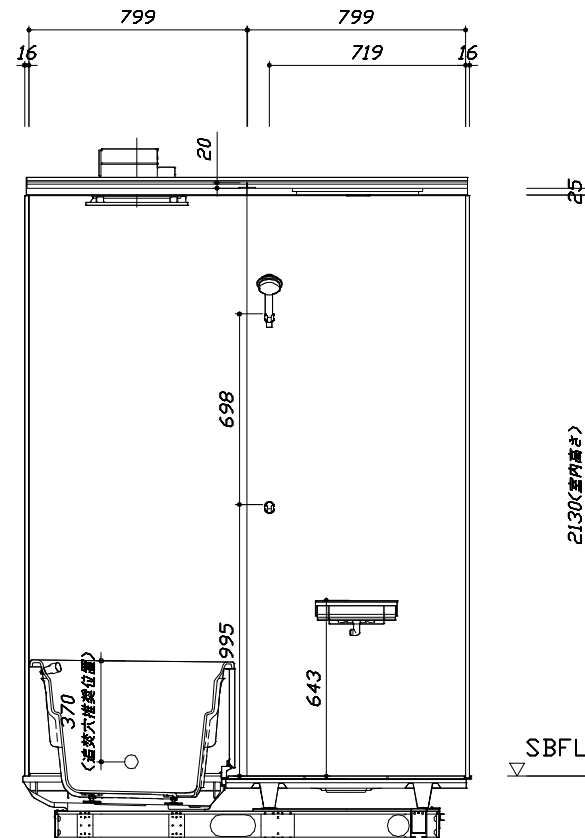

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間とは架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

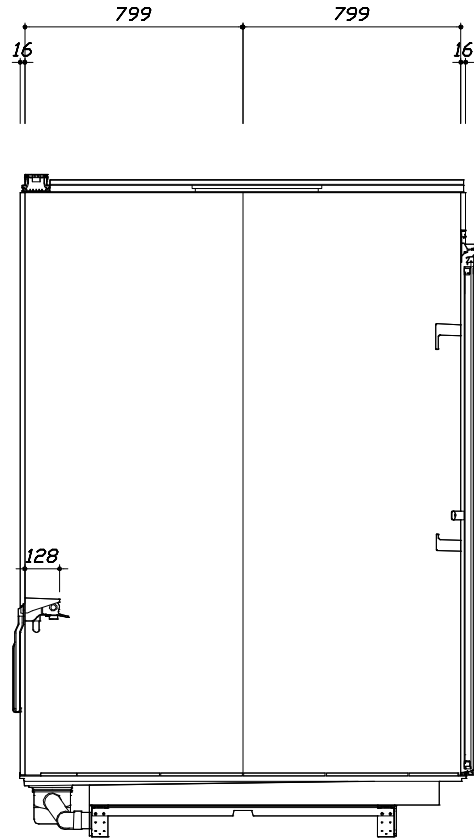

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

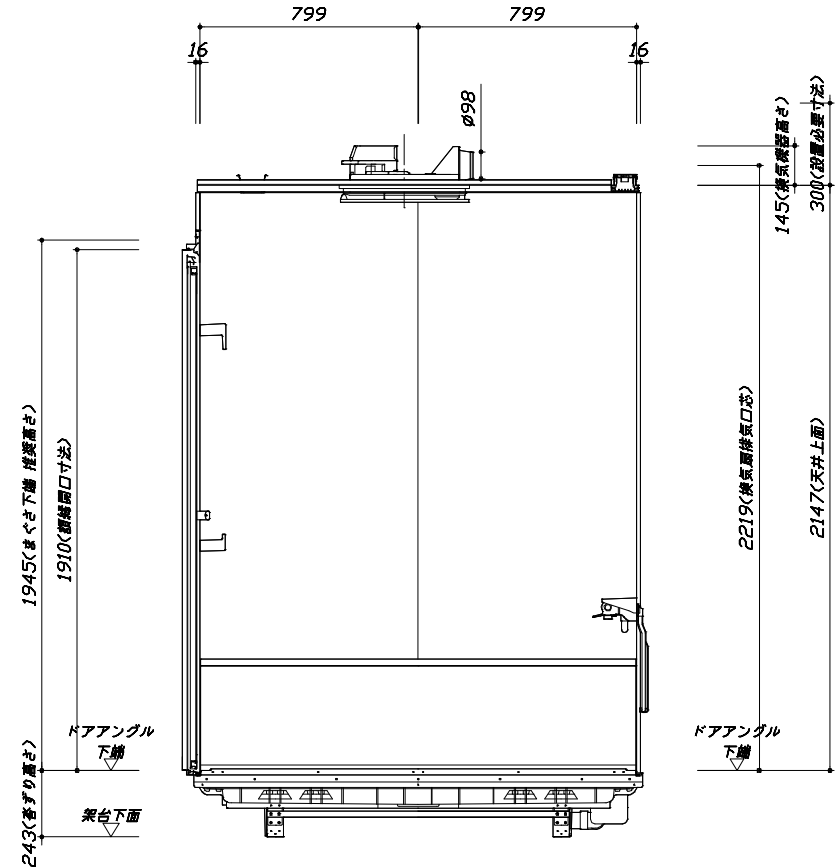

< 浴槽側面図 >

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東北一郡山SR SB5様邸
現場番号： C6304875
郡山営業所


GRANSPA グランスパ
プラン番号： 7201A-2505-0408T
担当営業：

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2025年8月2日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。


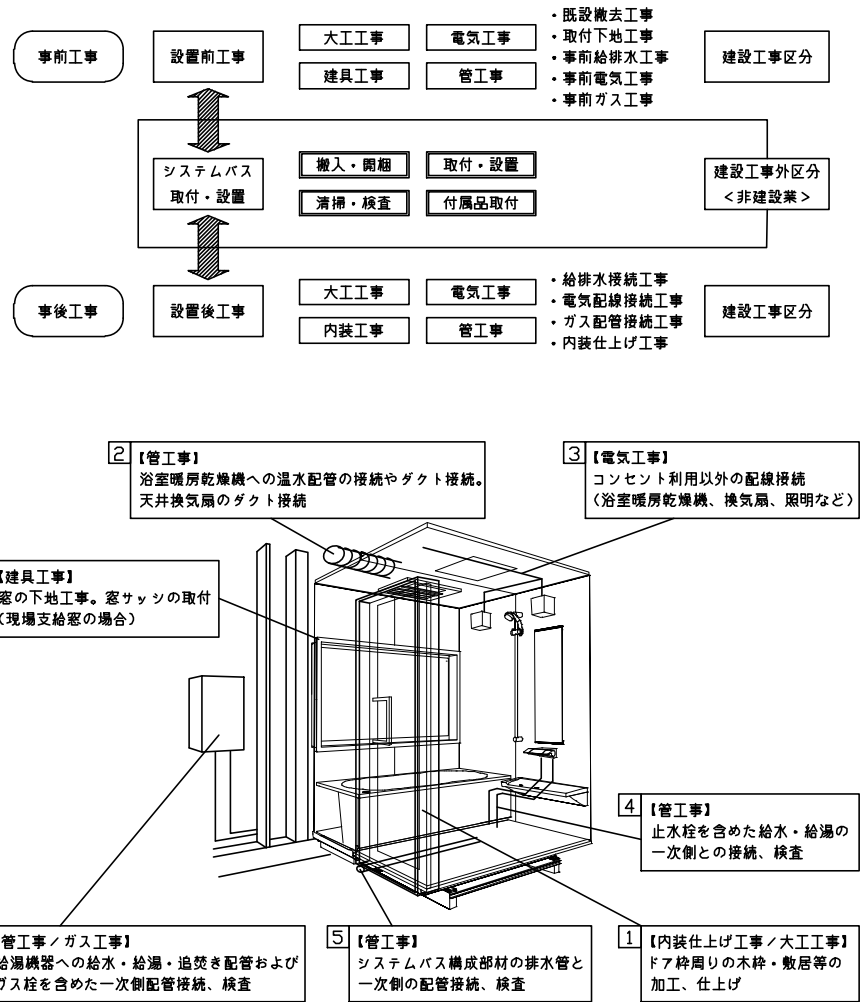


■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
	建設工事 外区分		架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トランプ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トランプ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
	1 2 3 4 5 6 1 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
		管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
		管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
			内装仕上げ工事	○	○						床、ドア鉗縁、脱衣室仕上げ工事
		電気 他	浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。
- 貫通スリーブを使用する場合は45度エルボなどを接続し、バンドなどで固定してください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。



■ 土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。



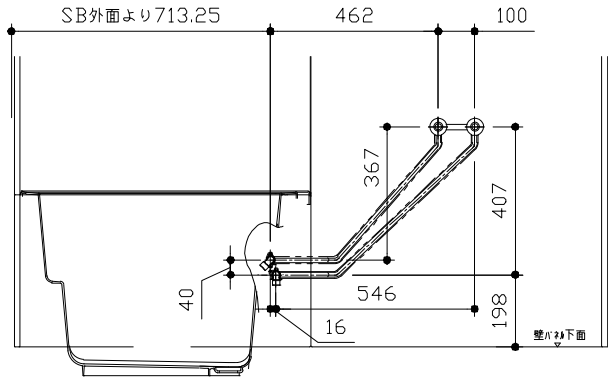


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

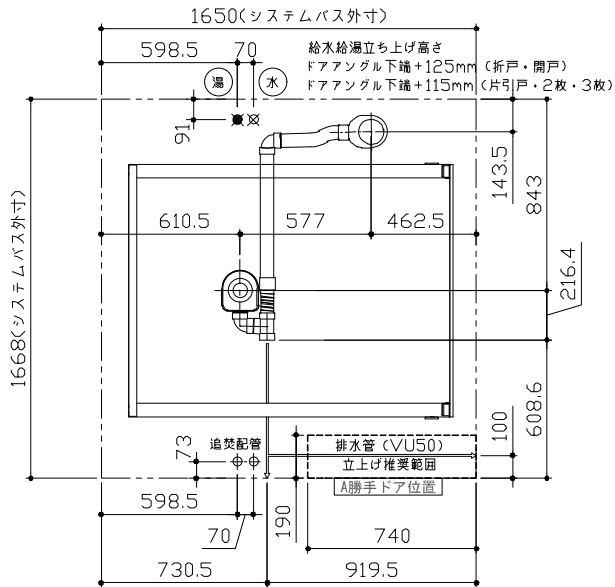

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

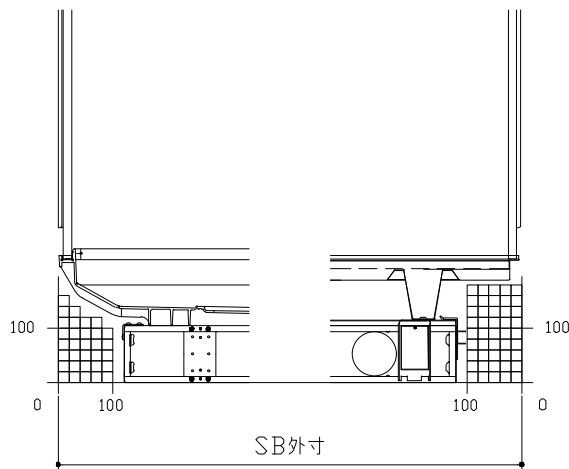


A矢視

B矢視

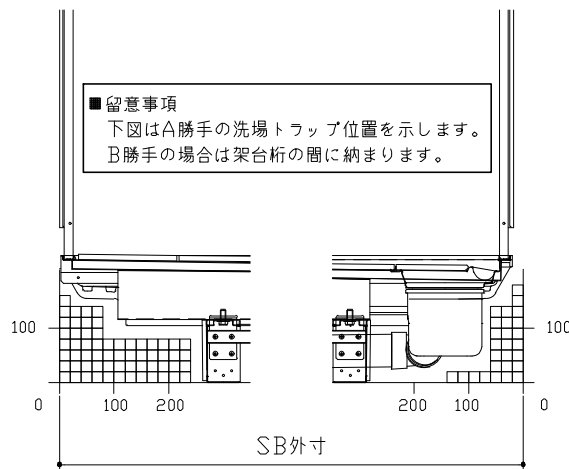

C矢視




D矢視

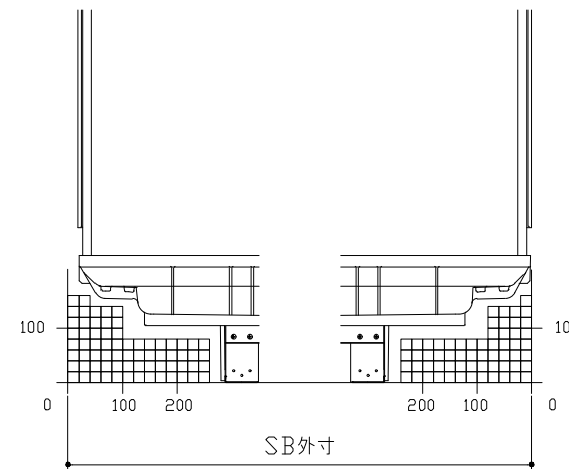

E矢視


F矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

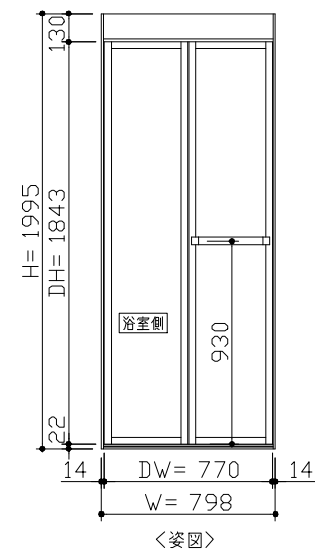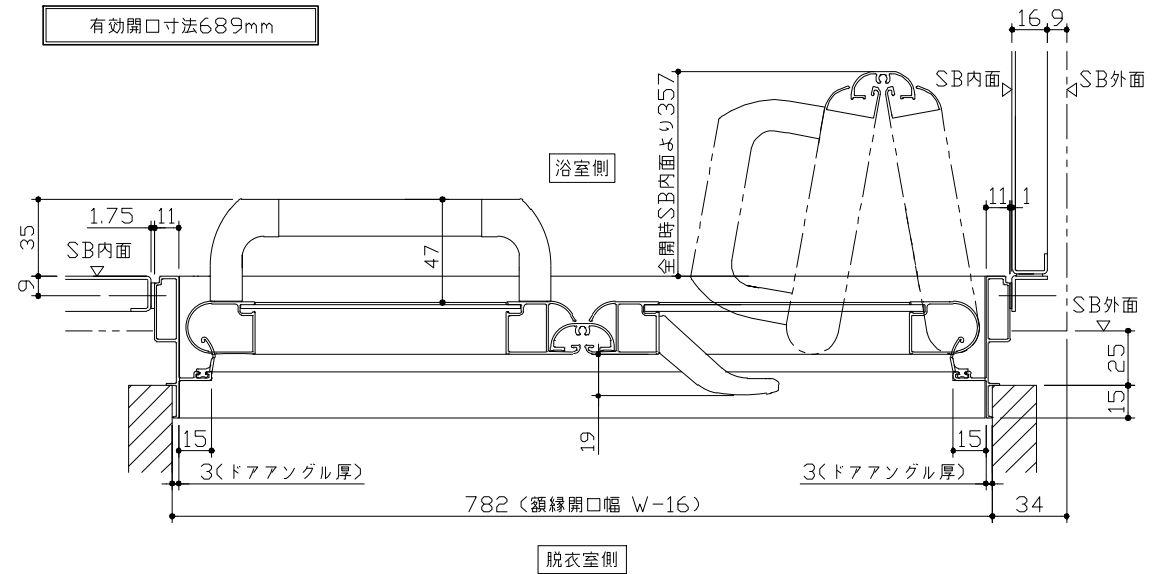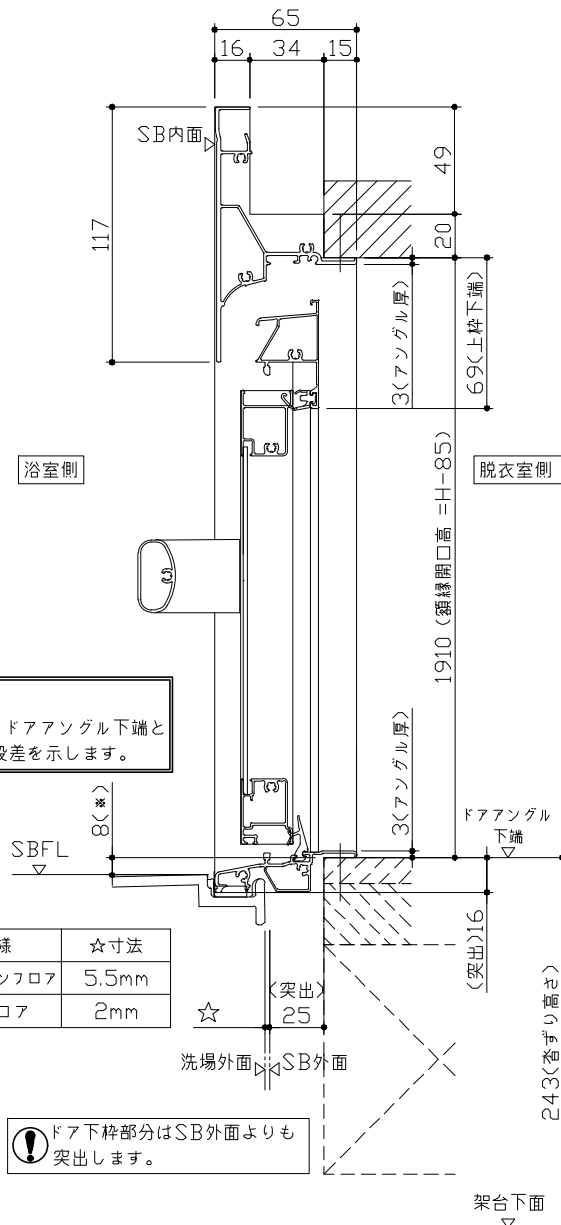

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



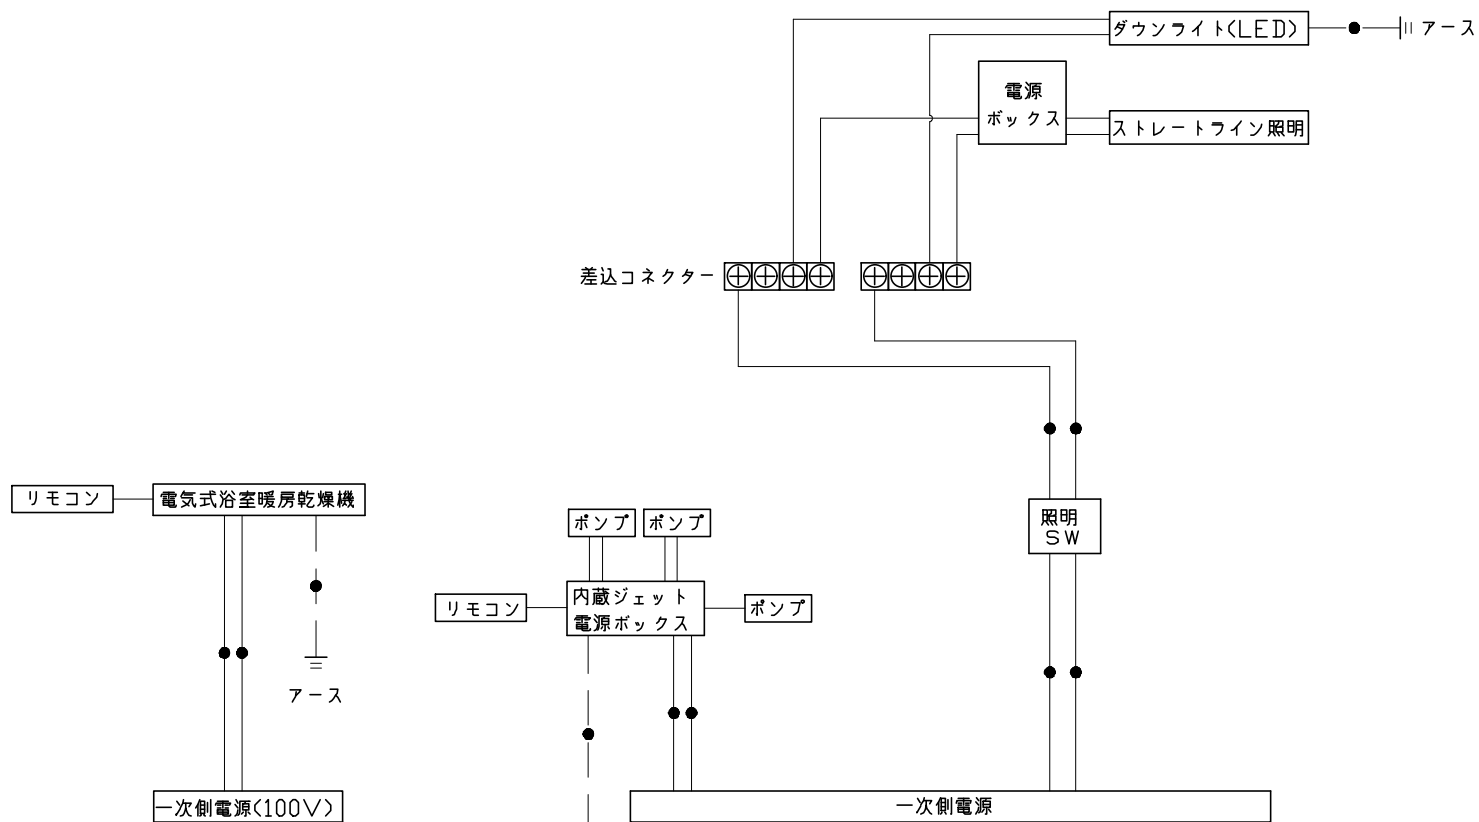

* 浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽

L 1452

B 1134 (底面)

A 180

750
665
451 (内面)
200

(ジェット 噴出口)
ジェットバス選択時

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法		
	L	A	B
1593	1520	32.5	35.5
1618	1545	57.5	
1643	1570	82.5	
1668	1595	107.5	
1693	1620	120	48
1718			
1743			
1768			
1793			
1818			
1843			
1868			

規格

25

877.5

502

365
280
330
370

φ50

(循環金具穴)
うろばろ 湯道選択時

(ジェット 噴出口)
ジェットバス選択時

(ジェット 取水口)
ジェットバス選択時

418 (高さ寸法)

480

本図は参考図面です

洗い場用水栓

The technical drawing illustrates the dimensions for a sink faucet (洗い場用水栓). It includes a front view on the left and a side view on the right.

Front View Dimensions:

- Overall width: 300
- Three equal segments: 100, 100, 100
- Mounting hole: M22x2

Side View Dimensions:

- Overall height: 117
- Mounting plate height: 78.5
- Spout height: 35.5
- Spout length: 127.5
- Spout diameter: $\phi 160$
- Spout base diameter: $\phi 105$
- Spout base width: 56
- Spout base height: 45.5
- Spout base material: P J1/2
- Overall width: 605
- Panel bottom: パネル下面

照明

ストレーtrightライン照明
LED 17.2W

天井厚み 25
100
40
100
1618
100

ダウンライト
LED 4.1W (1灯あたり)

φ75 (天井開口)
64
φ85
3
天井厚み 25

Technical drawing of the H-1000 ventilation unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 280 (本体寸法)
- Overall height: 372 (グリル)
- Top flange thickness: 25
- Top flange width: 天井厚み
- Central duct diameter: $\phi 100$ 接続

Side View Dimensions:

- Overall width: 400 (本体寸法)
- Overall height: 72 (排気)
- Top flange thickness: 25
- Top flange width: 天井厚み
- Bottom flange thickness: 38
- Bottom flange width: システムバス天井
- Internal height: 145 (本体寸法)
- Overall width including base: 472 (グリル)

循環金具・フロアダプタ関連

銅管アダプタ
15A タケノコ仕様

15A タケノコ仕様

2100

ハイブリッドツインホース

追焚配管立上図

風呂蓋 707MDVH-16KT

The drawing shows a rectangular bathtub lid with a central vertical hinge line. The overall width is 1482, divided into two 741 sections. The height is 716. A side view shows a thickness of 50. A cross-section view shows a U-shaped profile with dimensions: 16 (top flange), 14.6 (inner width), 7.4 (bottom flange), and 20 (total height).

50

741 741 1482 716

16 14.6 7.4 20

断面図

洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ		肩包み湯①															
				リモコン (浴室内設置) ポンプ (浴槽に組み付け) 電源ボックス (天井上設置) 2カ所連続ジェットポンプ仕様 <table><tr><td>ポンプ品番</td><td>HJPN-100K</td></tr><tr><td>電源電圧</td><td>AC100V</td></tr><tr><td>周波数</td><td>50/60 Hz共通</td></tr><tr><td>流量</td><td>36 L/min</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>130W</td></tr><tr><td>騒音</td><td>定格運転時にて15μ以下</td></tr><tr><td>常用使用温度範囲</td><td>45℃</td></tr></table>※朝日興業製		ポンプ品番	HJPN-100K	電源電圧	AC100V	周波数	50/60 Hz共通	流量	36 L/min	消費電力	130W	騒音	定格運転時にて15μ以下	常用使用温度範囲	45℃
ポンプ品番	HJPN-100K																		
電源電圧	AC100V																		
周波数	50/60 Hz共通																		
流量	36 L/min																		
消費電力	130W																		
騒音	定格運転時にて15μ以下																		
常用使用温度範囲	45℃																		
肩包み湯②		肩包み湯③																	
現地組付け部材 クッションピロー (浴槽に組付け) 本体：発泡PE 肩湯セットK (浴槽に組付け) 本体：SAS		【工事範囲】 当社工事範囲 1. 電源ボックスの取付 2. ポンプ電源ケーブルの配線及びポンプユニットと電源ボックスの接続 3. 電動弁ケーブルの配線及び電動弁と電源ボックスの接続 4. リモコンケーブルの配線、電源ボックス及びリモコンの接続 5. リモコンの取付 電気工事業者様 工事範囲 1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続 2. アース工事 3. 電源回路に漏電遮断機の設置 ■留意事項 (1) ポンプユニットは、工場で浴槽に組み付けられています。 電気工事																	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 東北一郡山SR SB5様邸 現場番号： C6304875 郡山営業所		GRANSPA グランspa プラン番号： 7201A-2505-0408T 担当営業：															
				部材詳細図 2/2 作成日： 2025年8月2日 担当アドバイザー：															

パネル割図 ↑ AR勝手 ↑	シャーフック 現場加工：φ3.5	洗い場水栓取付穴 現場加工φ33-2か所 ・：現場加工φ6-4か所	
風呂蓋収納 現場加工：φ3.5 ■留意事項 タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：東北一郡山SR SB5様邸 現場番号：C6304875 郡山営業所	GRANSPA グランspa プラン番号：7201A-2505-0408T 担当営業：	穴開け指示図 1/1 作成日：2025年8月2日 担当アドバイザー：
