

システムバス 御見積書

御名前 北陸-能登SR SB3 様

業者 様

商品名 PREDECENCIA プレデンシア

商品
御見積金額 ￥1,932,200 (税込 ￥2,125,420)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥235,000 (税込 ￥258,500)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランベージュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	ブランソルベ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ブランソルベ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	パールミルフィュー
パネルカラー(周辺)	ツイードベージュ
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

- ◇2022.8 展示
- ◇2023.8 価格改定
- ◇2024.8 エプロン仕様変更

作成日 2024年9月7日
プラン番号 1612G-2404-0155T
現場番号 C3465259

タカラスタンダード株式会社
◆能登ショールーム
石川県七尾市飯川町い66

TEL 0767-57-0062 / FAX 0767-57-0063

◆北陸支店 販売課
TEL 076-269-4400 / FAX 076-269-4499

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
能登SR		池島

◆ 備考

御名前 北陸-能登SR SB3

様

現場番号	C3465259	プラン番号	1612G-2404-0155T	作成日	2024/9/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,306,000	1,306,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台(高沓ずり)	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(20サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインプレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランベージュ)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
16	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
17	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド(節水+手元止水)	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	クォーツストーンカウンター	1	+138,000	+138,000
20	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
21	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
22	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインプレミアム)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
23	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
24	天井	カラーフラット天井(ベージュ)	1		
25	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ホワイト	1	+45,500	+45,500
26	換気機器	ランドリーパイプなし	1	-2,800	-2,800
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付)	1	+70,000	+70,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応)	1	+31,000	+31,000
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		

御名前 北陸-能登SR SB3 様

現場番号	C3465259	プラン番号	1612G-2404-0155T	作成日	2024/9/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000
33	収納棚	クリアタイプ クリア(2段)	1	-4,000	-4,000
34	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	なし	1		
37	ブロック積用ボンド	1段用	1	+1,000	+1,000
システムバス合計			37		¥1,932,200

商品総合計	37	¥1,932,200
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥235,000 (税込 ¥258,500)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

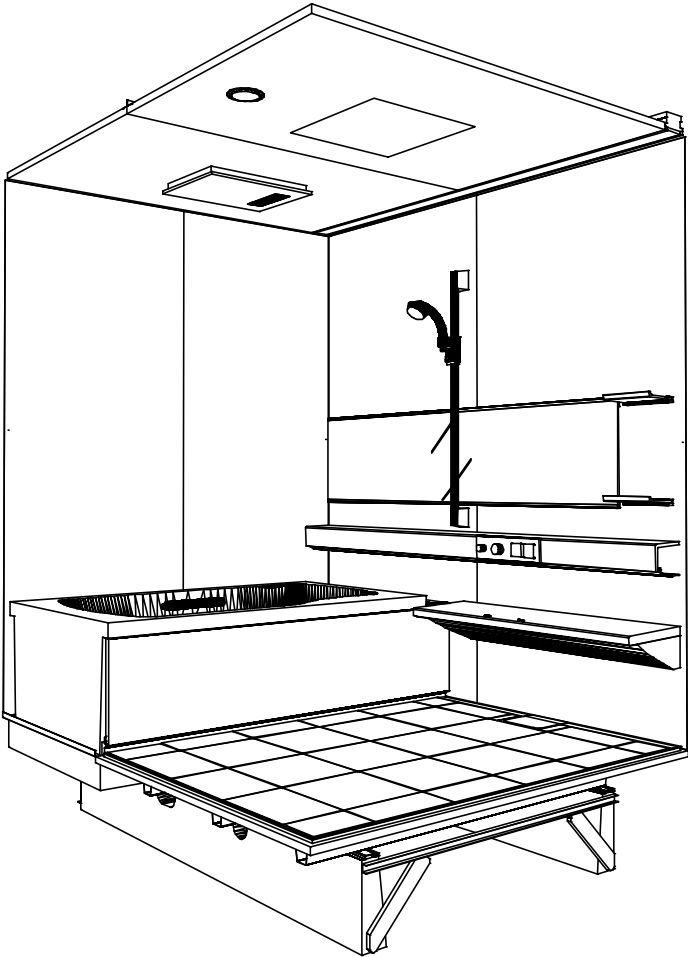

鳥瞰図

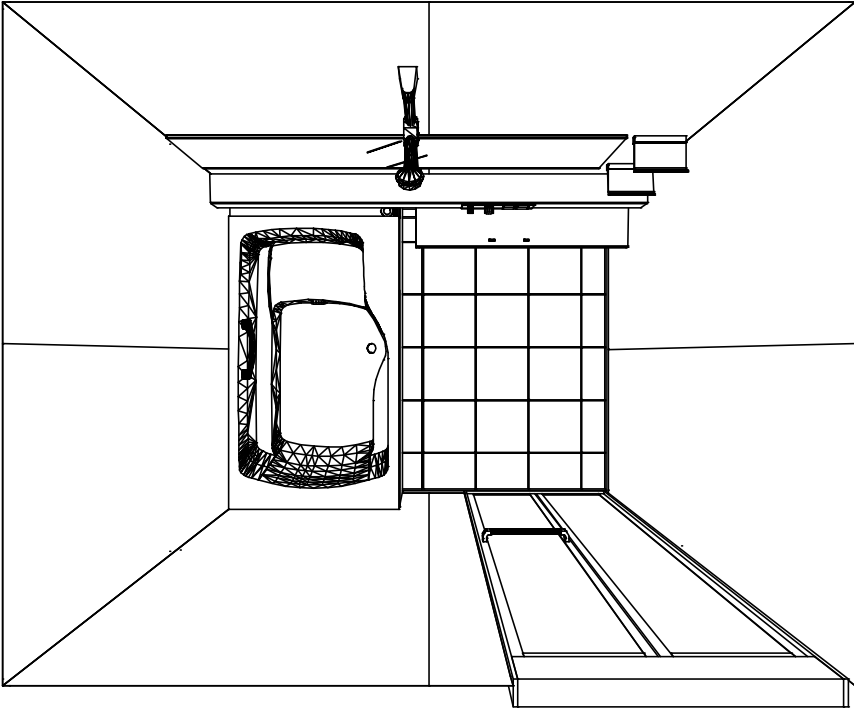

1620







フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 北陸-能登SR SB3様邸	PREDENCIA プレデンシア	姿図
現場番号： C3465259	プラン番号： 1612G-2404-0155T	作成日： 2024年9月7日
能登ショールーム	担当営業： 能登SR	担当アドバイザー：

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

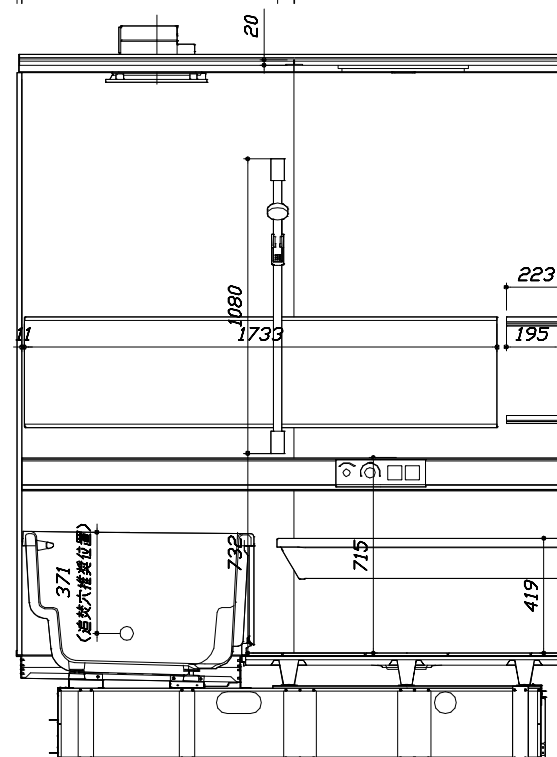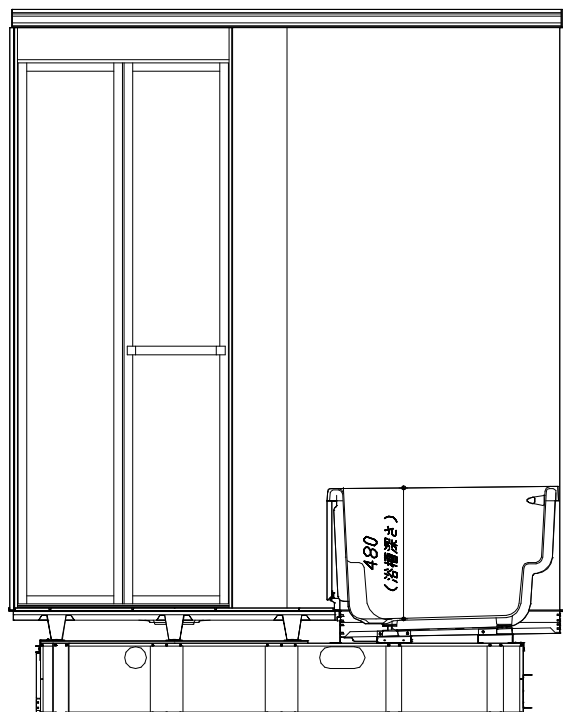

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 北陸-能登SR SB3様邸
現場番号： C3465259
能登ショールーム



PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 1612G-2404-0155T
担当営業： 能登SR

施工図2
縮尺： 1:20
作成日： 2024年9月7日
担当アドバイザー：


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認ください。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

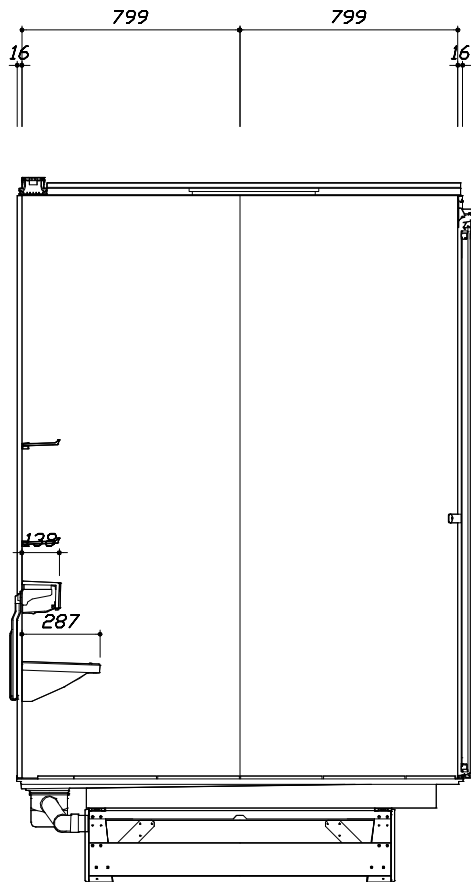

< 洗場側面図 >

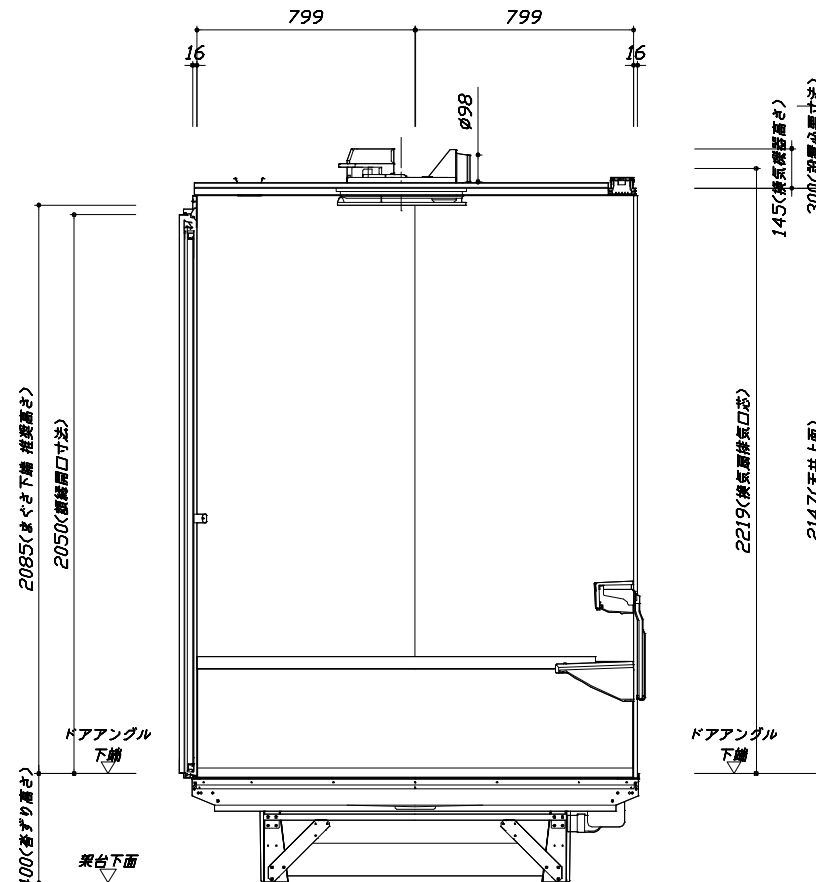

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
420mm下がり
(クリア寸法含む)

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 北陸一能登SR SB3様邸
現場番号： C3465259
能登ショールーム

PREDENCIA プレデンスシア
プラン番号： 1612G-2404-0155T
担当営業： 能登SR

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2024年9月7日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

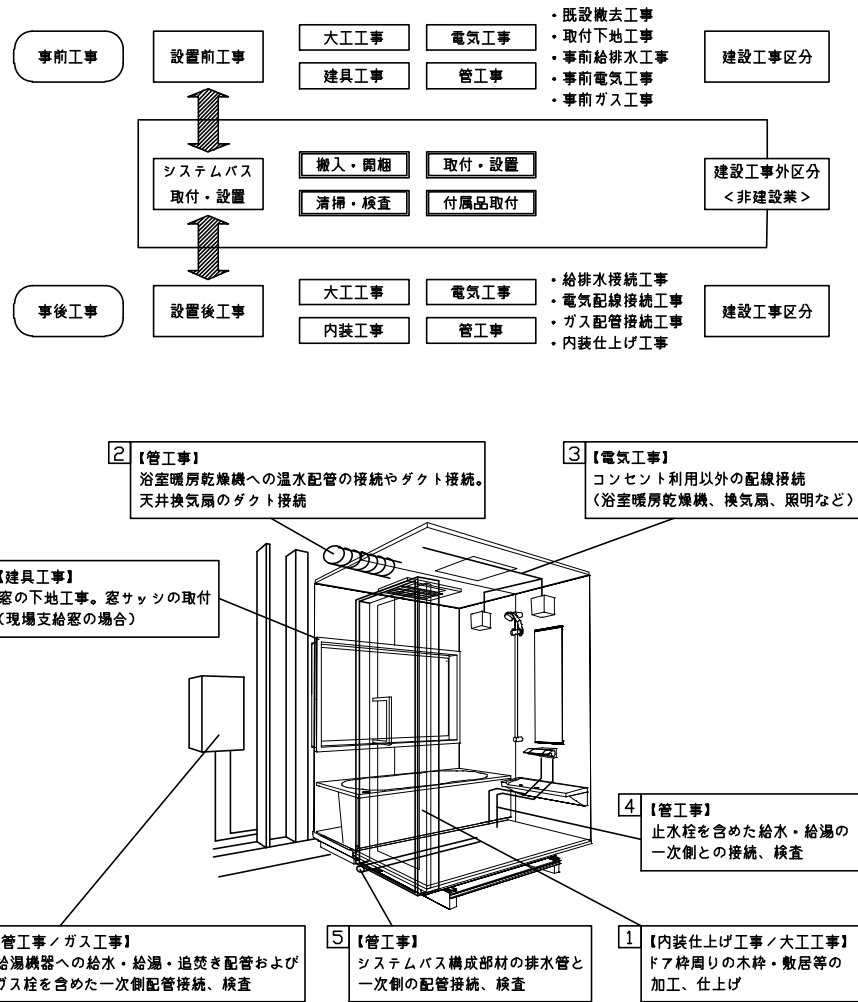


■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
		電気	換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン、洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トランプ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トランプ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
		大工	排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
		電気	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	1 2 3	管	建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
		電気 他	内装仕上げ工事	○	○						床、ドア鉋縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする


※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了後に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする



- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さに配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

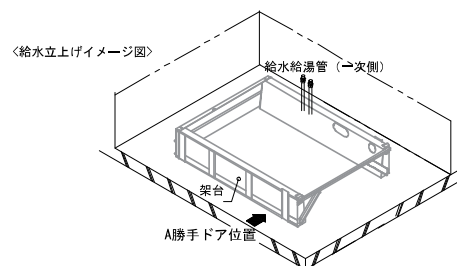



ドアアングル下端より420mm下がりで打設してください。

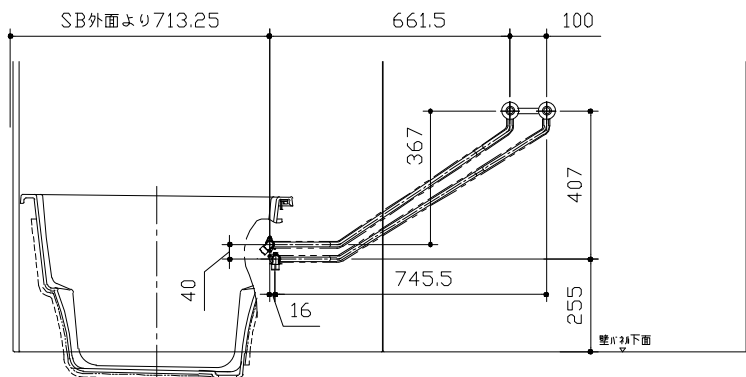


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

■設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
●	給湯位置

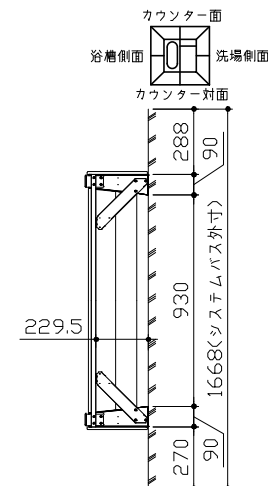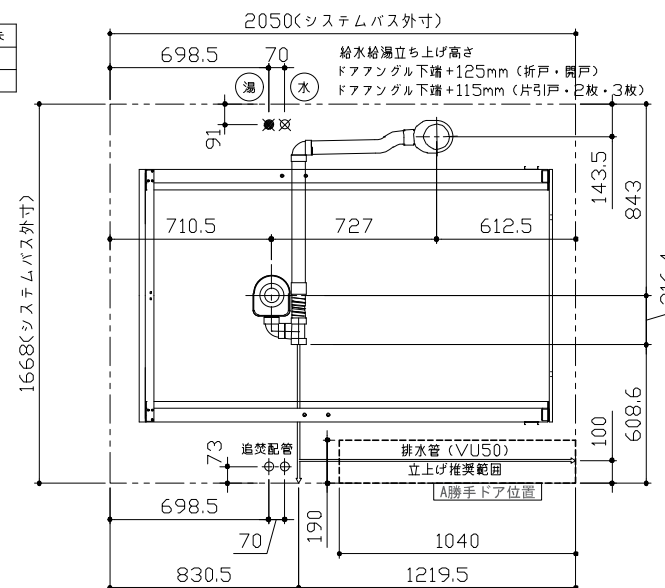

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

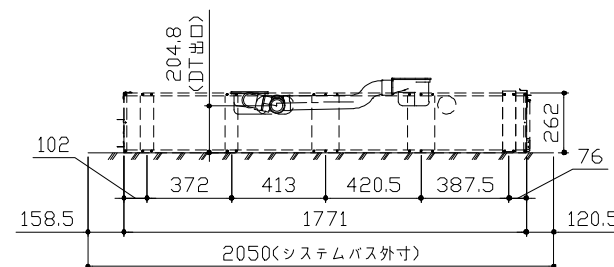



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角



(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

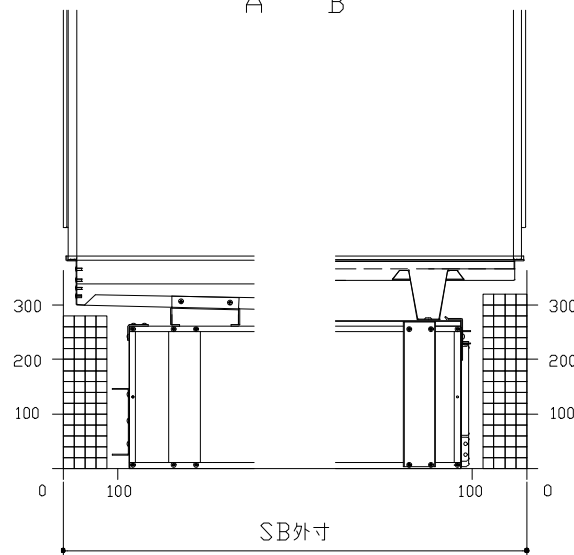



A矢視

B矢視

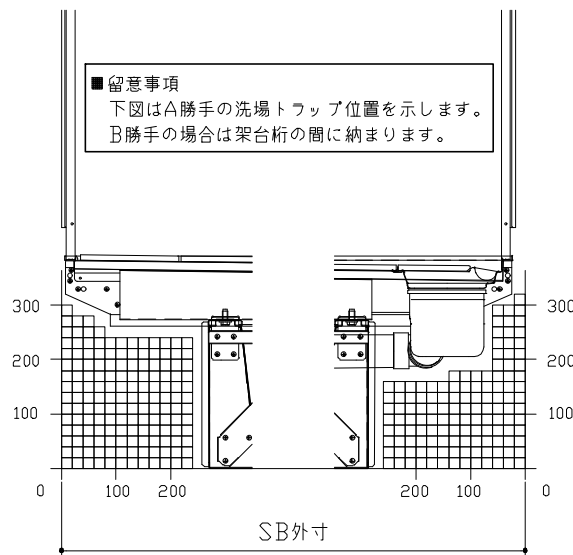

C矢視




D矢視

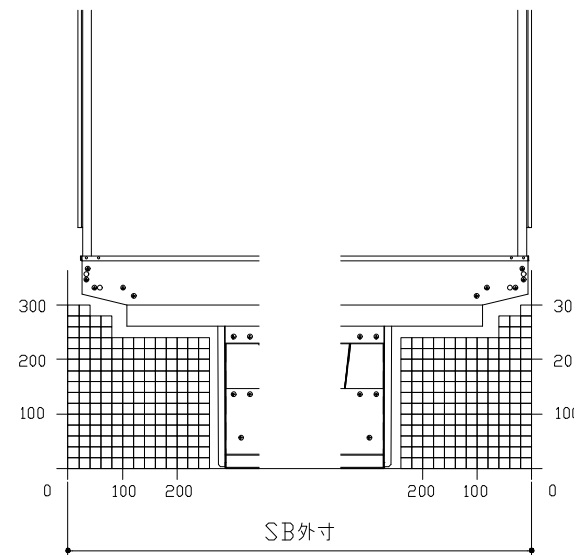

E矢視


F矢視


キープクリーンドア：折戸・上部換気口

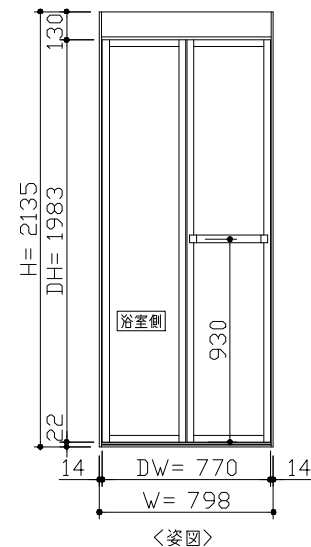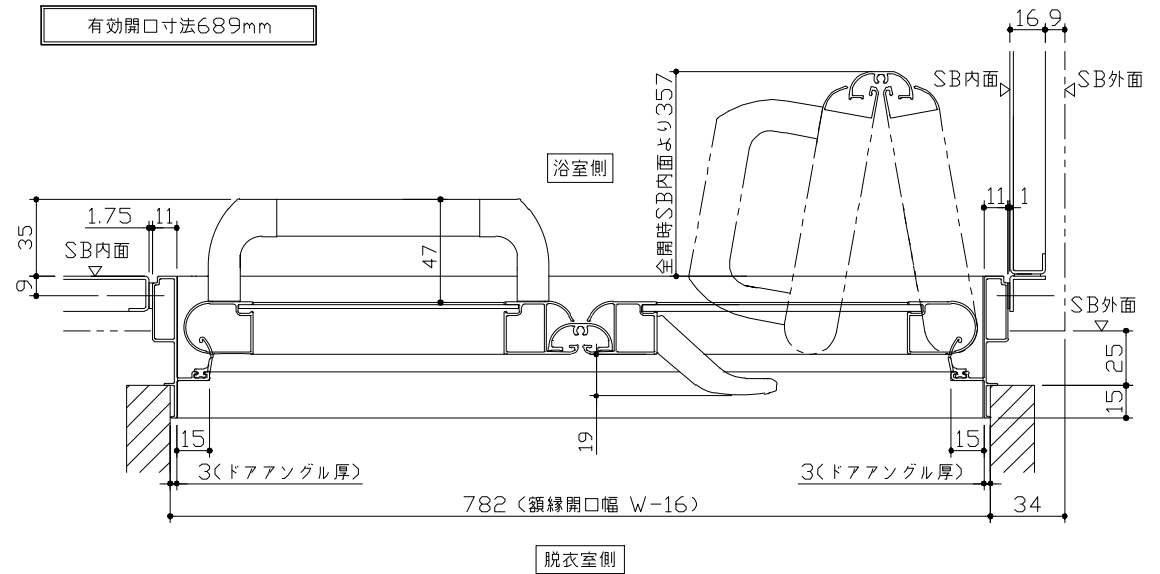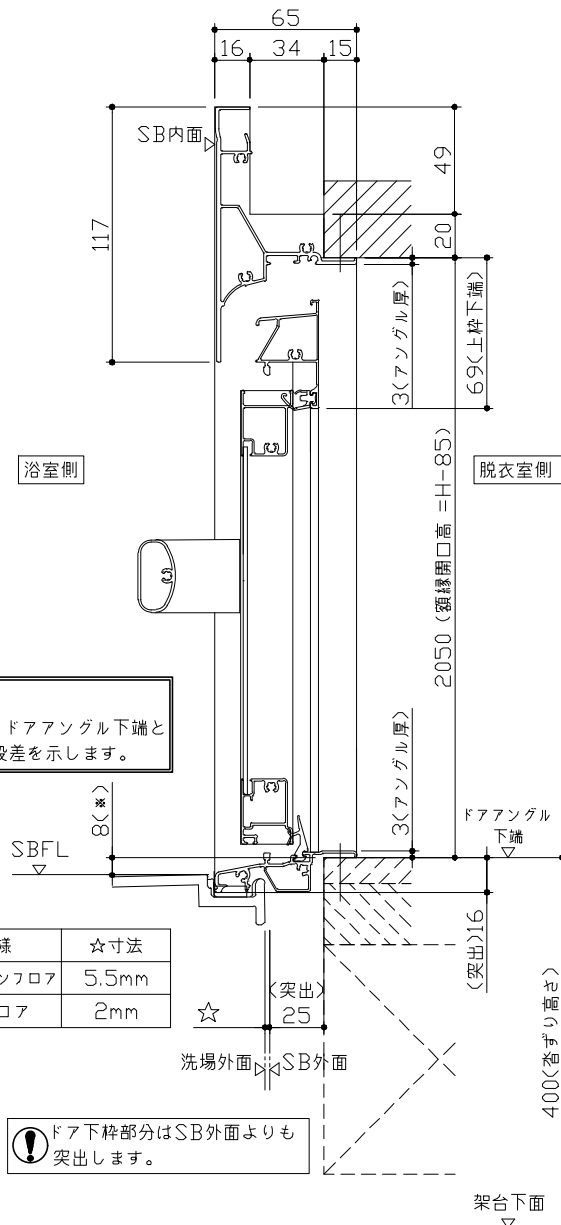

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



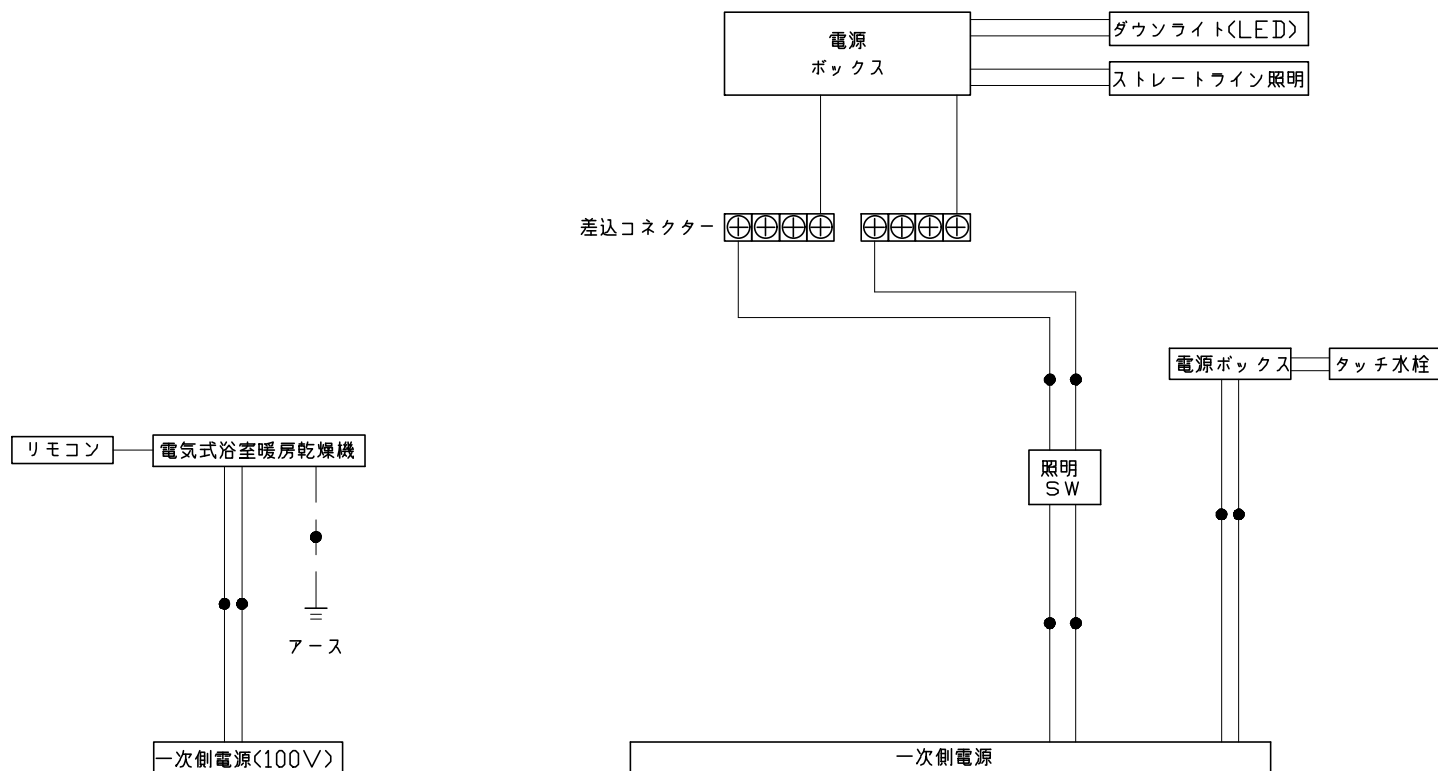

※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。



アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Technical drawing of a bathtub showing dimensions in millimeters (mm).

Top View:

- Overall width: 1460
- Inner width: 1354
- Side panel thickness: 40
- Back panel thickness: 66
- Overall depth: 850
- Inner depth: 746
- Distance from front edge to back panel: 547 (底側)
- Distance from front edge to side panel: 200
- Distance from front edge to back panel (inner): 826 (底側)
- Distance from front edge to side panel (inner): 661
- Distance from front edge to back panel (outer): 180
- Distance from front edge to side panel (outer): 365 (排水穴 排水位置)
- Jet outlet (ジェット噴出口) and Jet basin selection (ジェットバス選択時) are indicated near the front edge.

Side View:

- Overall height: 45
- Inner height: 285
- Back panel height: 200
- Side panel height: 371 (排水穴 排水位置)
- Bottom panel height: 50
- Jet outlet (ジェット噴出口) and Jet basin selection (ジェットバス選択時) are indicated near the front edge.

End View:

- Overall width: 438 (軸寸法)
- Inner width: 480
- Side panel height: 480
- Back panel height: 480
- Bottom panel height: 480
- Jet outlet (ジェット噴出口) and Jet basin selection (ジェットバス選択時) are indicated near the front edge.

Legend:

- ジェット噴出口 (Jet outlet)
- ジェットバス選択時 (Jet basin selection)
- ジェット吸出口 (Jet suction outlet)
- ジェットバス選択時 (Jet basin selection)

Note: 本図は参考図面です (This drawing is a reference drawing).

洗い場用水栓

Technical drawing of a sink faucet assembly, showing side and front views with dimensions and labels.

Side View (Top):

- Dimension: 100
- Label: PJ 1/2

Front View (Bottom):

- Dimensions: 87, 90.5, 64
- Dimension: 100
- Dimension: 245
- Dimension: 160

Side View (Right):

- Label: 壁パネル内面
- Dimension: (177)
- Label: ハンドル前面
- Label: カウンター前面
- Dimension: (136)
- Label: (2)
- Label: PJ 1/2
- Dimension: 6
- Dimension: (54)
- Label: カップ吐水面
- Label: シャフ
- Label: ホース接続面
- Dimension: (96)
- Dimension: (92)
- Dimension: 160
- Dimension: 62
- Dimension: (59)
- Label: G 1/2

照明

ストリートライン照明
LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)

天井厚み 25

100

40

2018

100

ダウンライト

φ75 (天井開口)

63.6

天井厚み 25

5.7

φ90

換気機器

リモコンコード長さ: 5m
 外形: 縦120mm×横116mm

管工事

The diagram illustrates the dimensions of a ventilation unit in two views:

- Front View (Top):** Shows a unit with a total width of 280 mm (body method) and a total height of 25 mm. The central circular duct has a diameter of $\phi 100$ mm. The unit is mounted on a base labeled 372 (グリル).
- Side View (Bottom):** Shows the unit's profile with a total depth of 400 mm (body method). The mounting bracket on the left is 145 mm high. The base is 38 mm thick. The unit is mounted on a base labeled 472 (グリル). The total height from the base to the top of the unit is 72 mm (排気).

Additional labels include "天井厚み" (Ceiling thickness) and "システムバス天井" (System bath ceiling) indicating installation context.

シャワーフックスライドバー

材質
 パイプ部: ステンレス
 台座部: ABS、POM等
 フック部: ABS等

取付部分詳細

ミラー






材: SUS304 t0.8
ミラー: 表面防曇コートあり(フイドクリアミラー)
表面防曇コートなし(フイドミラー)





The drawing shows a rectangular mirror with the following dimensions and features:

- Overall width: 1733 (鏡本体)
- Overall height: 400 (鏡本体)
- Mounting hole diameter: 41
- Mounting hole spacing (from left edge): 330, 372, 247, 372, 330
- Mounting hole diameter: 41
- Mounting hole spacing (from right edge): 255
- Mounting hole diameter: 41
- Mounting hole spacing (from right edge): 369
- Mounting hole diameter: 41
- Mounting hole spacing (from right edge): 95
- Mounting hole diameter: 41
- Mounting hole spacing (from right edge): 5 (鏡)
- Mounting hole diameter: 41
- Mounting hole spacing (from right edge): 11

(取付穴ピッチ)

取付穴は仕様により異なります。

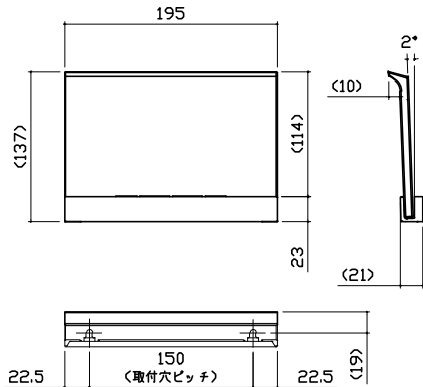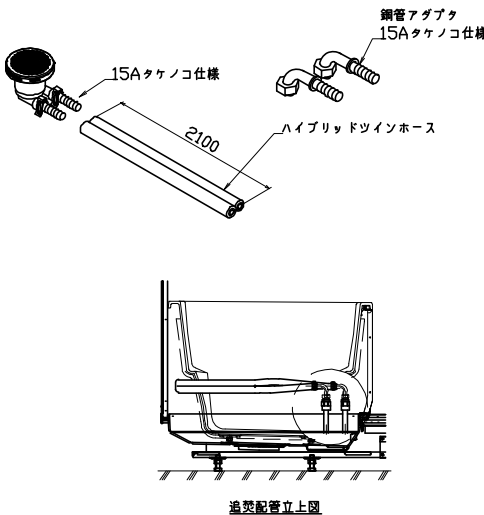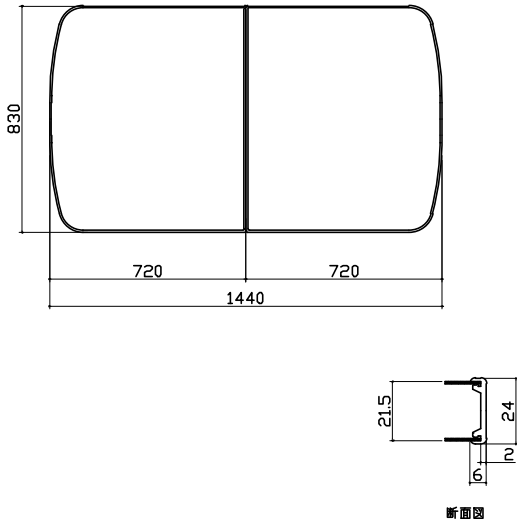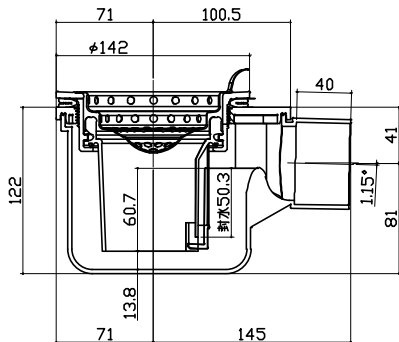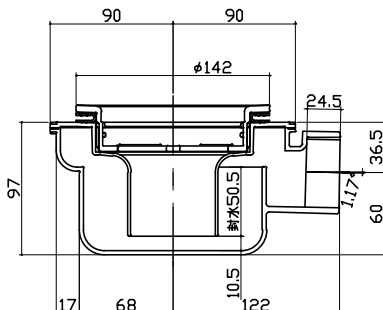収納棚 本体：PMMA 	循環金具・フロアダプタ関連 	風呂蓋 7077MDH-20WSK 	
洗い場側排水トラップ 	浴槽側排水トラップ 		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：北陸-能登SR SB3様邸 現場番号：C3465259 能登ショールーム	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号：1612G-2404-0155T 担当営業：能登SR	部材詳細図 2/2 作成日：2024年9月7日 担当アドバイザー：

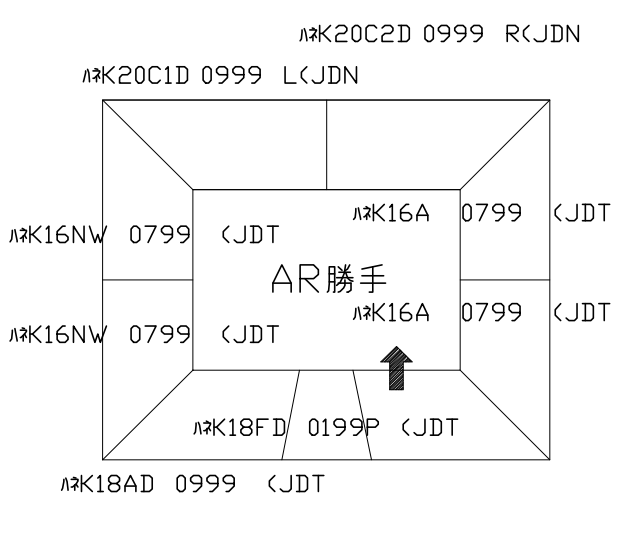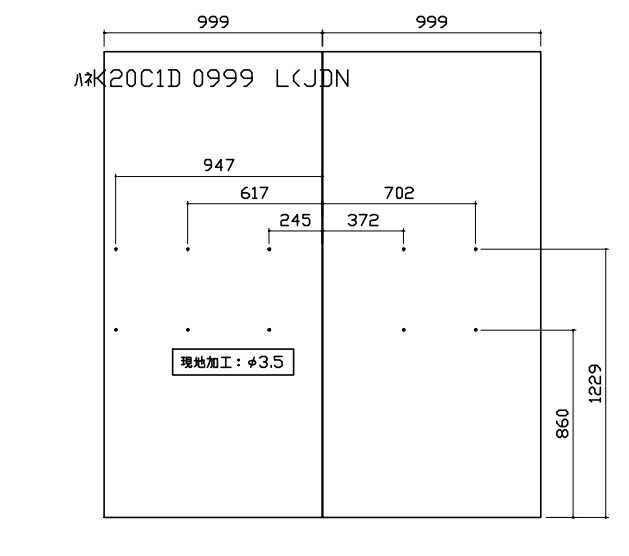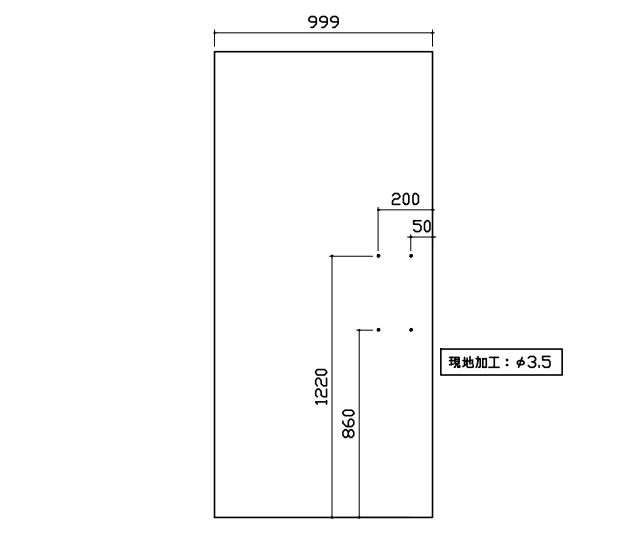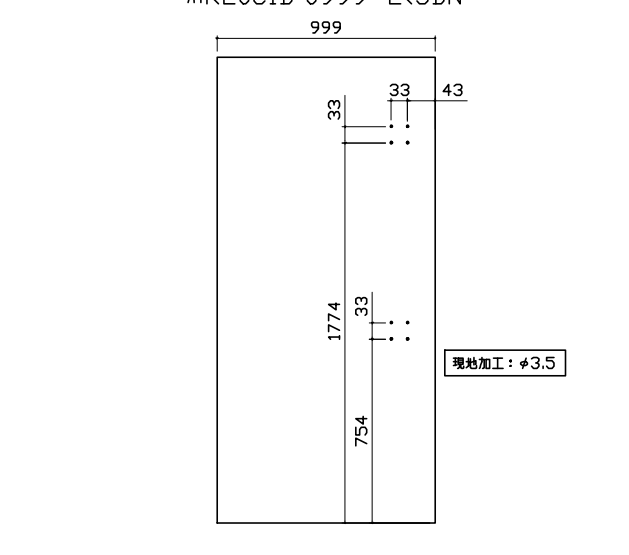パネル割図		ミラー		収納棚	
ΛK20C2D 0999 R<JDN ΛK20C1D 0999 L<JDN ΛK16NW 0799 <JDT ΛK16A 0799 <JDT AR勝手 ΛK16A 0799 <JDT ΛK18FD 0199P <JDT ΛK18AD 0999 <JDT 		ΛK20C2D 0999 R<JDN ΛK20C1D 0999 L<JDN 999 999 947 617 702 245 372 現地加工 : φ3.5 860 1229 		ΛK20C2D 0999 R<JDN 999 1220 860 200 50 現地加工 : φ3.5 	
シャワーフックスライドバー					
ΛK20C1D 0999 L<JDN 999 33 33 43 1774 33 754 現地加工 : φ3.5 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称 : 北陸-能登SR SB3様邸 現場番号 : C3465259 能登ショールーム		PREDENCIA プレデンスシア プラン番号 : 1612G-2404-0155T 担当営業 : 能登SR	
				穴開け指示図 作成日 : 2024年9月7日 担当アドバイザー :	
				1/1	
