

システムバス 御見積書

御名前 横浜-小田原SR SB7 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

商品
御見積金額 **¥661,200** (税込 **¥727,320**)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

作成日 2025年3月10日
プラン番号 2712E-2503-0058T
現場番号 C3480179

タカラスタンダード株式会社
◆小田原ショールーム
神奈川県小田原市国府津2902

TEL 0465-20-5213 / FAX 0465-48-5121
◆厚木営業所
TEL 046-280-6161 / FAX 046-227-5010

※ 商品御見積金額には商品組付費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
小田原SR	小田原SR	小田原SR

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616(BR勝手)
洗い場仕様	ガラス繊維強化樹脂<FRP>
洗い場カラー	グレー
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ライトグレー
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	樹脂
カウンター/下カバーカラー	チャコールグレー / -
浴槽前カウンターカラー	-
エプロン材質/カラー	樹脂 / ライトグレー
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ラミナストーンホワイト
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

御名前 横浜-小田原SR SB7

様

現場番号

C3480179

プラン番号

2712E-2503-0058T

作成日

2025/3/10

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイ)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	FRP洗い場(保温材有り)(グレー)	1	-76,000	-76,000
7	浴槽	FRP(高断熱浴槽)(ライトグレー)	1	-85,000	-85,000
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エブロン	FRP浴槽用保温材あり(ライトグレー)	1	+1,000	+1,000
10	浴槽形状	FRPラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
11	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
12	浴槽パン	なし	1		
13	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF9032SJN1 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1		
14	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032SJN1	1		
15	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
16	カウンター	ワイドカウンター	1	-38,000	-38,000
17	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
18	浴室パネル	レギュラークラス(一面デザイン)(Kパネル)	1	-20,000	-20,000
19	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
20	天井	フラット天井	1	-15,000	-15,000
21	換気機器	天井換気扇ホワイ	1		
22	換気機器開口	工場開口	1		
23	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
24	天井照明開口	工場開口	1		
25	ミラー	ショートミラー	1	-8,500	-8,500
26	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
27	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
28	収納棚	収納棚なし	1		
29	どこでもラック	シャンプーフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
30	どこでもラック	風呂フタフック(ホワイ)	1	+2,100	+2,100
31	循環金具セット	ZLX	1	+11,500	+11,500

御名前 横浜-小田原SR SB7 様

現場番号	C3480179	プラン番号	2712E-2503-0058T	作成日	2025/3/10
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
33	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			33		¥540,200


商品総合計	33	¥540,200
-------	----	----------

商品組付費			数量	金額
1	本体組付費		1	121,000
商品組付費合計				¥121,000


商品御見積金額	¥661,200
---------	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

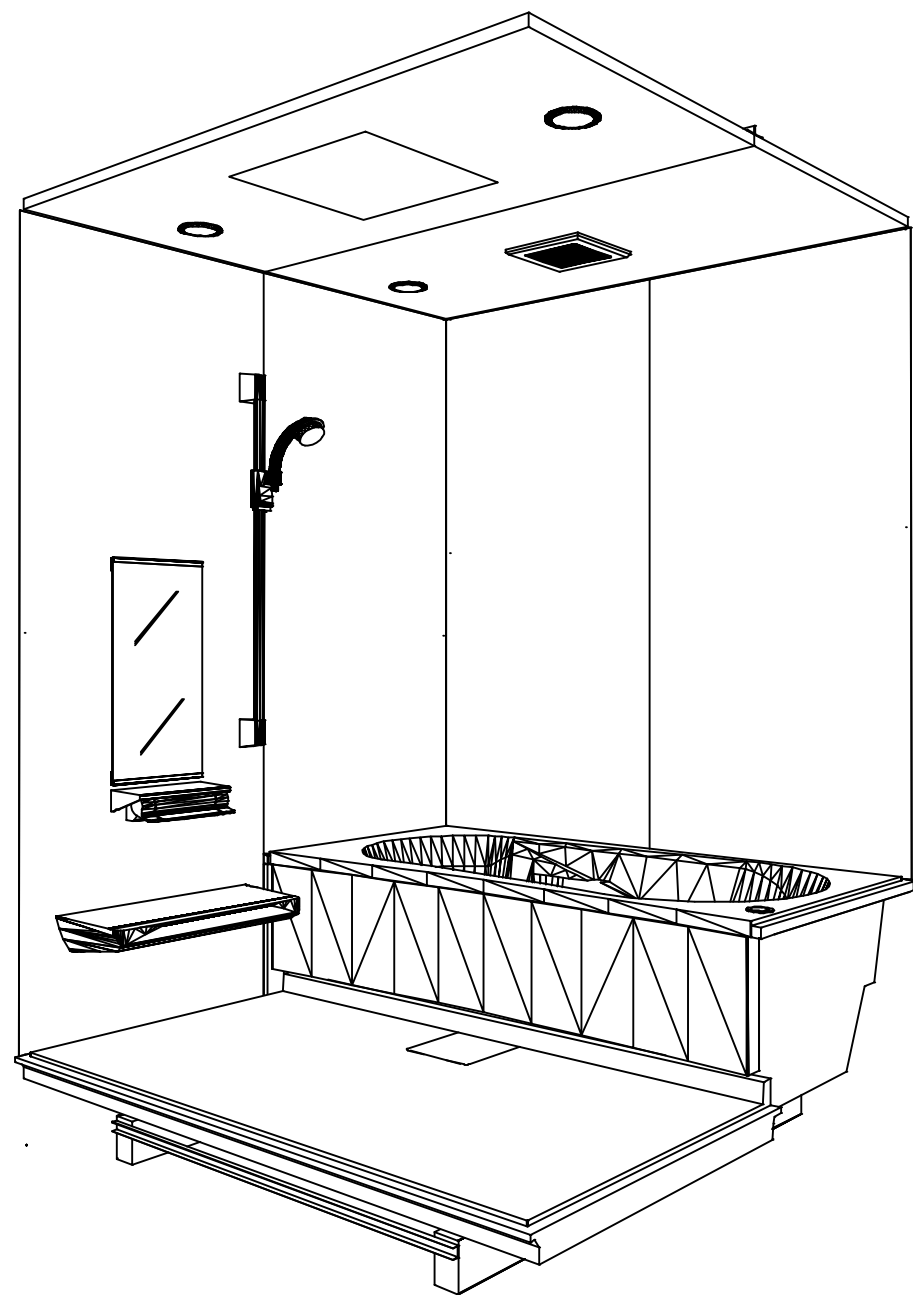

鳥瞰図

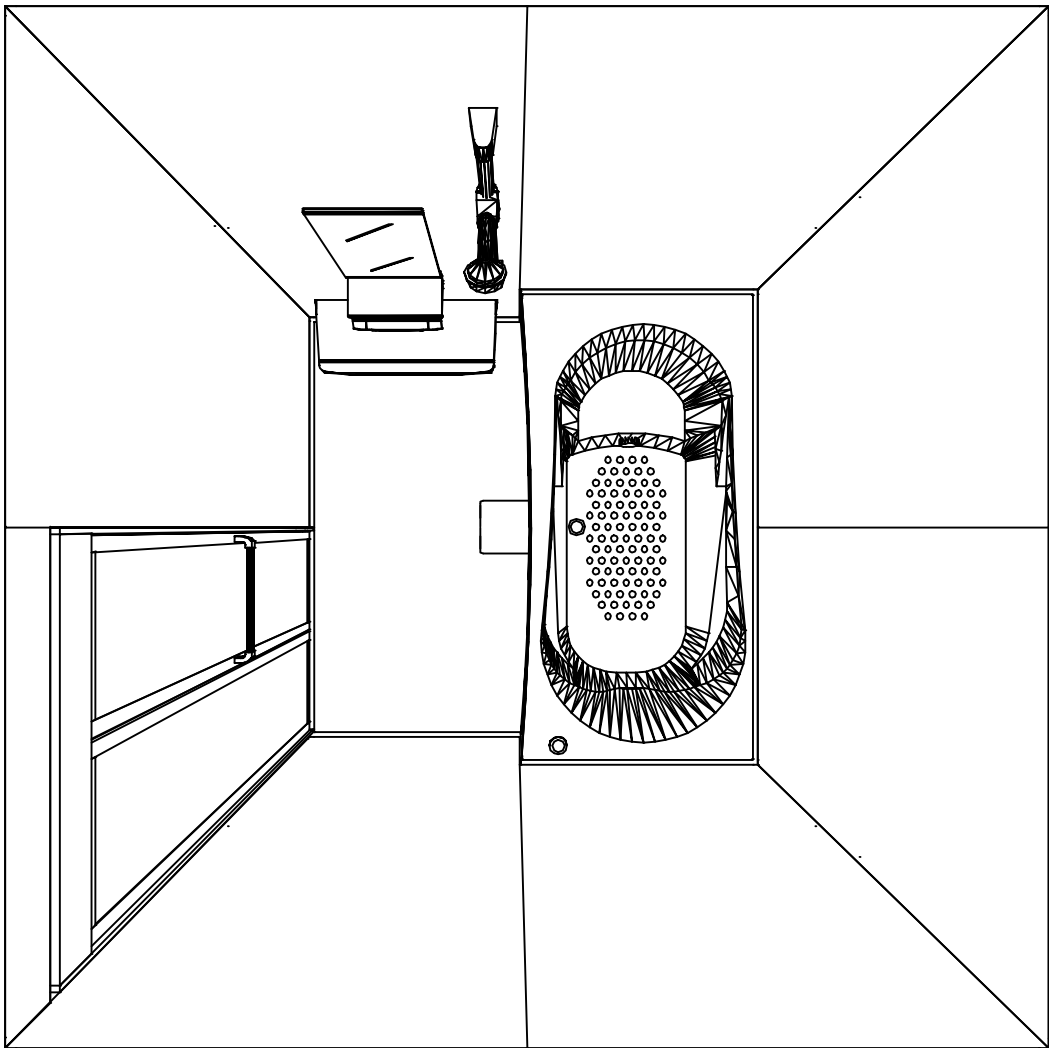

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 横浜-小田原SR SB7様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C3480179	プラン番号： 2712E-2503-0058T	作成日： 2025年3月10日	
小田原ショールーム	担当営業：小田原SR	担当アドバイザー： 小田原SR	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

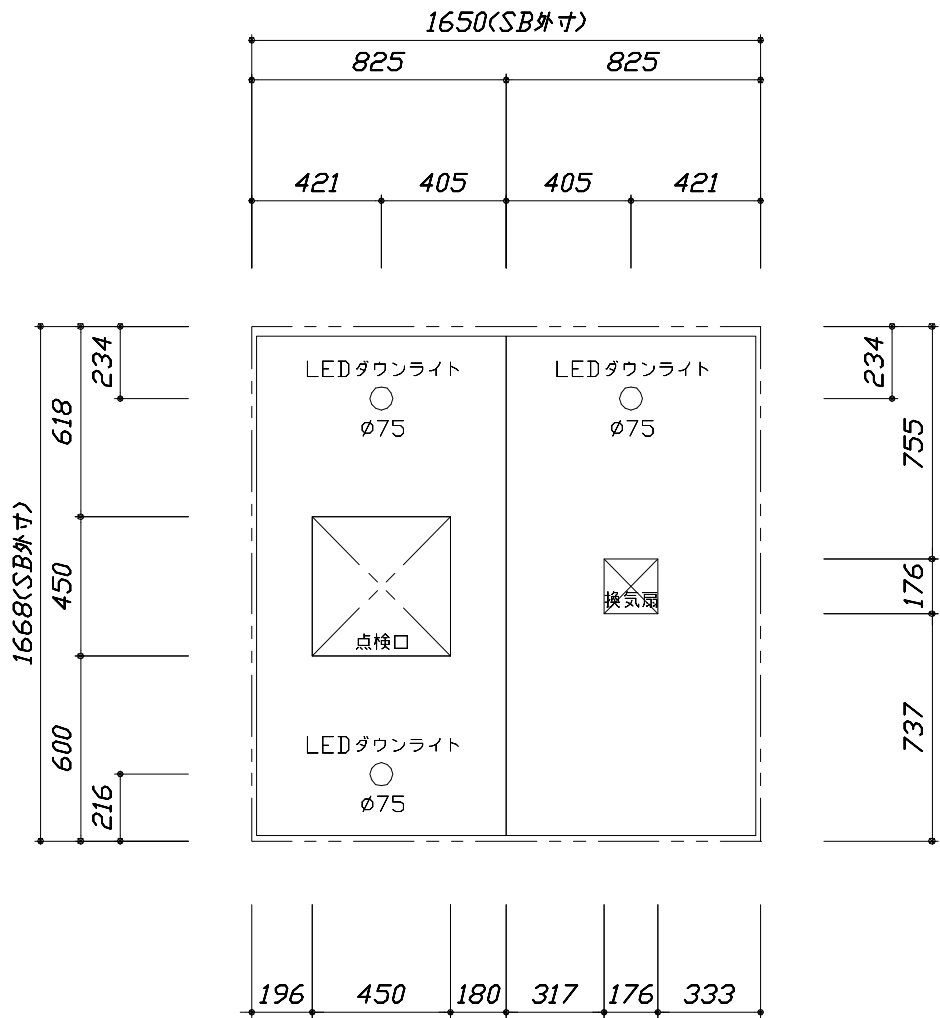

< 天井伏図 >

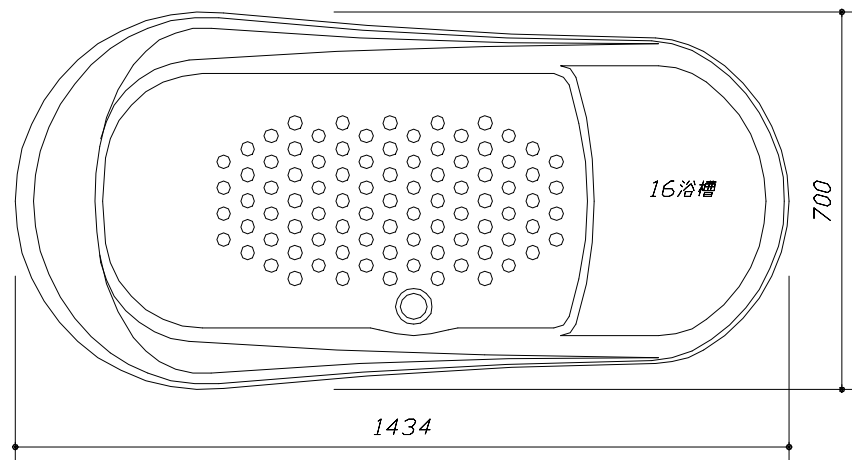



< 浴槽詳細図 >

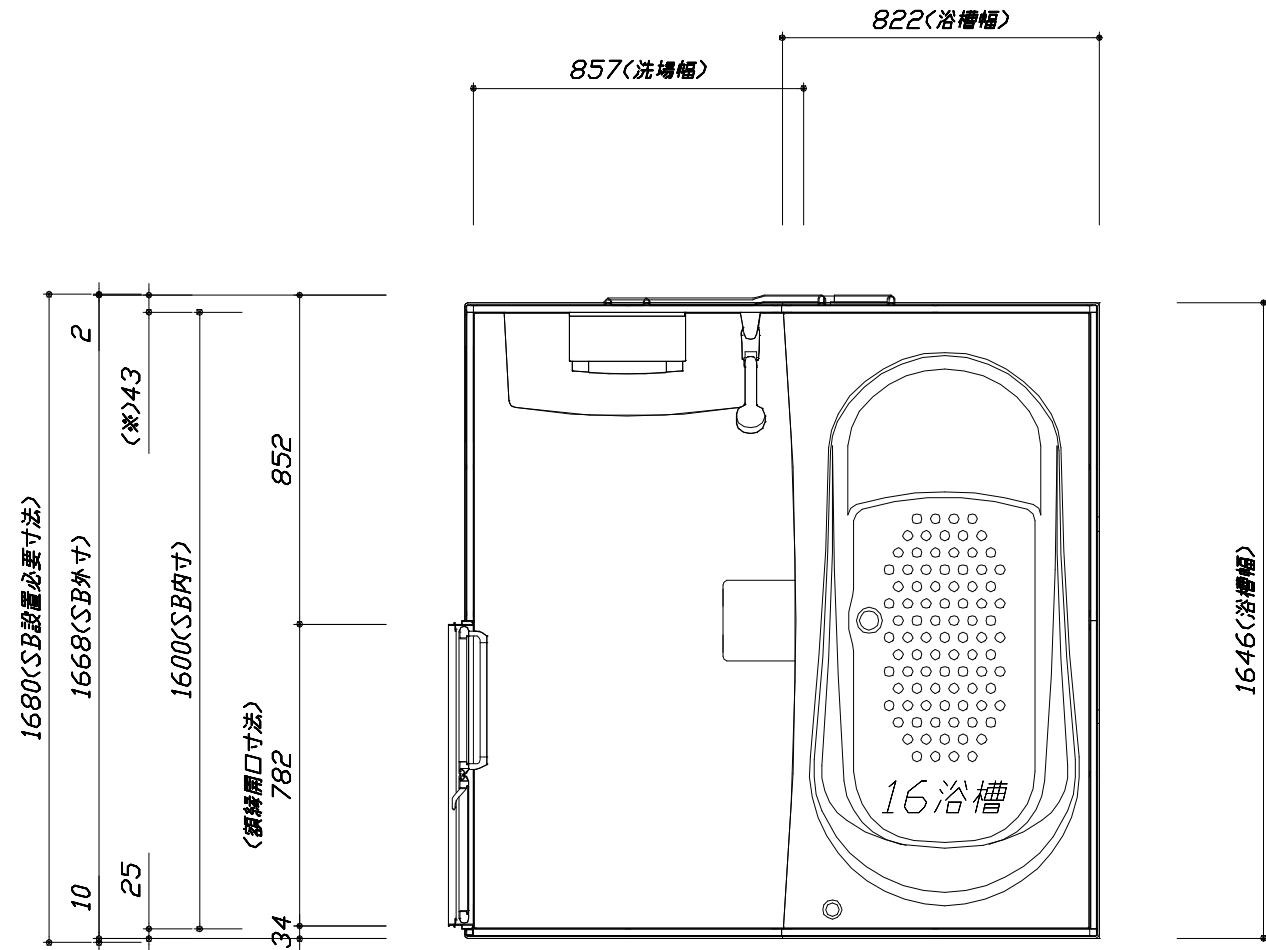

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

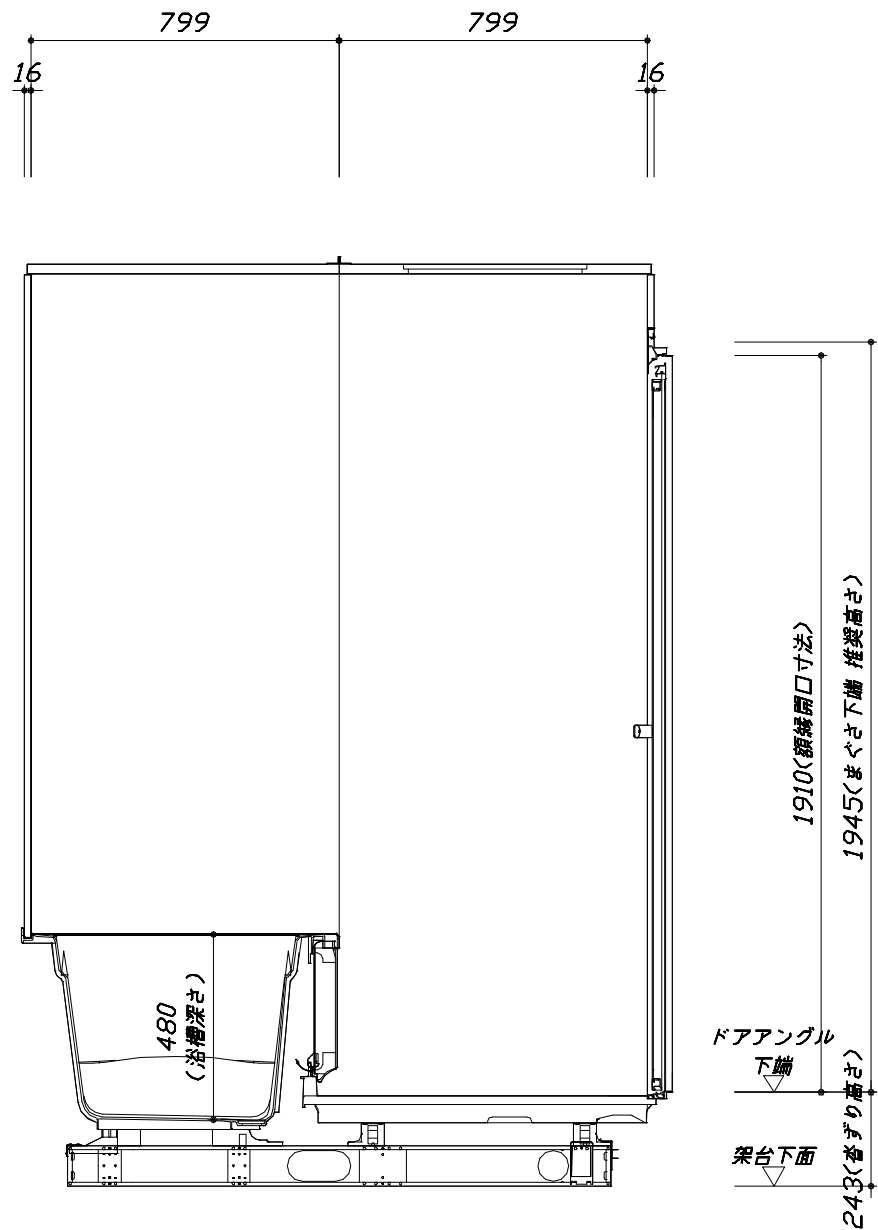

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



＜カウンター対面図＞

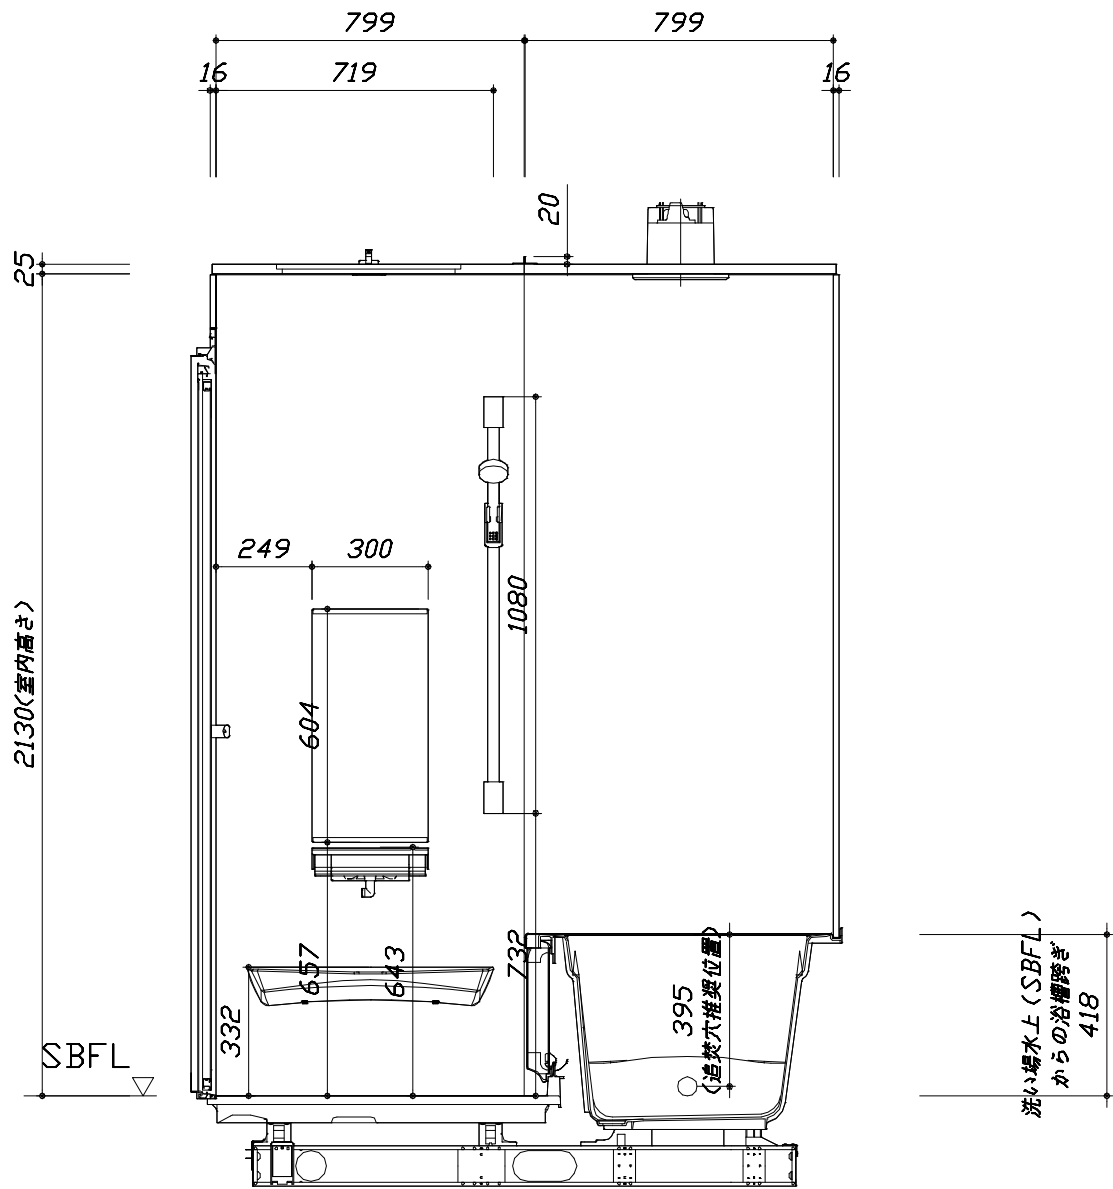

＜カウンター面図＞


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

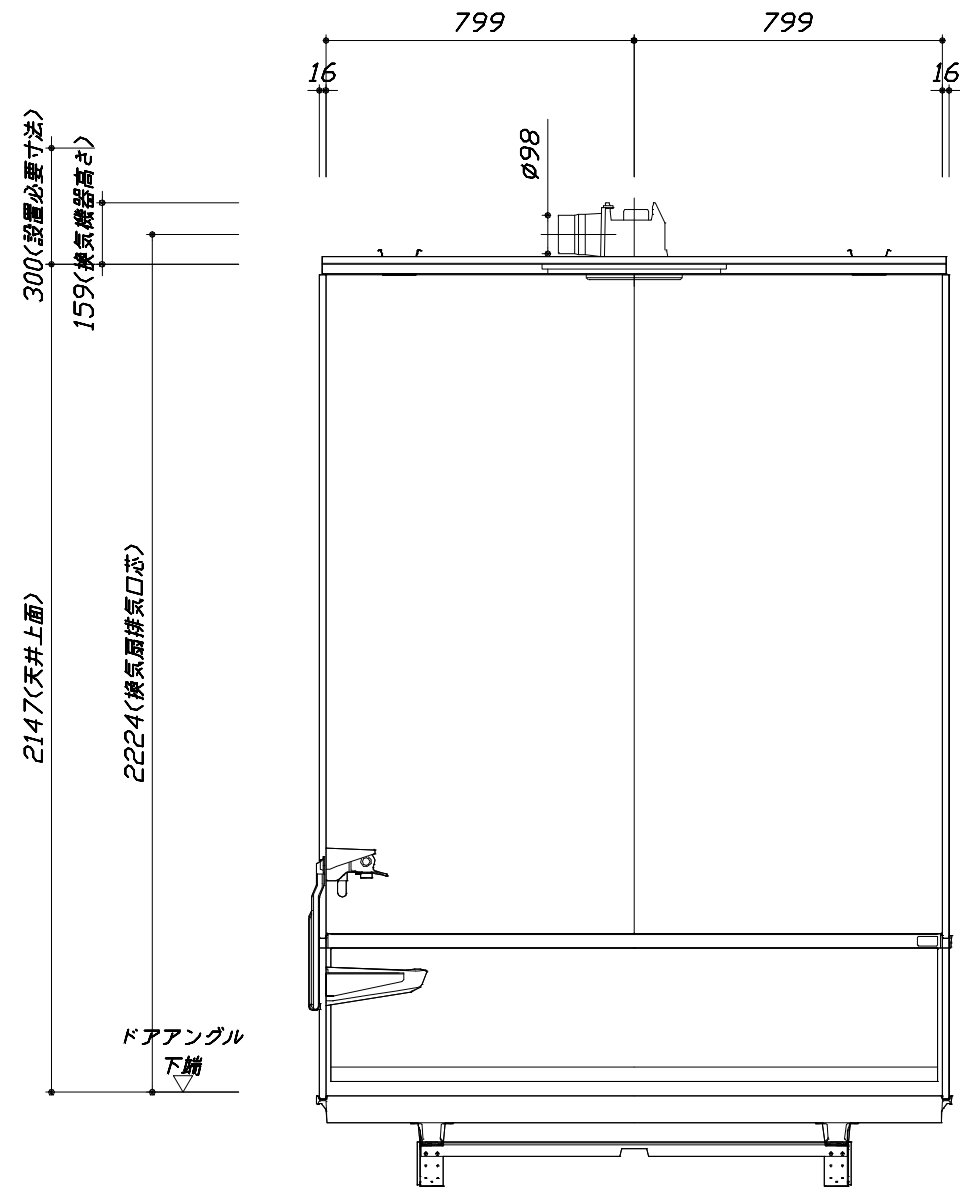

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

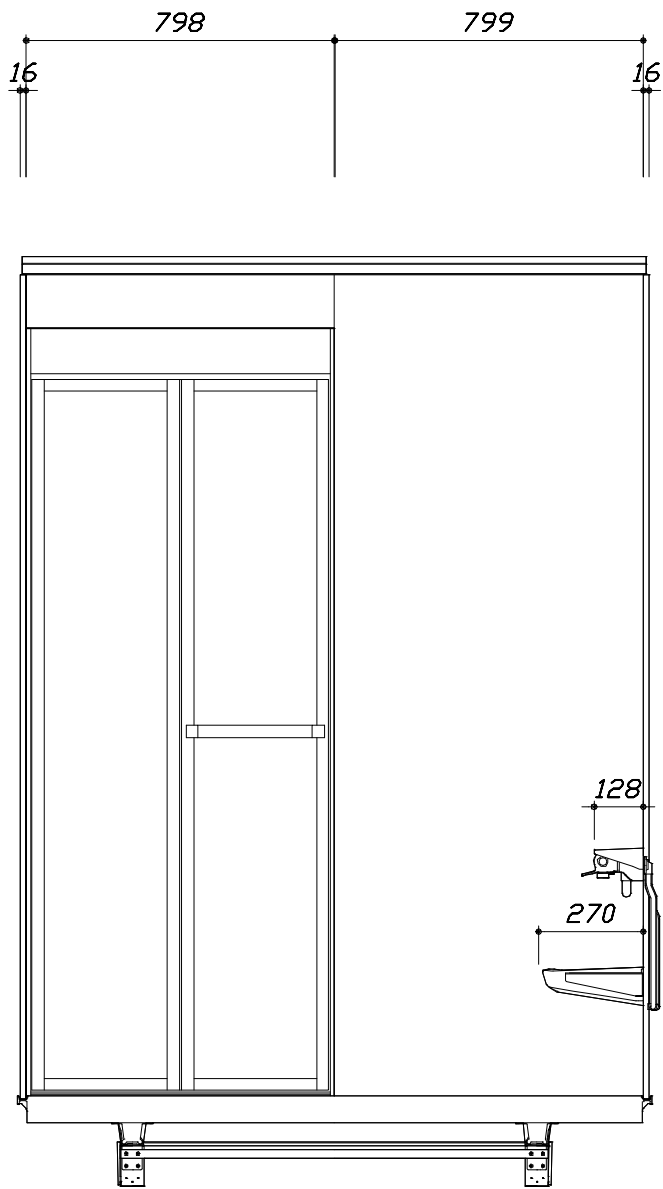

< 洗場側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP） 保温材付（発泡ウレタン）
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)（285リットル） 追い焚き穴：あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S樹脂 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープ クリーントア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A B S樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ショートミラー
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK KF9032SJN1) (樹脂ホース:シルバー)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S MH）
照明	LEDダウンライト（LED 12.3W白色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト径φ98) ホワイト
フロタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットZLX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－


本体カラー

浴槽	G：ライトグレー
カウンター	CG：チャコールグレー
パネル(カウンター面)	LW：ラミナストーンホワイト
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	CG：チャコールグレー
浴槽エプロン	G：ライトグレー
洗場	G：グレー
ドア / 天井	W：ホワイト / W：ホワイト
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 横浜－小田原SR SB7様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C3480179	プラン番号： 2712E-2503-0058T	作成日： 2025年3月10日	
	小田原ショールーム	担当営業：小田原SR	担当アドバイザー： 小田原SR	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

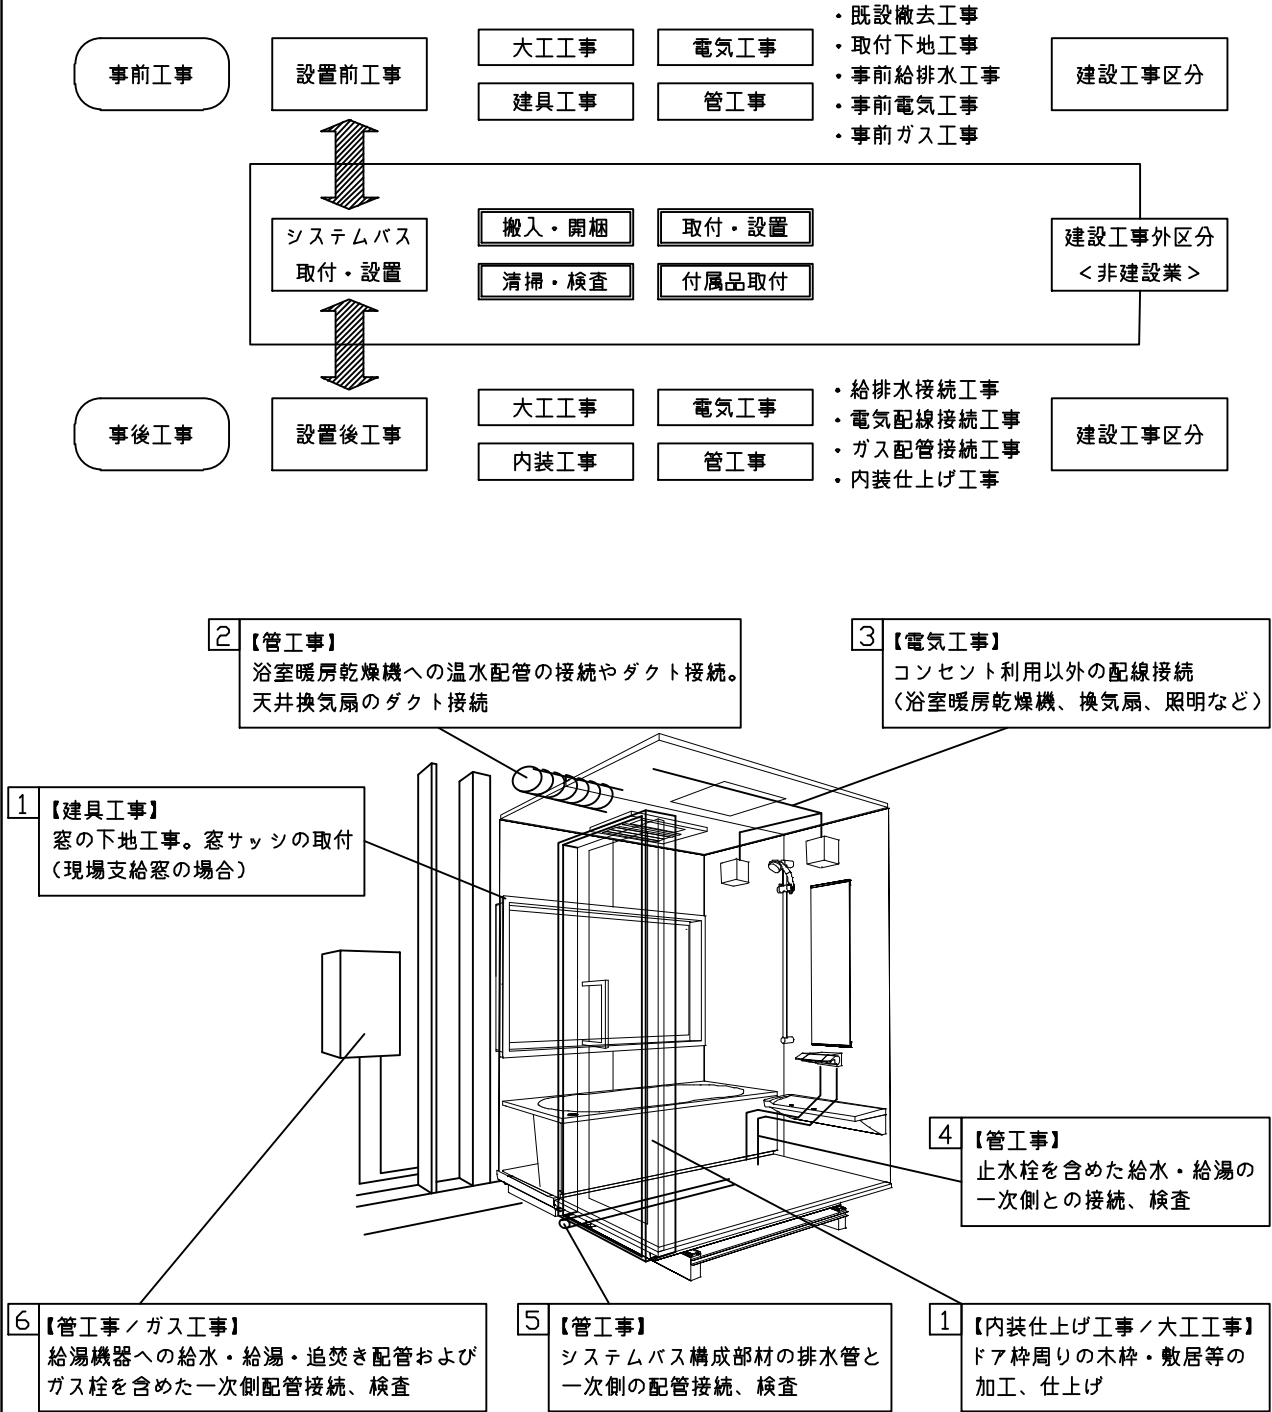


■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 2 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
浴室用電源配線、接続工事							○			浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○			浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

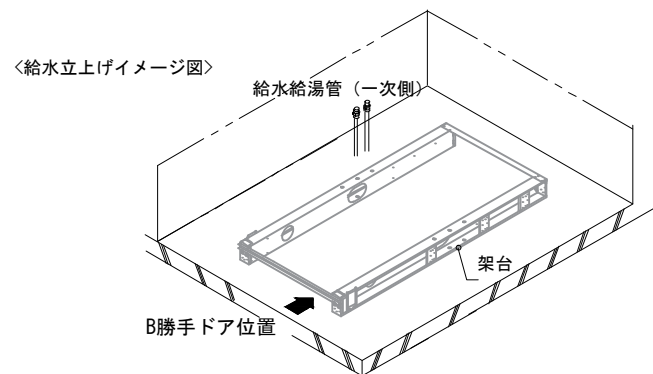



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

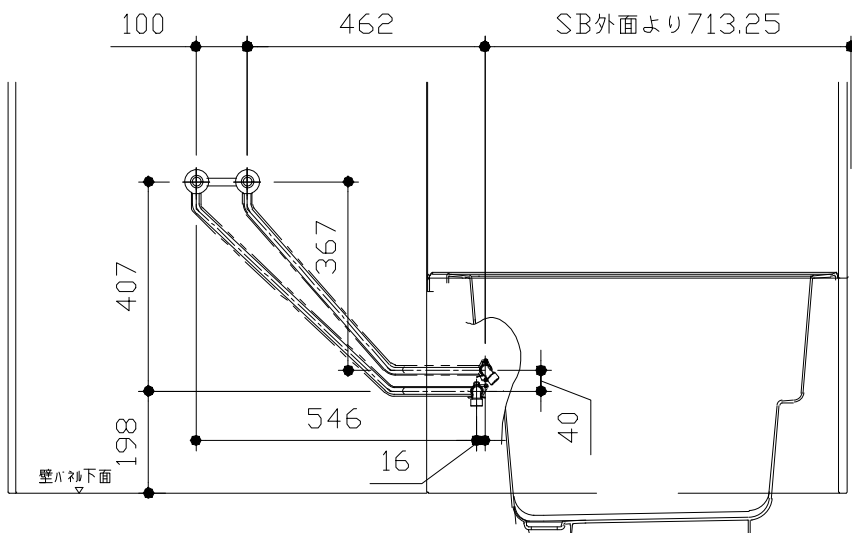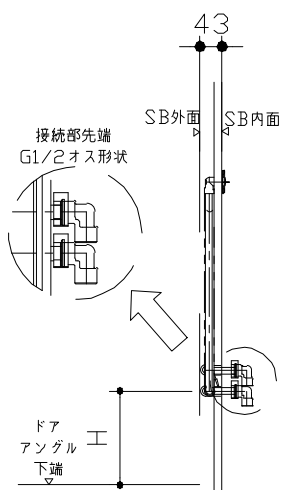


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

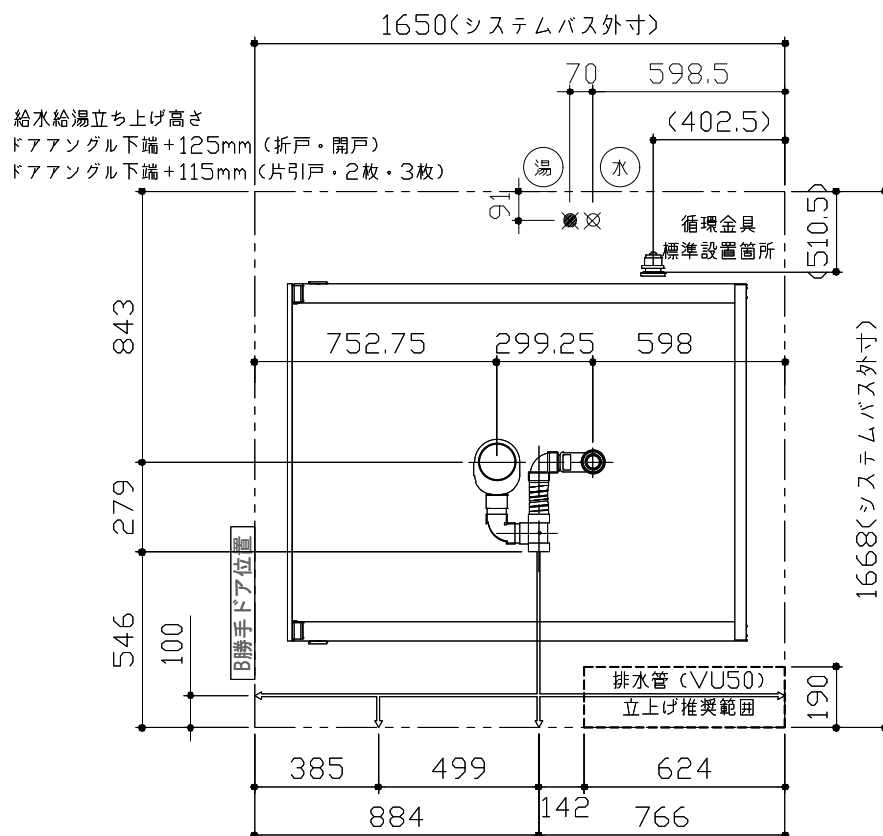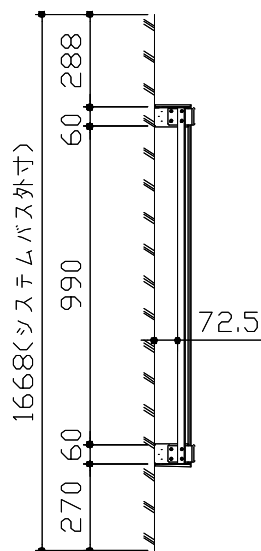


■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

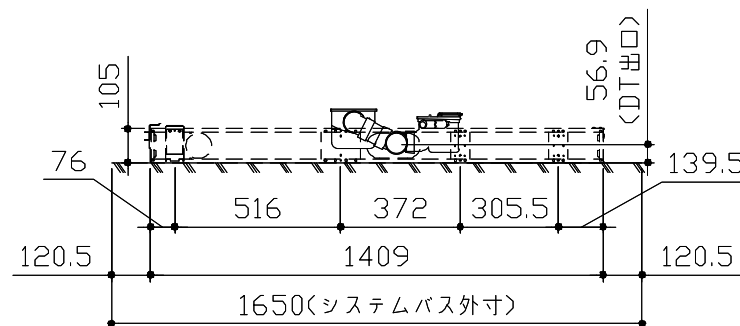



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角



(2) 留意事項

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

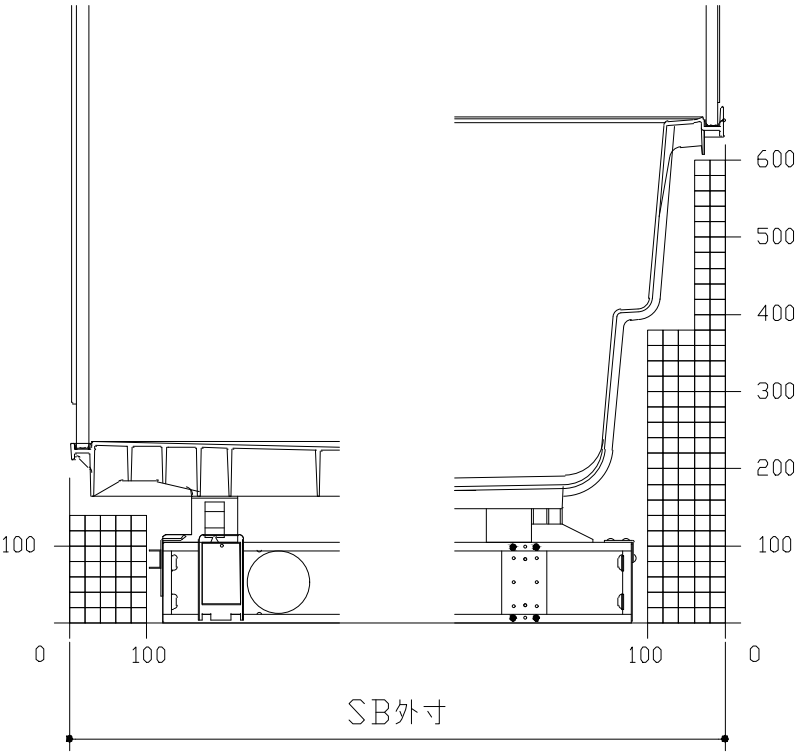



B矢視

A矢視

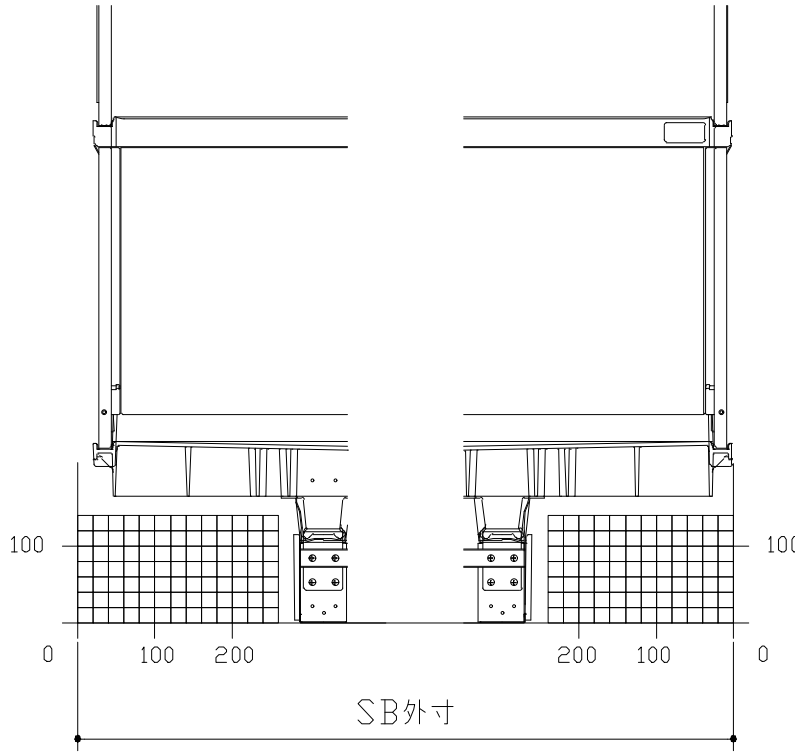

D矢視

C矢視



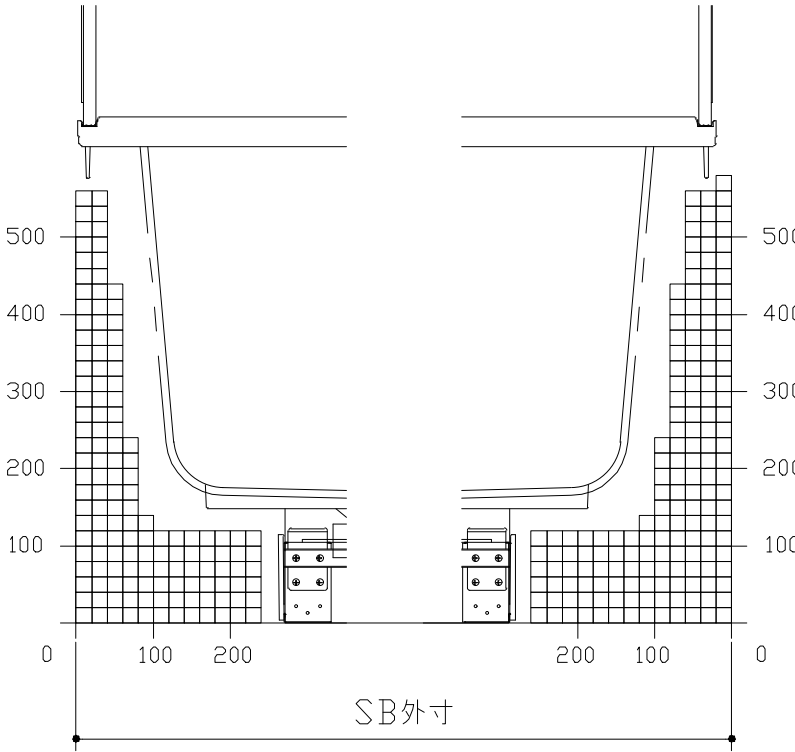



F矢視

E矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

有効開口寸法689mm

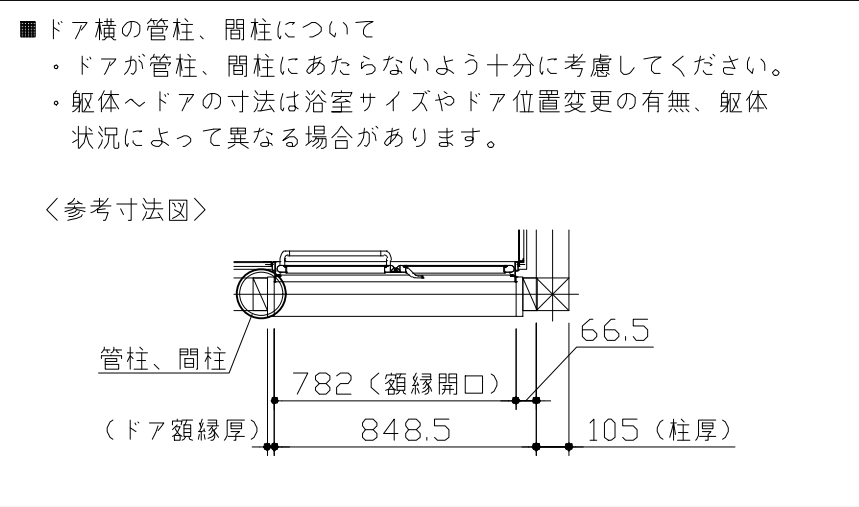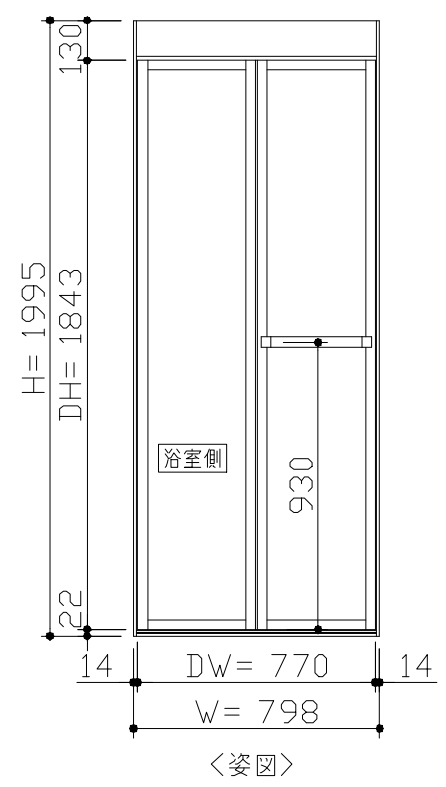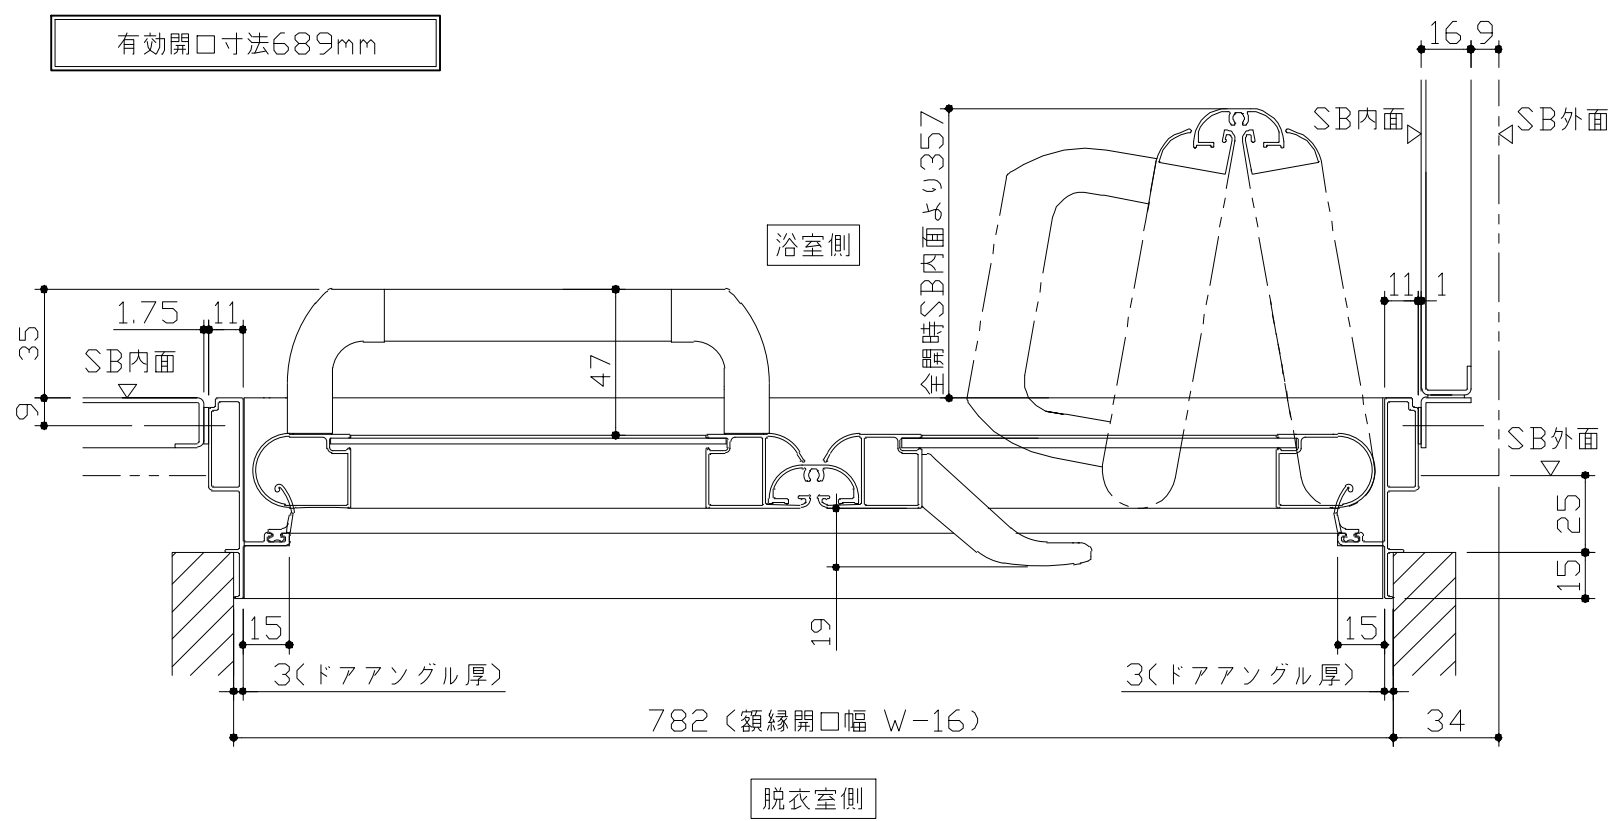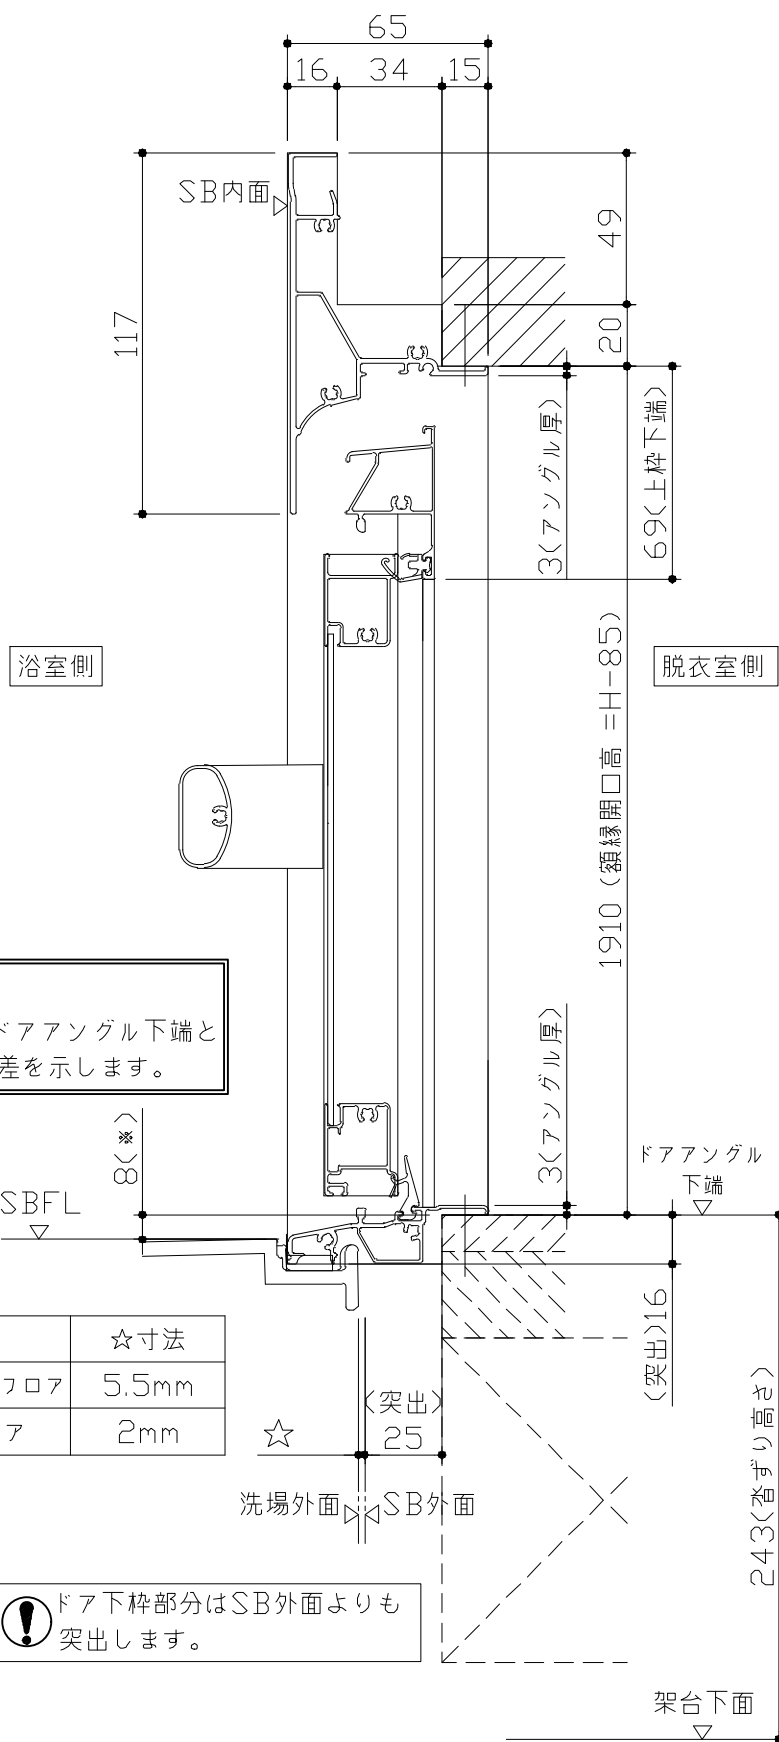


■ 留意事項
* 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

Takara standard
タカラストANDARD株式会社








現場名称： 横浜-小田原SR SB7様邸	GRANSPA グランSPA	ドア取合詳細図
現場番号： C3480179	プラン番号： 2712E-2503-0058T	作成日： 2025年3月10日
小田原ショールーム	担当営業： 小田原SR	担当アドバイザー： 小田原SR





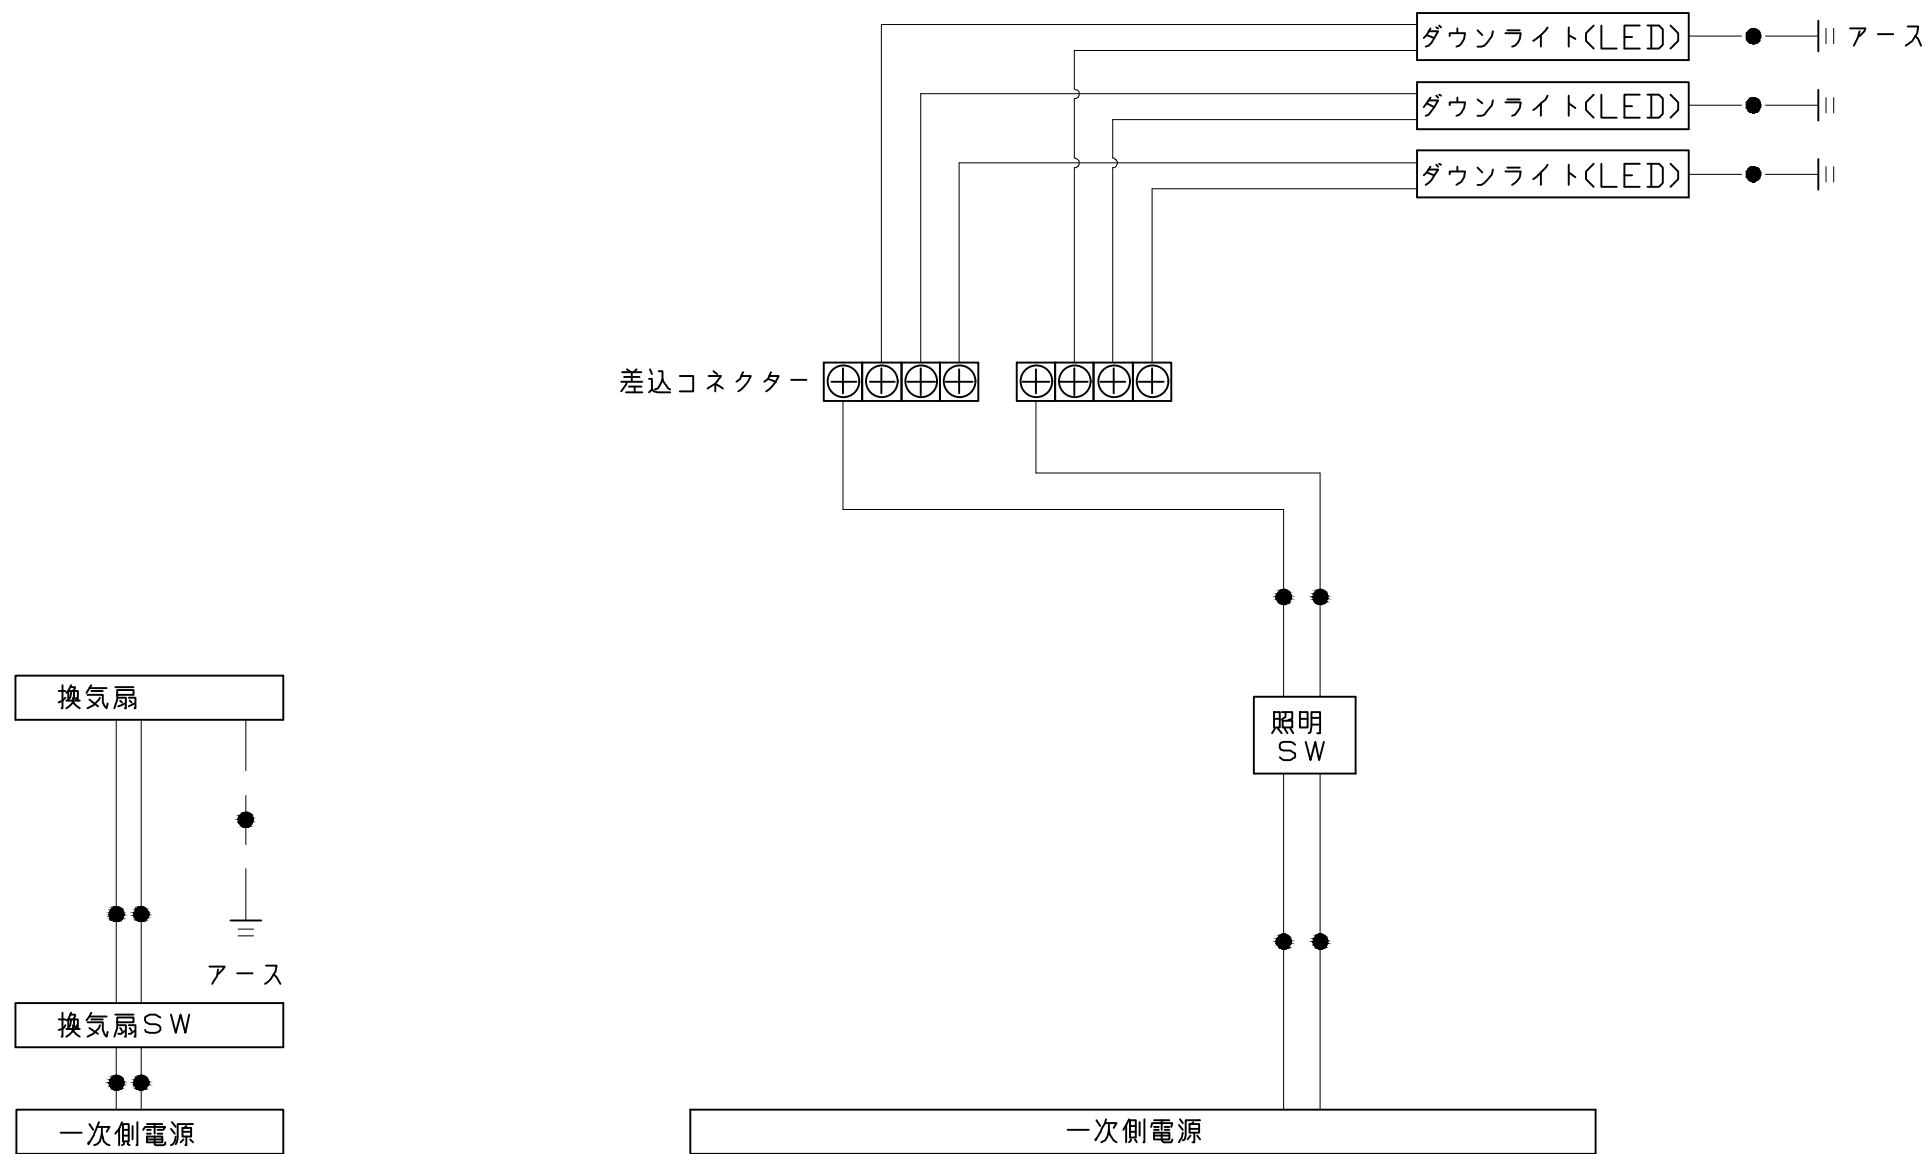


一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。



アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

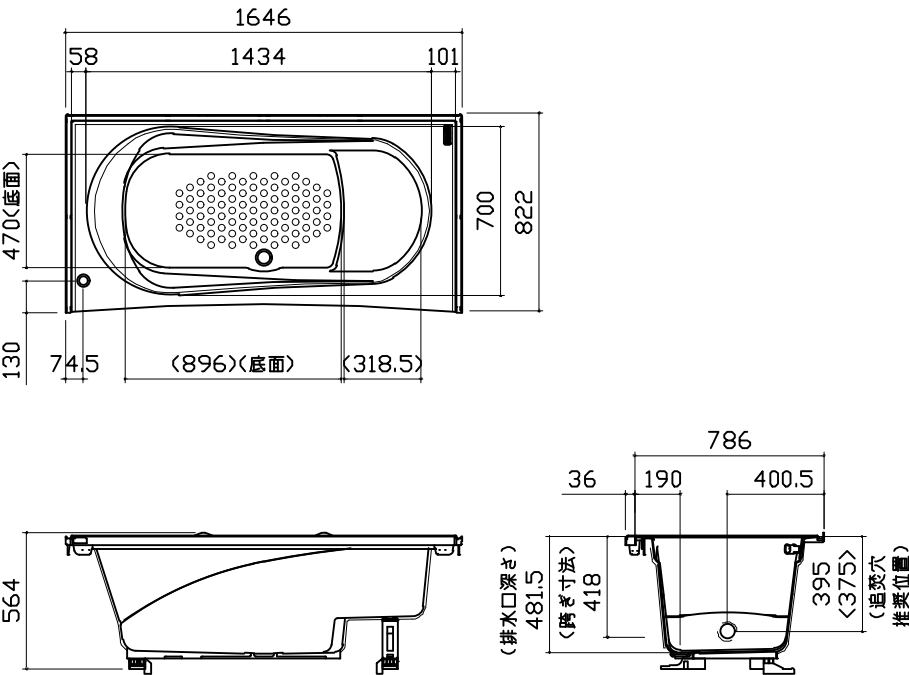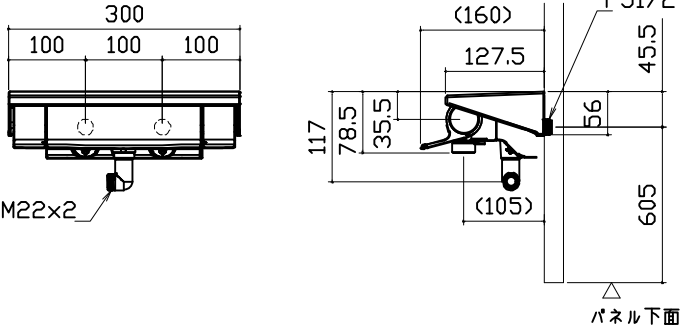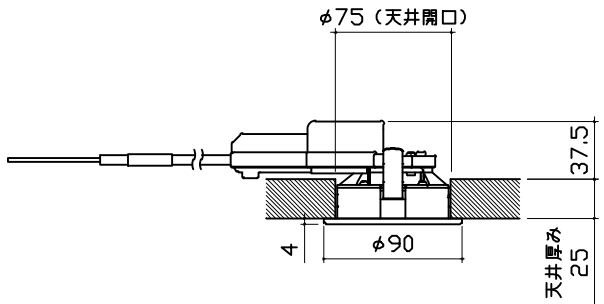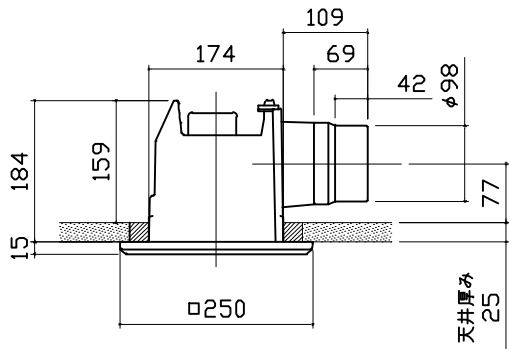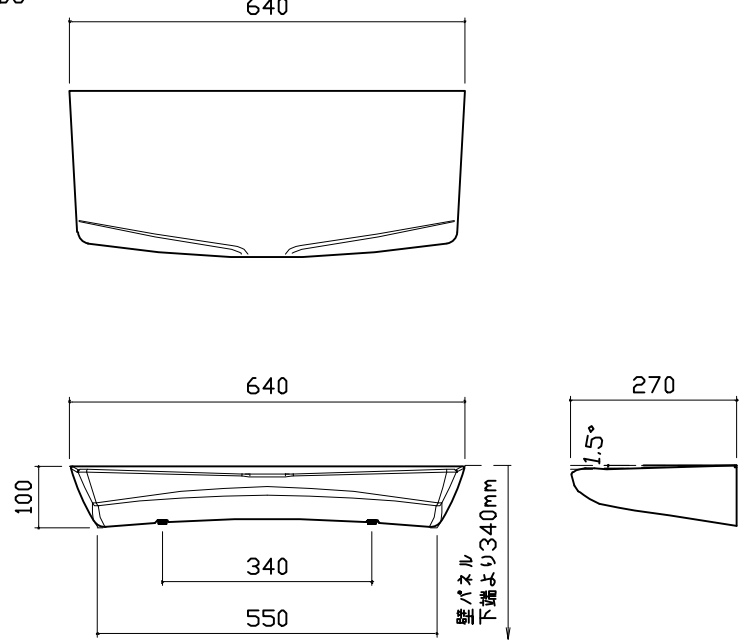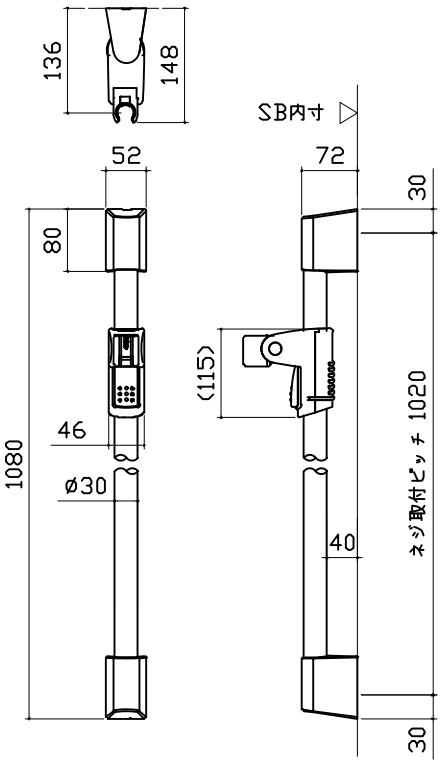浴槽	洗い場用水栓	照明		
 ※ 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと		ダウンライト LED 3.1W (1灯あたり) 		
換気機器	カウンター	シャワーフックスライドバー		
管工事 	本体：ABS 	 材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等 取付部分詳細 		
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 横浜ー小田原SR SB7様邸 現場番号： C3480179 小田原ショールーム	GRANSPA グランspa プラン番号： 2712E-2503-0058T 担当営業： 小田原SR	部材詳細図 1/2 作成日： 2025年3月10日 担当アドバイザー： 小田原SR

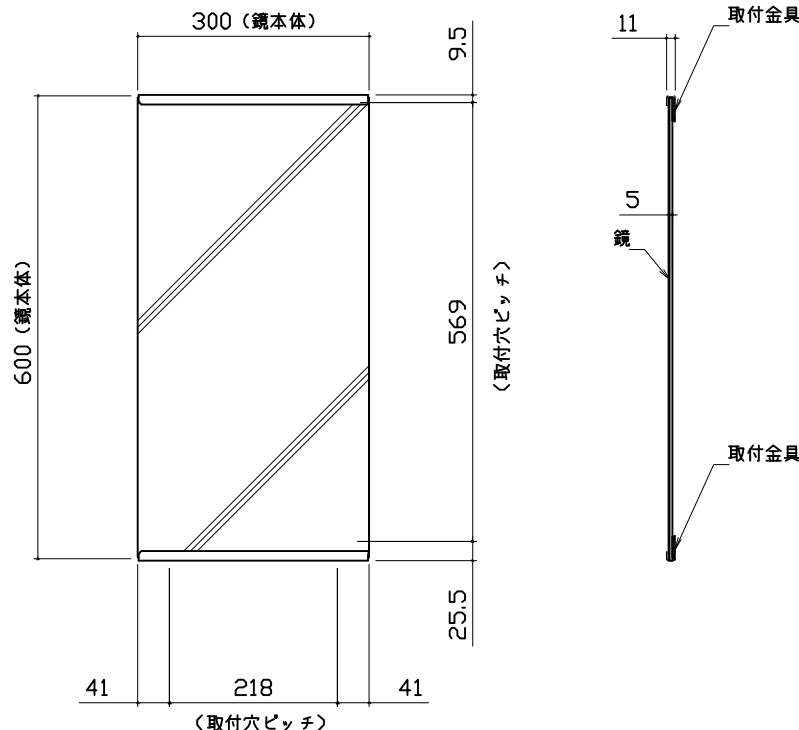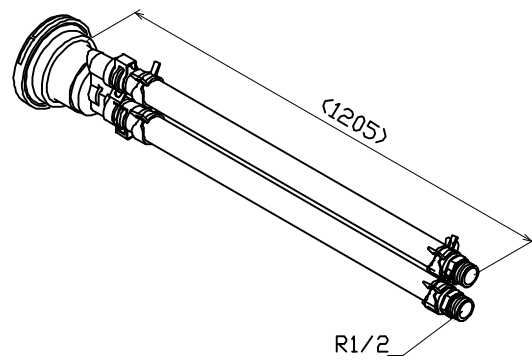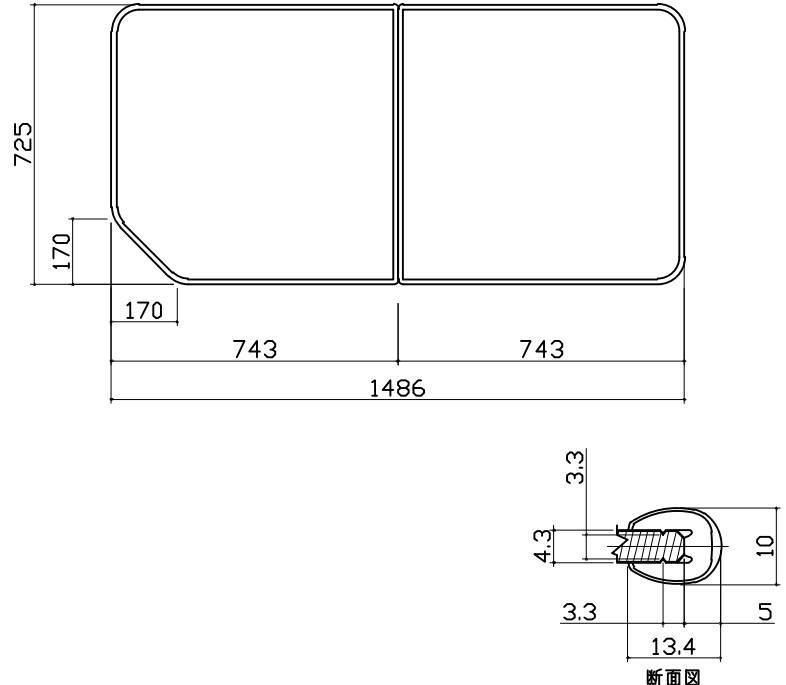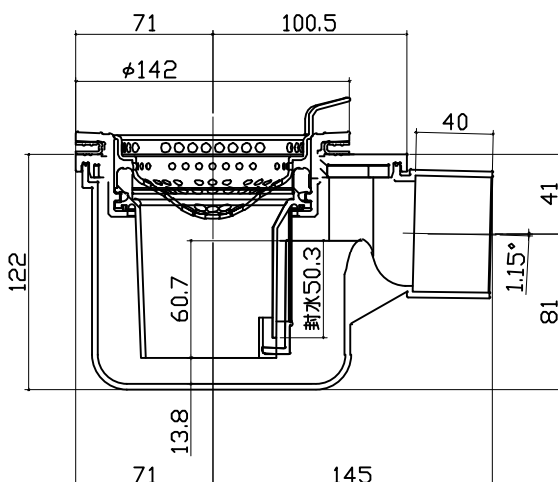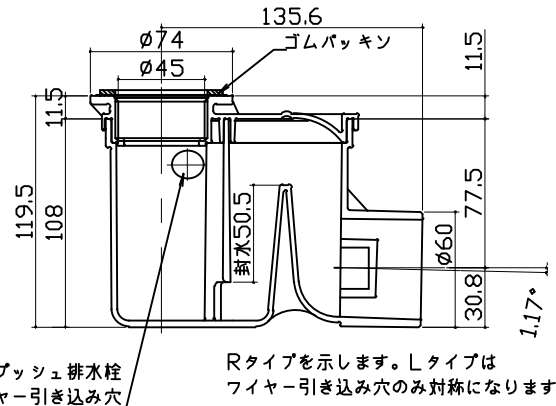ミラー 枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートなし 		循環金具・フロアダプタ関連 		風呂蓋 7077MZA-16RN 		
洗い場側排水トラップ 		浴槽側排水トラップ 				
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 横浜-小田原SR SB7様邸 現場番号： C3480179 小田原ショールーム		GRANSPA グランspa プラン番号： 2712E-2503-0058T 担当営業：小田原SR		部材詳細図 2/2 作成日： 2025年3月10日 担当アドバイザー： 小田原SR

パネル割図		ミラー		シャーフックスライドバー	
ハネK16C2Z 0799 LCLW ハネL16C1N 0799 CLW ハネK16A 0799 CW ハネL16C1N 0799 CW ハネL16C1N 0799 CW ハネL16C1N 0799 CW ハネK16A 0799 CW BR勝手		ハネK16C2Z 0799 LCLW 799 509 291 1259 690 現地加工：φ3.5		ハネK16C2Z 0799 LCLW 799 33 33 64 1774 33 754 現地加工：φ3.5	
Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 横浜-小田原SR SB7様邸		GRANSPA グランspa		穴開け指示図
	現場番号： C3480179		プラン番号： 2712E-2503-0058T		作成日： 2025年3月10日
	小田原ショールーム		担当営業：小田原SR		担当アドバイザー： 小田原SR
					1/1
