

システムバス 御見積書

御名前 ★大阪-大阪SR SB3 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

作成日 2024年10月27日
プラン番号 1801A-2410-0700T
現場番号 C4529601

タカラスタンダード株式会社
◆大阪支社 販売課
大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

◆大阪ショールーム
TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246

商品
御見積金額 ￥734,200 (税込 ￥807,620)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥177,000 (税込 ￥194,700)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》

ユニットサイズ	1317(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カウンター/下カバーカラー	チャコールグレー / -
浴槽前カウンターカラー	-
エプロン材質/カラー	ステンレス / ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ウォルナットブラック
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	13A / 60Hz

◆ 御確認事項

- ★組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ★現場の状況により商品組付費、御見積内容(品番・数量)が変わる場合がございます。
- ★★上記商品ご発注の際は、右枠内にユーザー様もしくは元請業者様の捺印が必要です。
発注後の仕様・カラー変更は出来かねますので、ご確認の上捺印宜しくお願い致します。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
SB3	ウォルナットブラック	田中

◆ 備考

No.*

御名前 ★大阪-大阪SR SB3

様

現場番号

C4529601

プラン番号

1801A-2410-0700T

作成日

2024/10/27

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1317サイズ		1	727,000	727,000
2	架台	低床タイプ ボルト脚架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	人大セミスクエア浴槽	1		
12	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
13	うるぽか湯	なし	1		
14	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
15	浴槽パン	あり	1		
16	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF9032H 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1	+7,000	+7,000
17	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水+3Way):KF9032HE	1	+13,000	+13,000
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	ワイドカウンター	1	-41,000	-41,000
20	シャワーフックスライドバー	あり	1		
21	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Fパネル)	1		
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴あり	1		
23	天井	高光沢フラット天井	1		
24	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
25	換気機器開口	工場開口	1		
26	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(白色)	1		
27	天井照明開口	工場開口	1		
28	ミラー	ロングクリアミラー	1		
29	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
30	タオル掛け	スクエアタイプ	1		
31	ハンドバー	樹脂製 I型400タイプ(ホワイト)	1	+8,000	+8,000

御名前 ★大阪-大阪SR SB3 様

現場番号	C4529601	プラン番号	1801A-2410-0700T	作成日	2024/10/27
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	スクエアタイプ(3段)＜チャコールグレー＞	1	+1,700	+1,700
33	どこでもラック	マルチラック＋フック＋タオルハンガー(ホワイト)	1	+5,000	+5,000
34	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
システムバス合計			35		¥734,200

商品総合計	35	¥734,200
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥177,000 (税込 ¥194,700)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

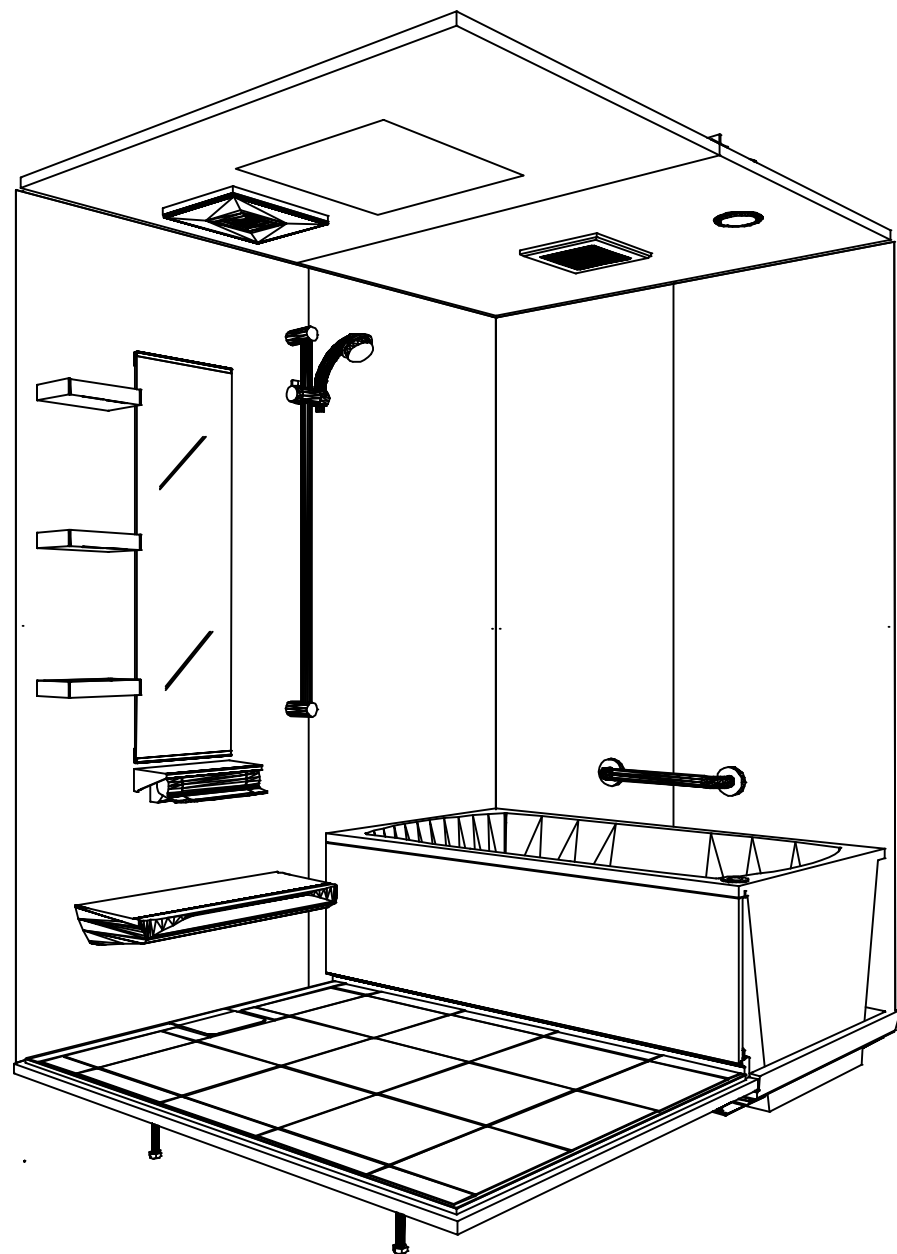

鳥瞰図

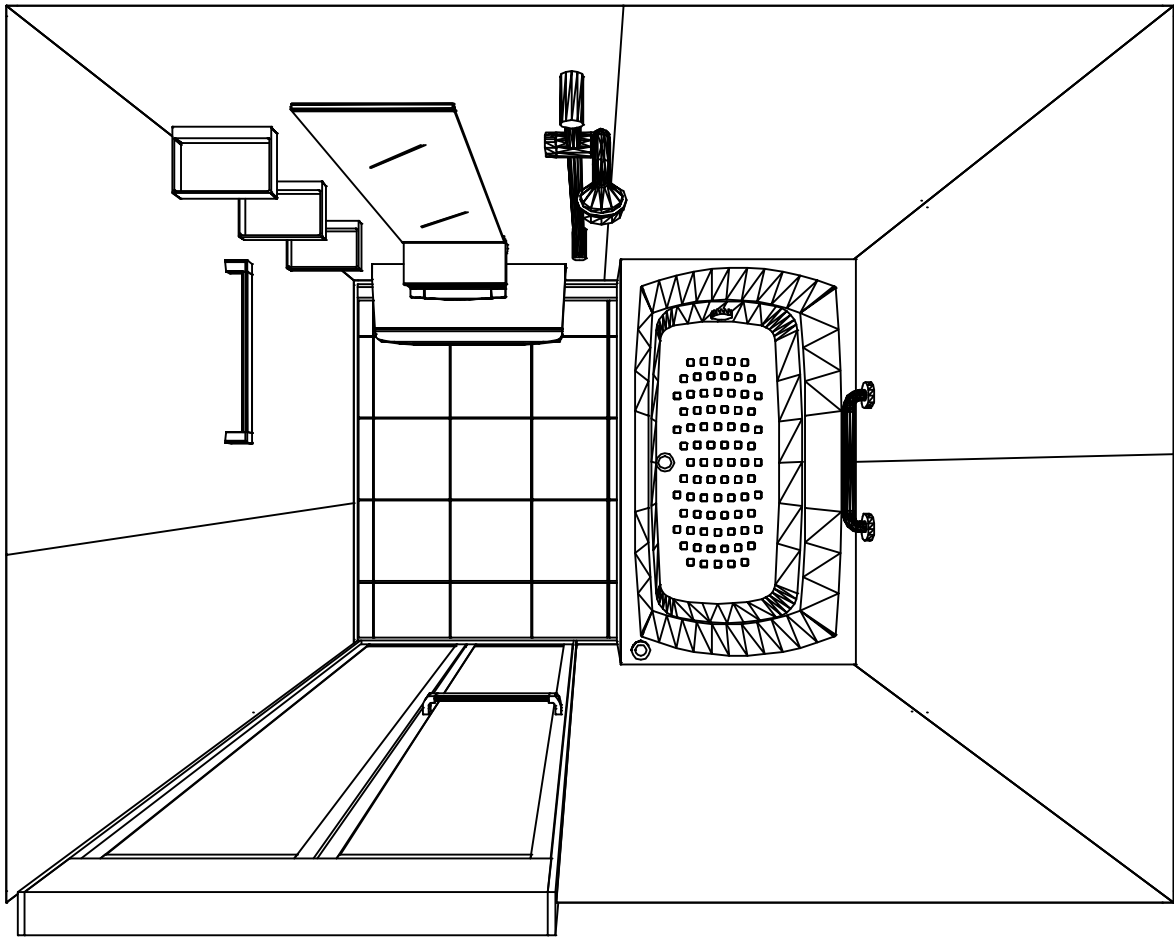

1317

高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： ★大阪ー大阪SR SB3様邸	GRANSPA グランspa	姿図
現場番号： C4529601	プラン番号： 1801A-2410-0700T	作成日： 2024年10月27日
大阪支社 販売課	担当営業：SB3	担当アドバイザー： ウォルナットブラック

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項



* 印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

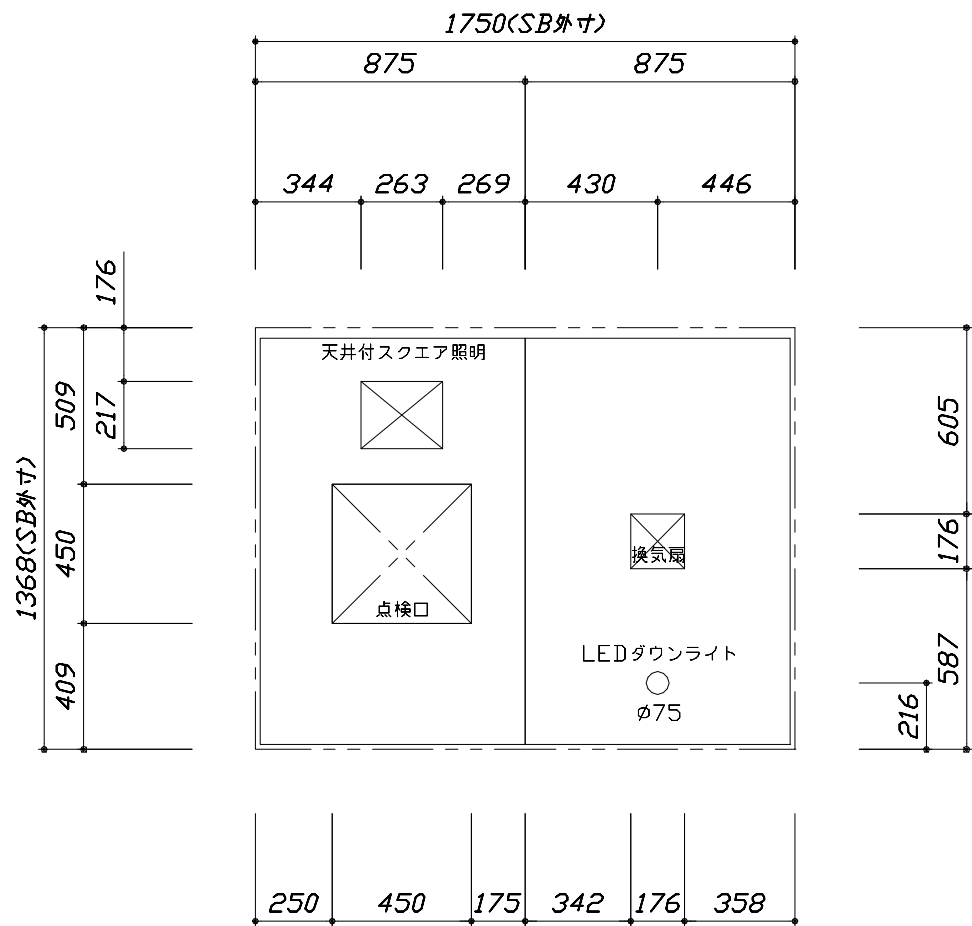

< 天井伏図 >

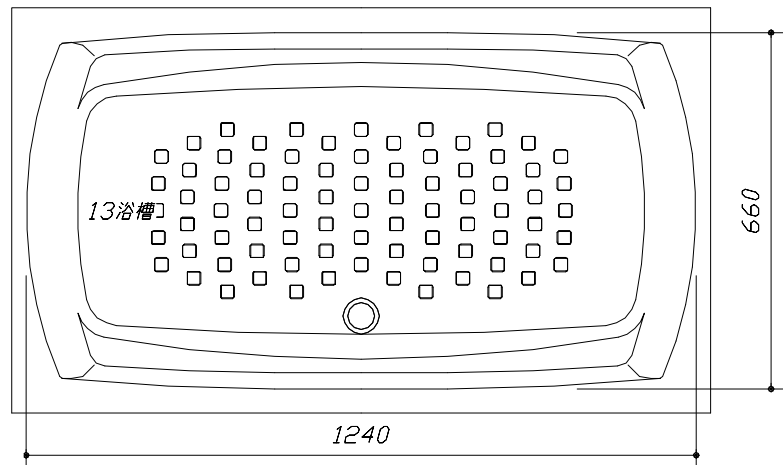


< 浴槽詳細図 >

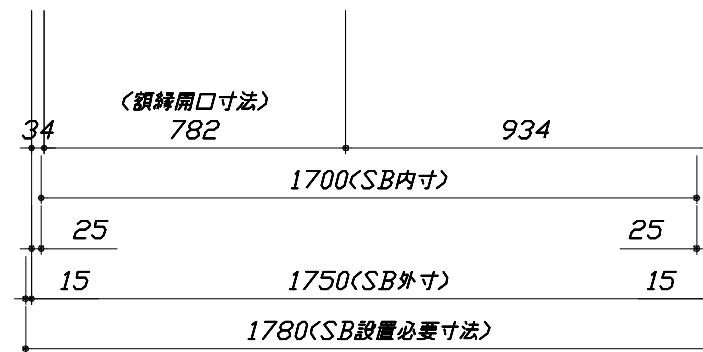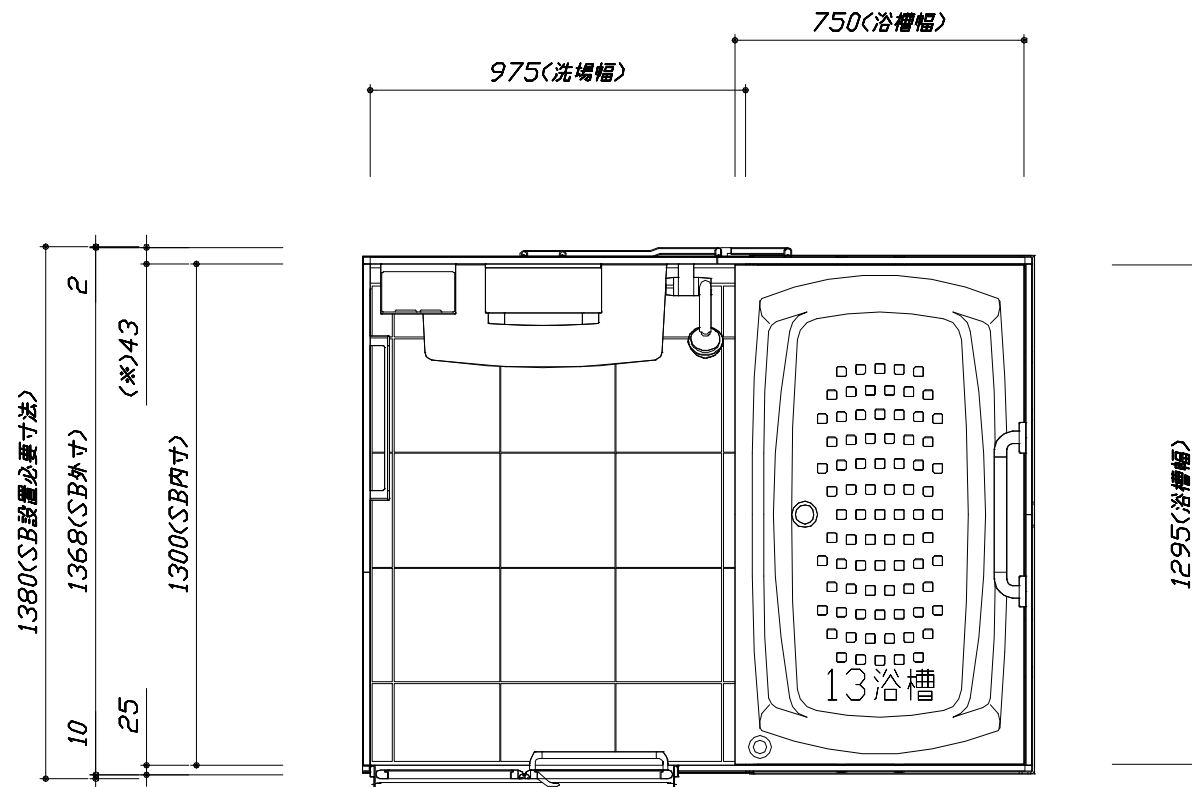

< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

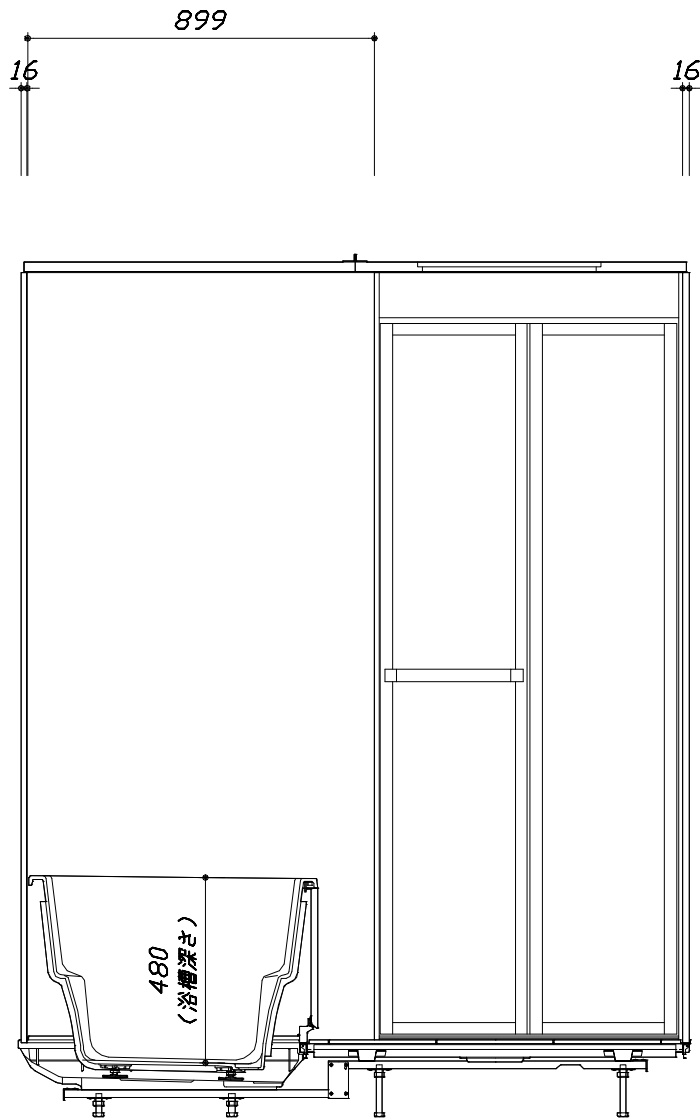

< カウンター対面図 >



■ボルト脚架台高さ寸法
各ずり高さに対して
-9~+11mm調整可能

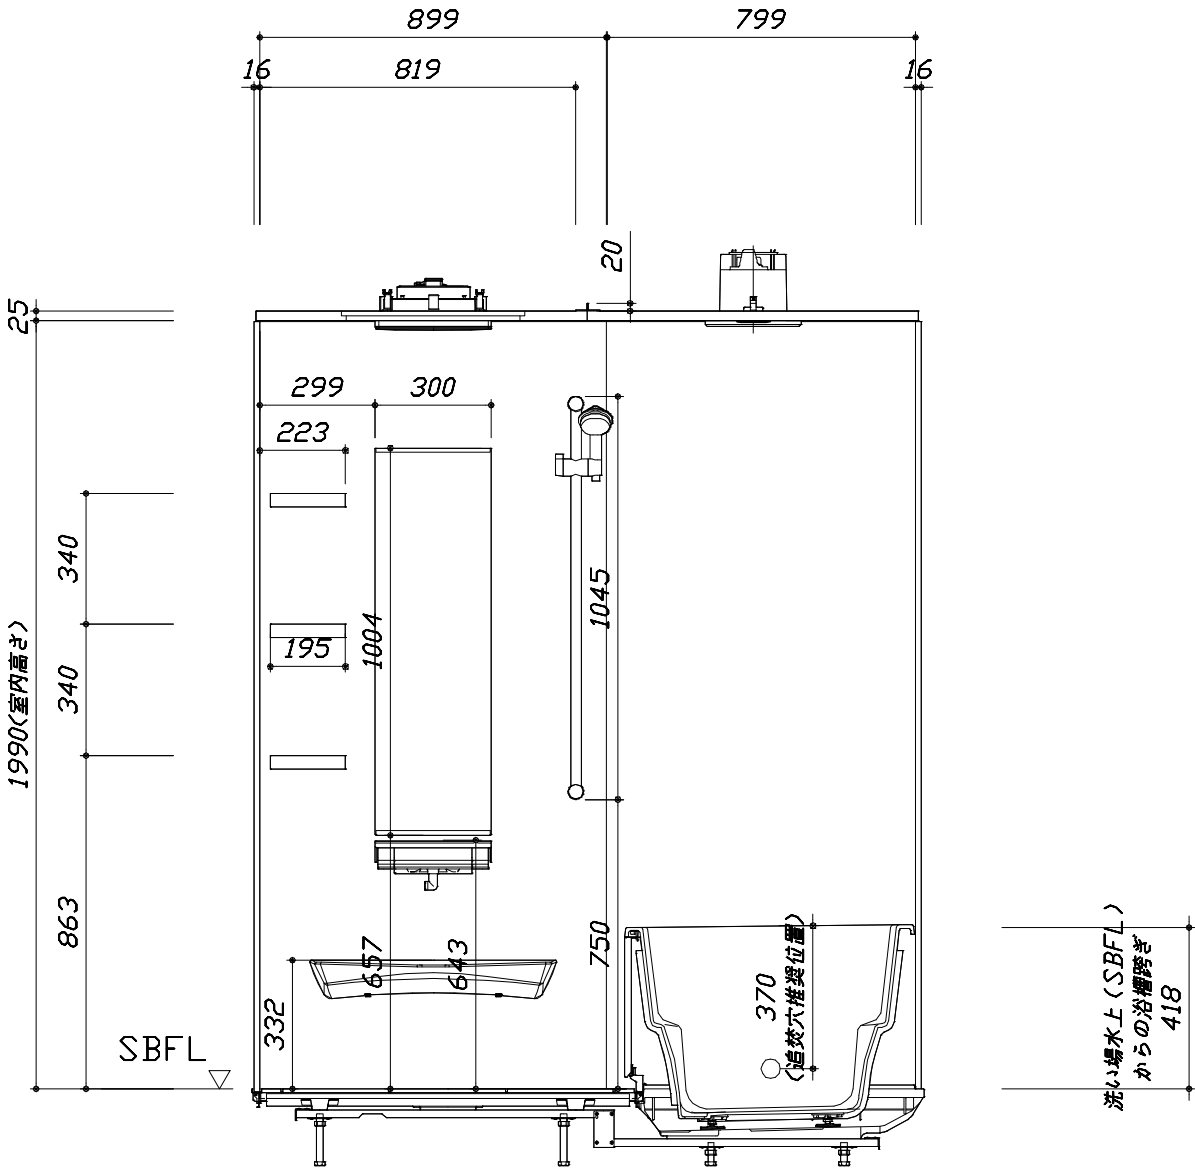

< カウンター面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

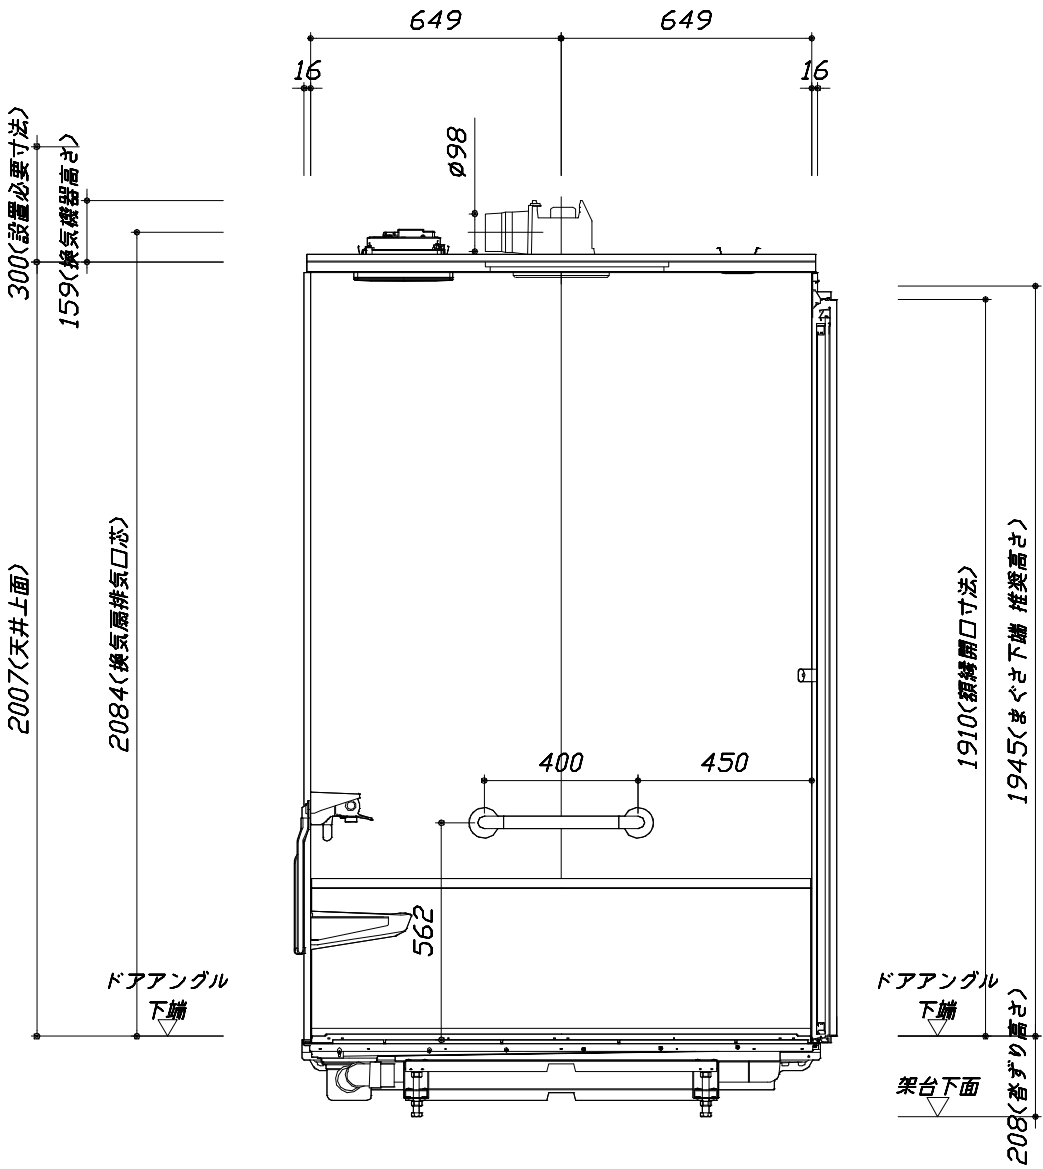

■ボルト脚架台高さ寸法
各ずり高さに対して
-9 ~ +11mm調整可能

< 浴槽側面図 >

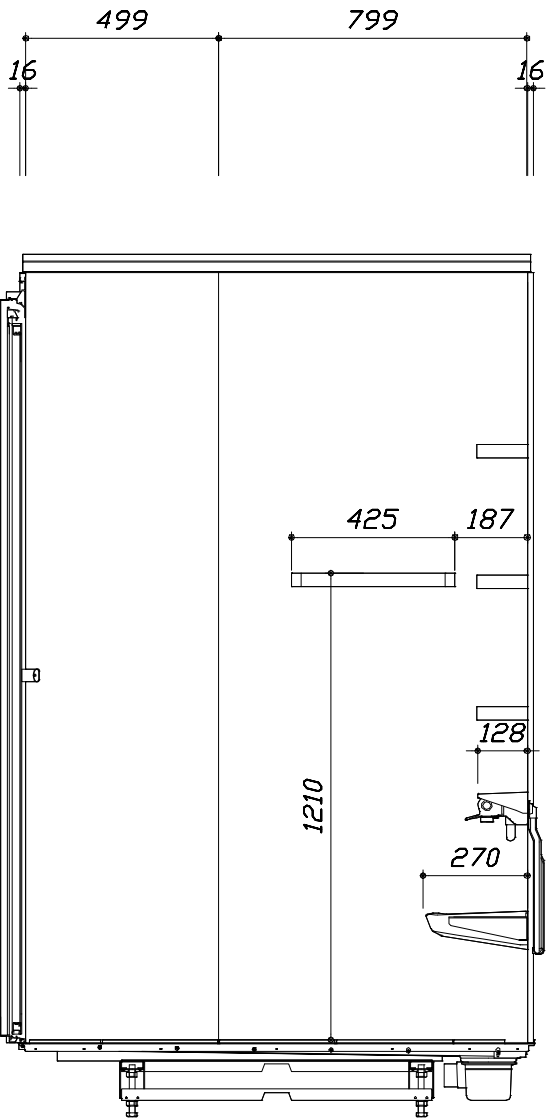

< 洗場側面図 >

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： ★大阪ー大阪SR SB3様邸	GRANSPA グランspa	施工図3	縮 尺： 1:20
	現場番号： C4529601	プラン番号： 1801A-2410-0700T	作成日： 2024年10月27日	
	大阪支社 販売課	担当営業：SB3	担当アドバイザー： ウォルナットブラック	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1317サイズ(室内容量4.4立方メートル)
ドア勝手	AL勝手
架台	ボルト脚架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（13浴槽・280リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さFタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：あり
天井	高光沢パネリッパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓1	－
窓2	－
窓枠1	－
窓枠2	－
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂、 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	245kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（3段）
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)：ABS樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KVK KF9032HE) (樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（スライドバー-TN-1020）
照明	天井付スクエア照明+LEDダウンライト（LED 15.1W白色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W) (ダクト径φ98) ホワイト
フロフト	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	樹脂製 I型400タイプ ホワイト
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	CG：チャコールグレー
パネル(カウンター面)	YK：ウォルナットブラック
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	CG：チャコールグレー
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HW：カームホワイト
ドア / 天井	W：ホワイト / HW：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(CG：チャコールグレー)
タオル掛け	スクエアタイプ(ホワイト)
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： ★大阪－大阪SR SB3様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C4529601	プラン番号： 1801A-2410-0700T	作成日： 2024年10月27日	
	大阪支社 販売課	担当営業：SB3	担当アドバイザー：ウォルナットブラック	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		


※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする



■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

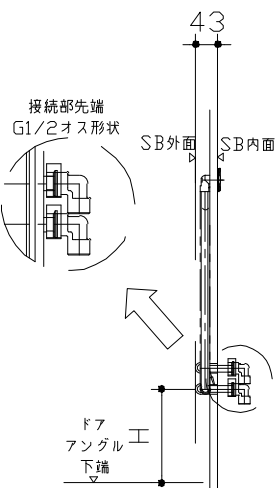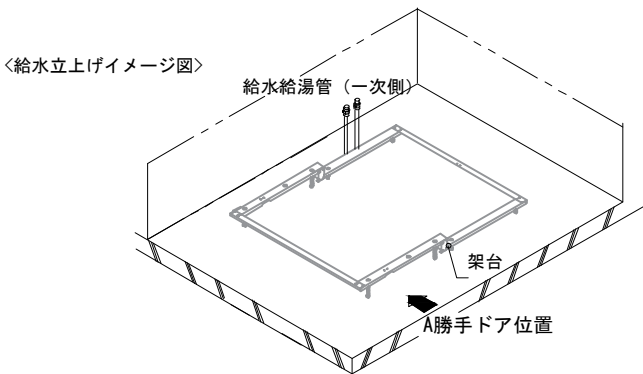



ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

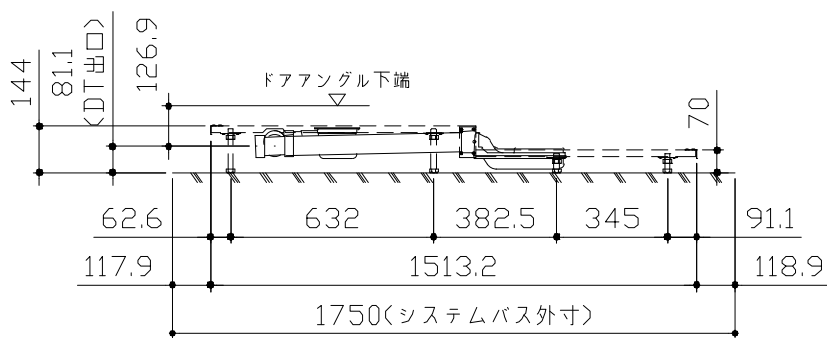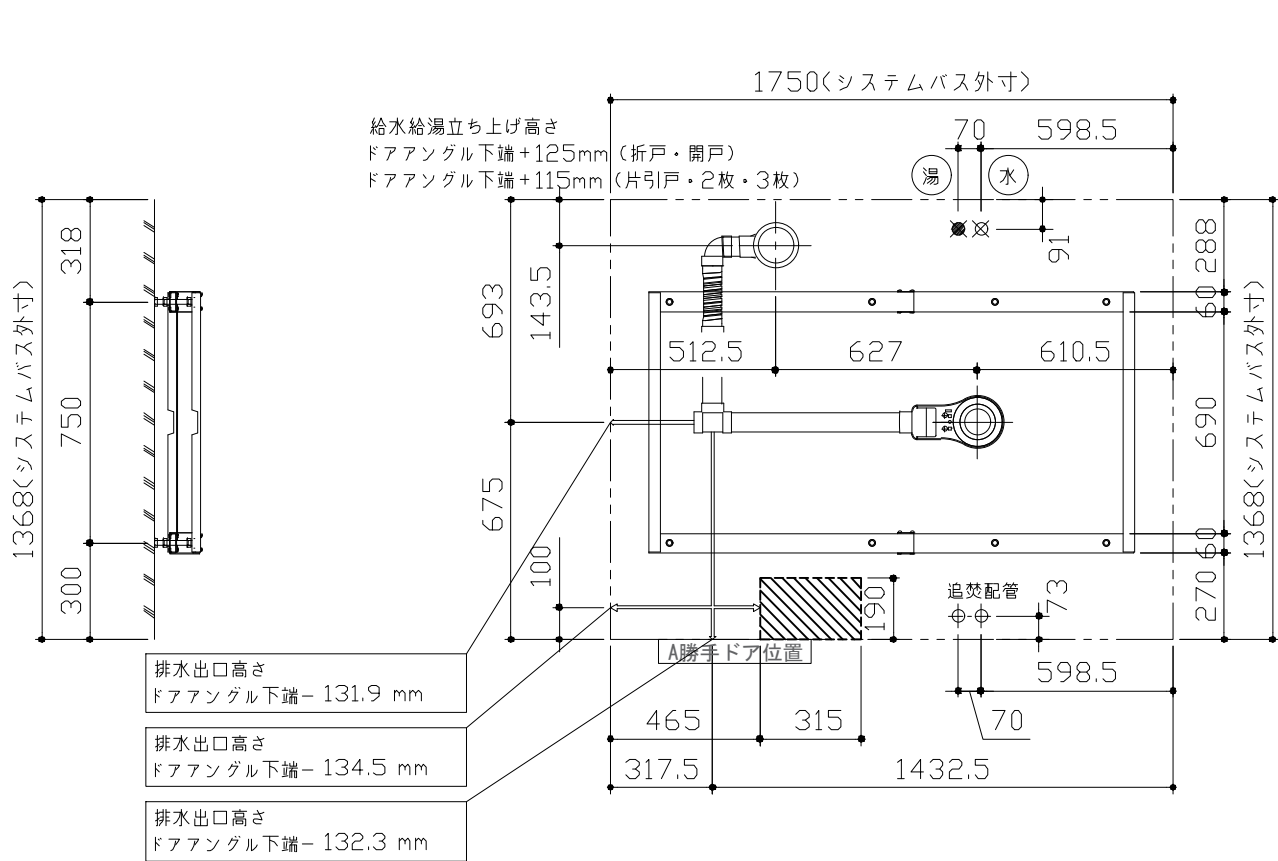

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

■ 設備記号	
記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置
▨	排水管立上げ推奨範囲 (VP50)





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯・追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水柱・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

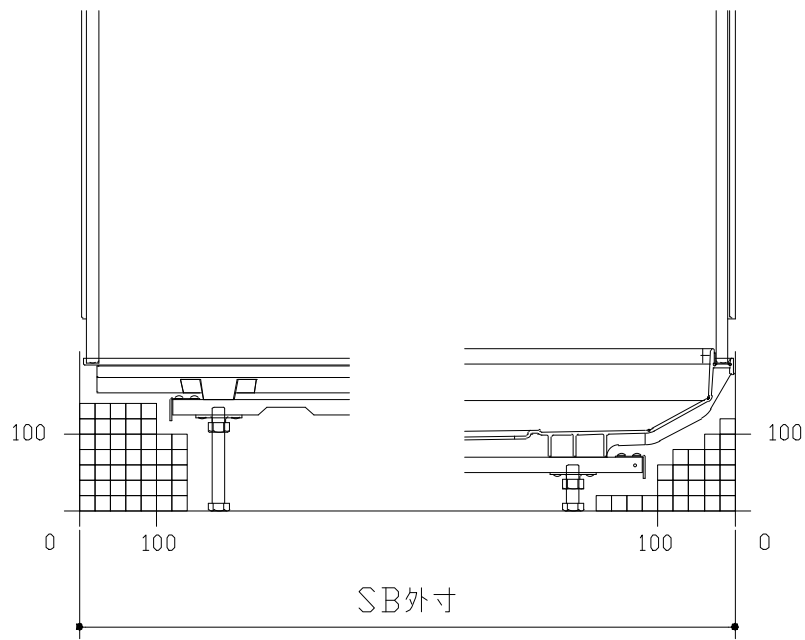


B矢視

A矢視

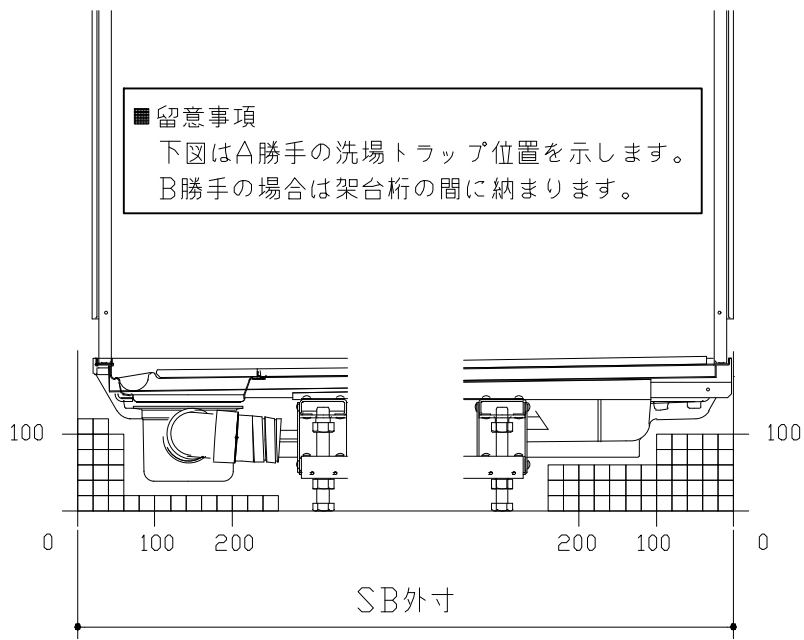

D矢視




C矢視

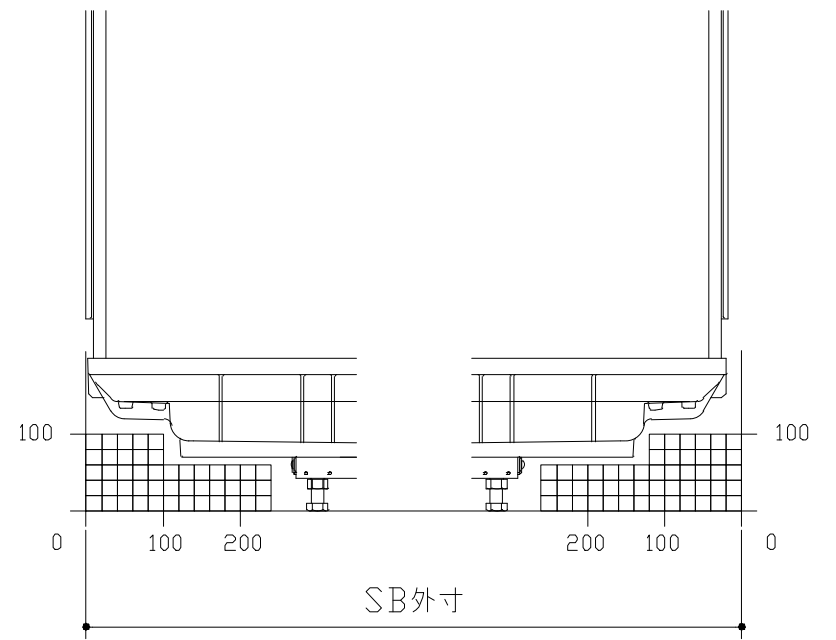


F矢視

E矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

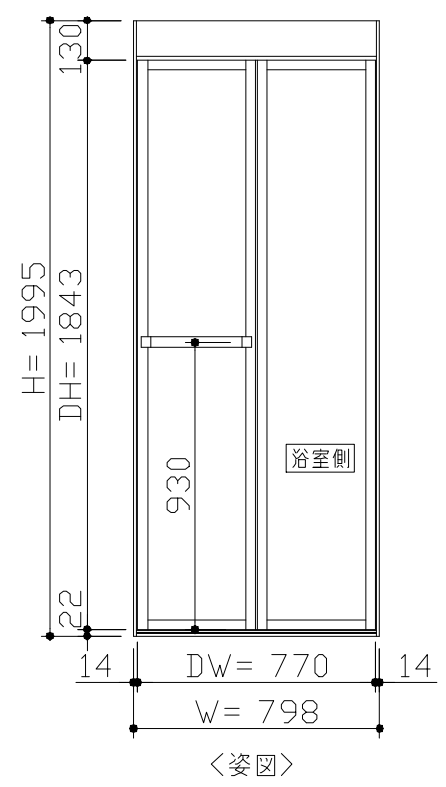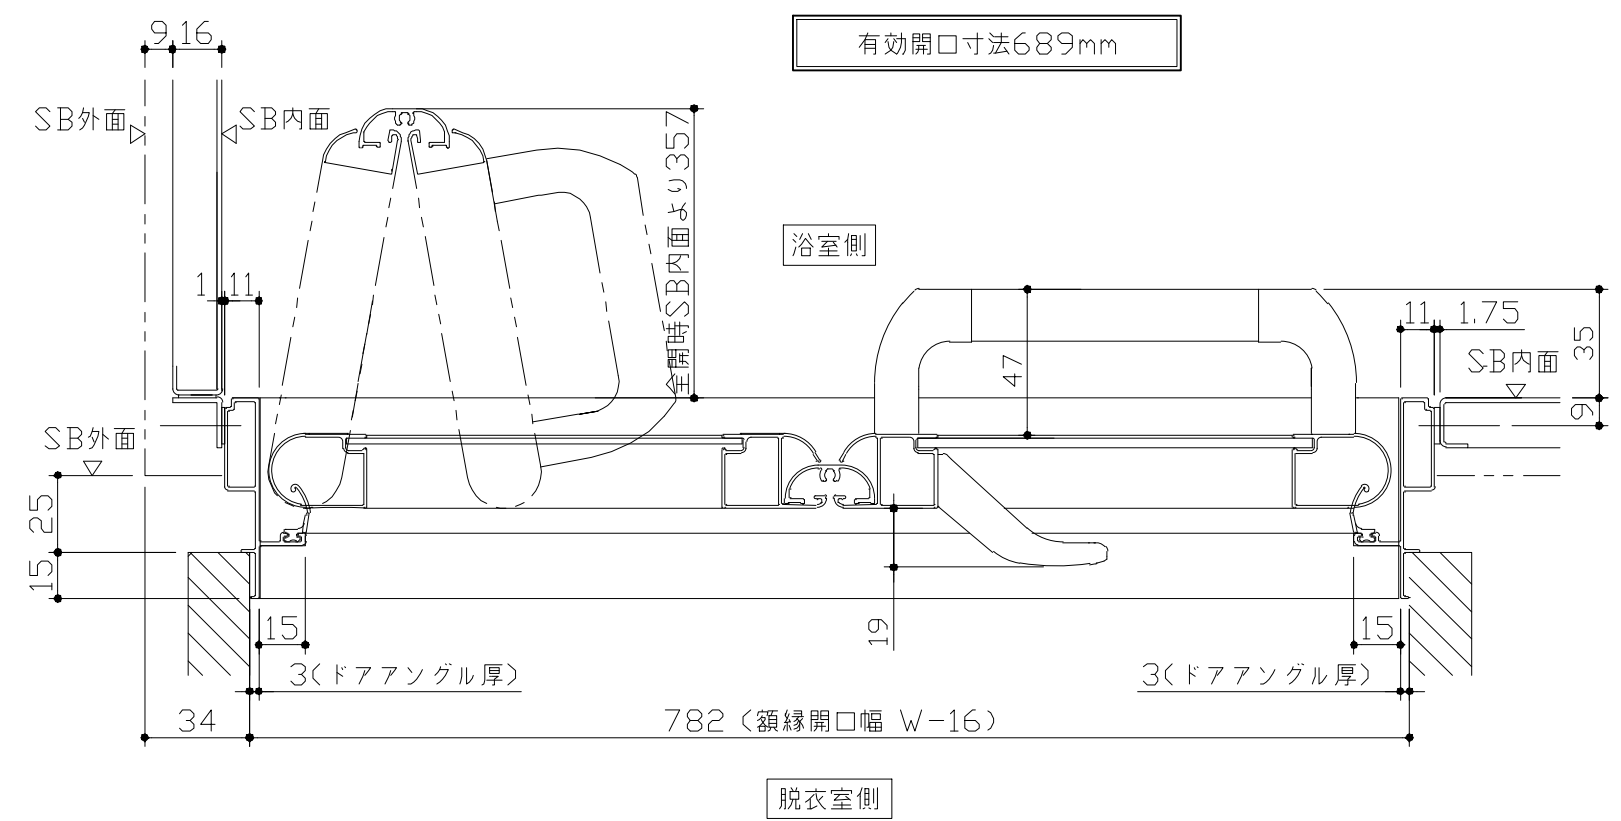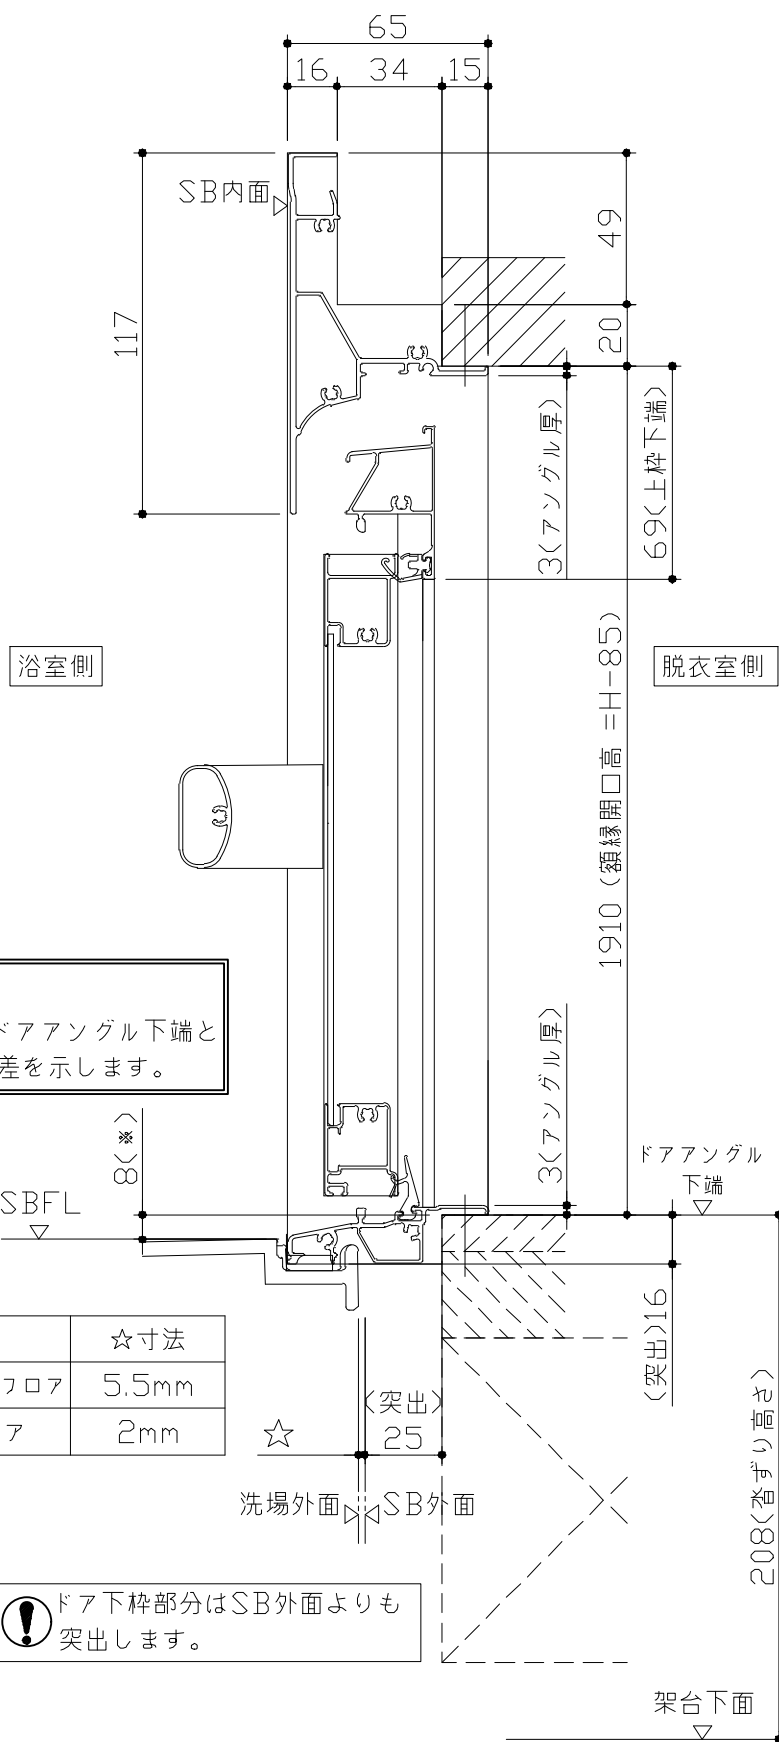

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

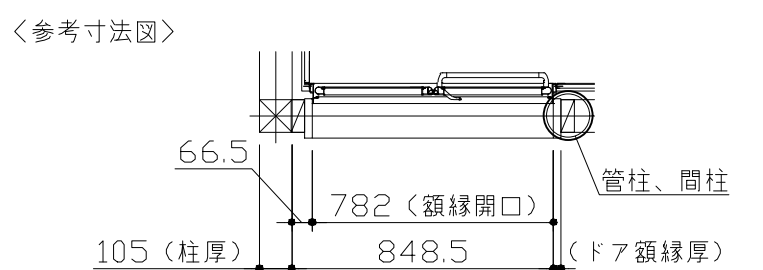


■ 留意事項

※ 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm












❗ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。


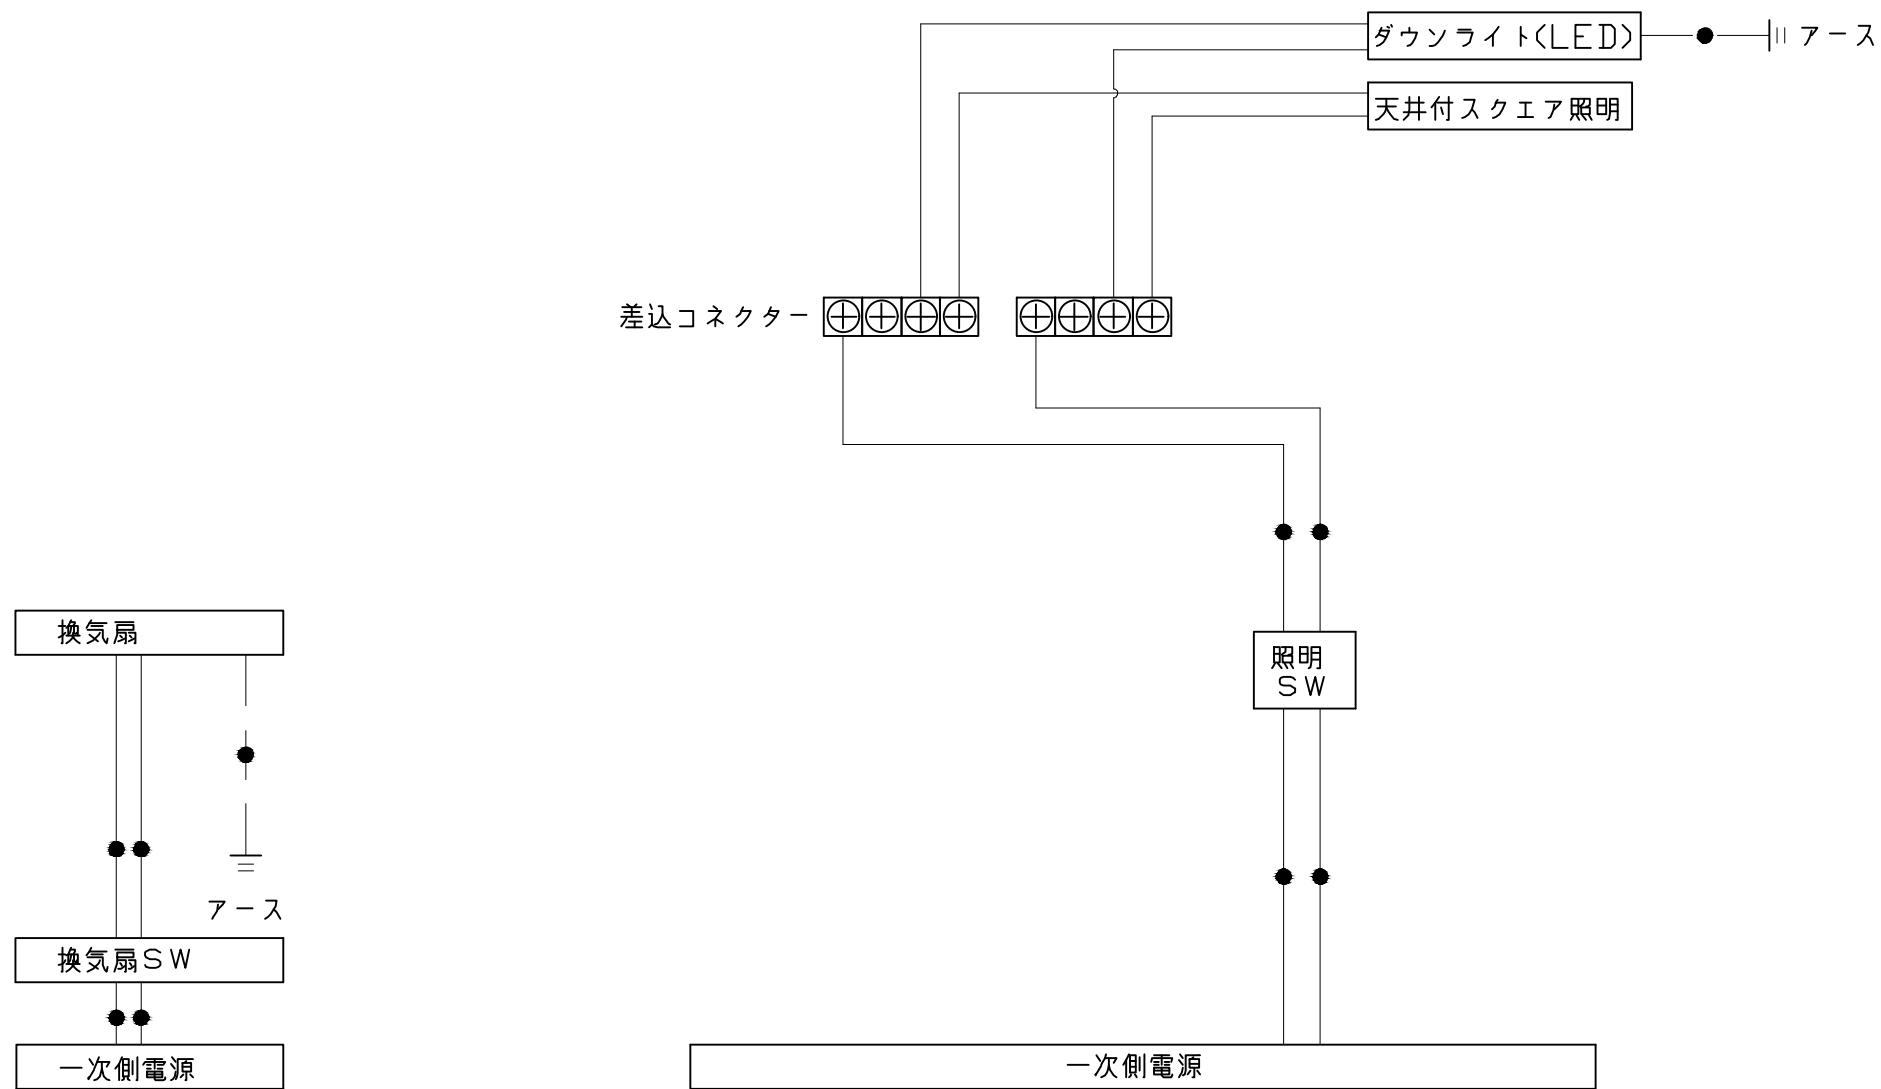






一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽 <
--

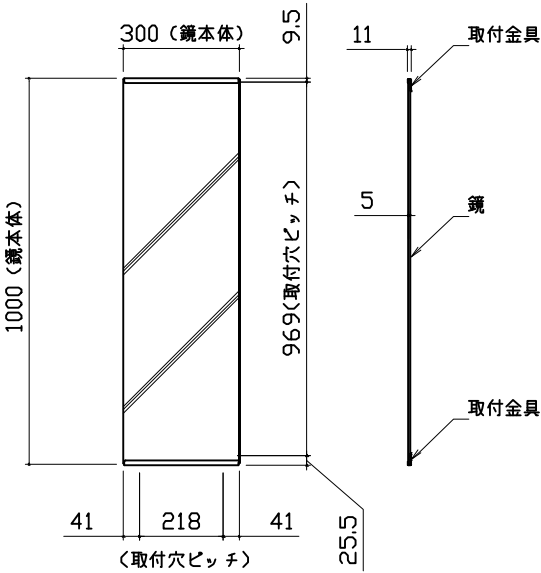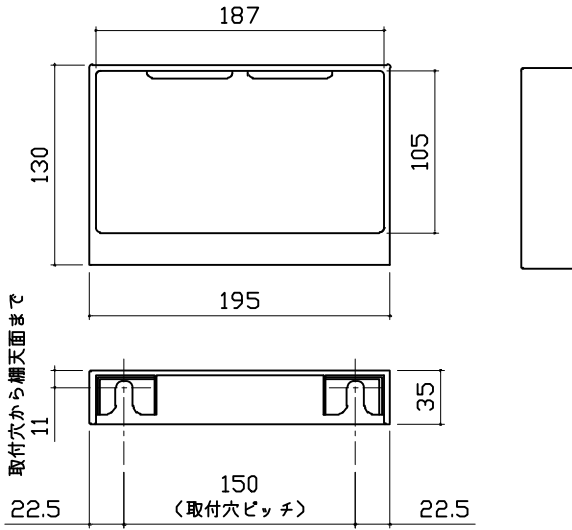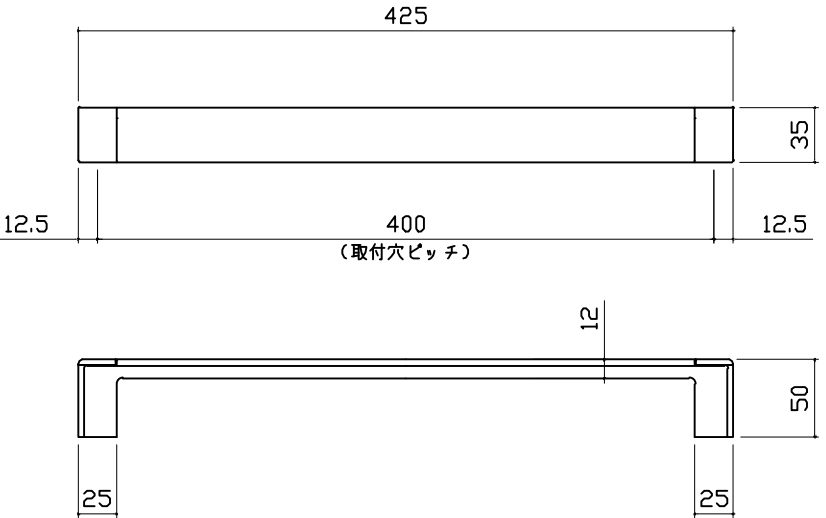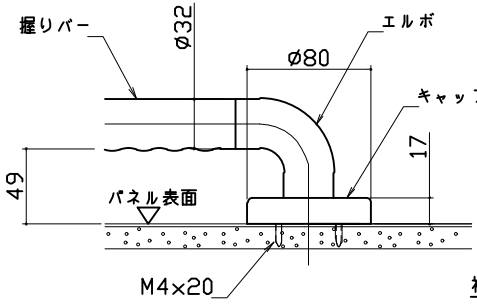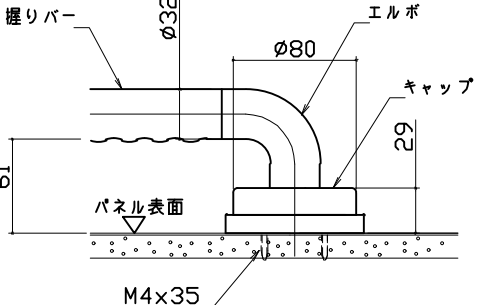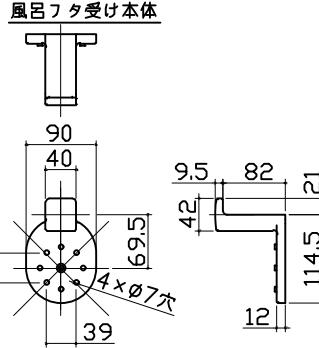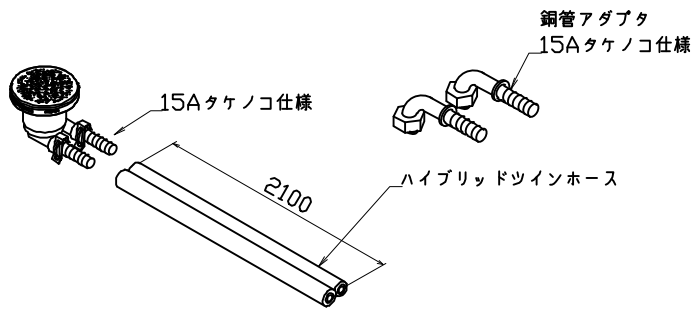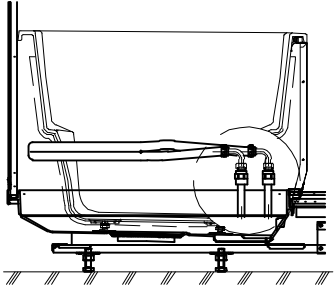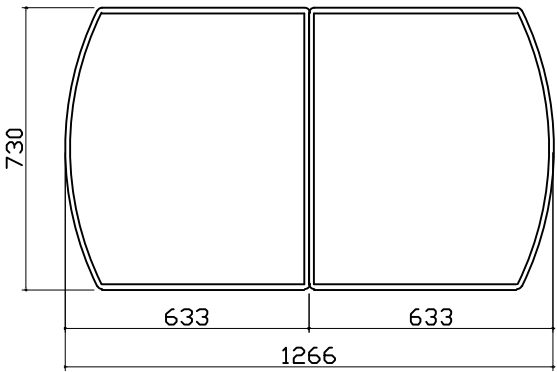ミラー	収納棚	タオル掛け		
枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A） 表面防曇コートなし（ロングミラー-A） 	本体：ABS 	本体：ABS キャップ：ABS 		
ハンドバー 支持部取合詳細図	循環金具・フロアダプタ関連	風呂蓋 707MVA-13W		
安心ハンドバー（風呂フタフック付）以外の場合  安心ハンドバー（風呂フタフック付）の場合  補助スパーサー  風呂フタ受け本体 	  追焚配管立上図	  断面図		
 タカラスタンダード株式会社	現場名称：★大阪ー大阪SR SB3様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図	2/3
	現場番号：C4529601	プラン番号：1801A-2410-0700T	作成日：2024年10月27日	
	大阪支社 販売課	担当営業：SB3	担当アドバイザー：ウォルナットブラック	

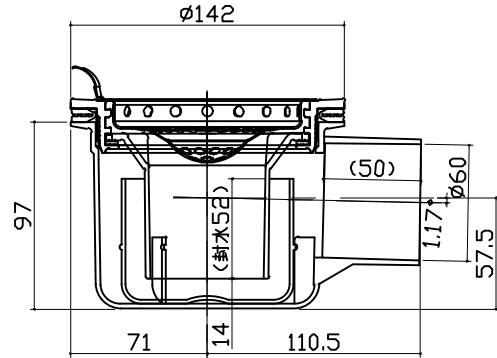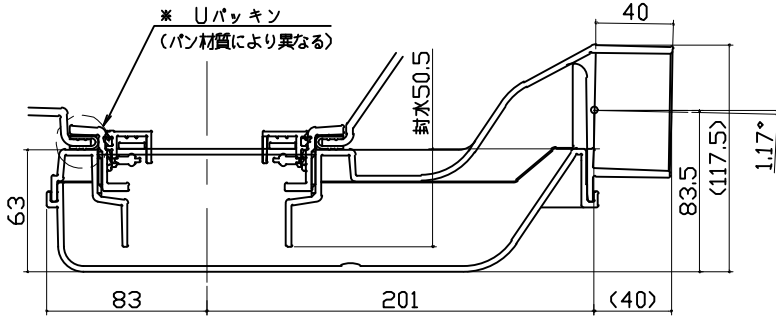洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ			
					

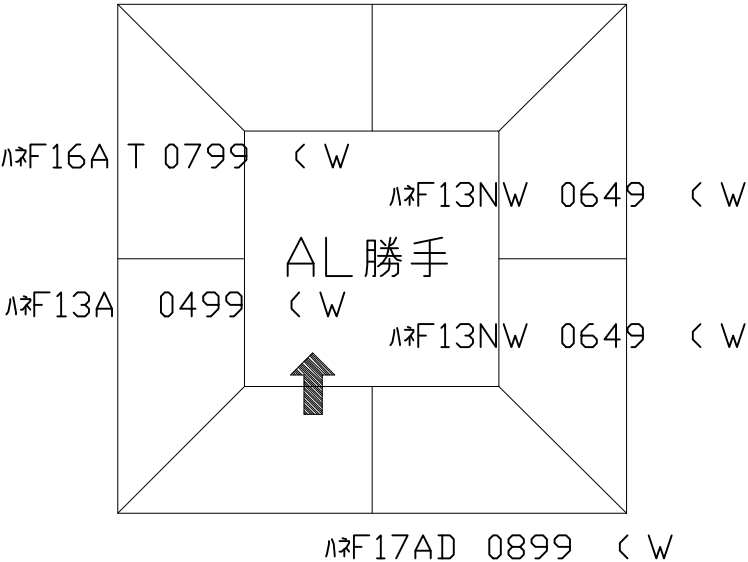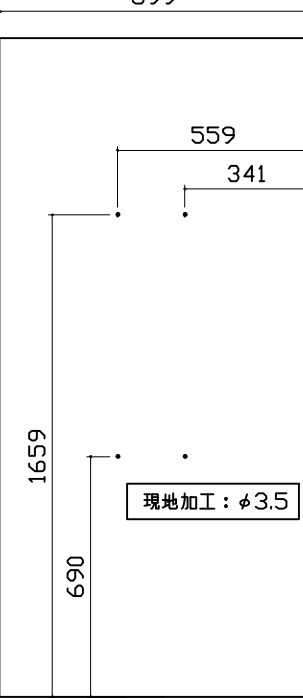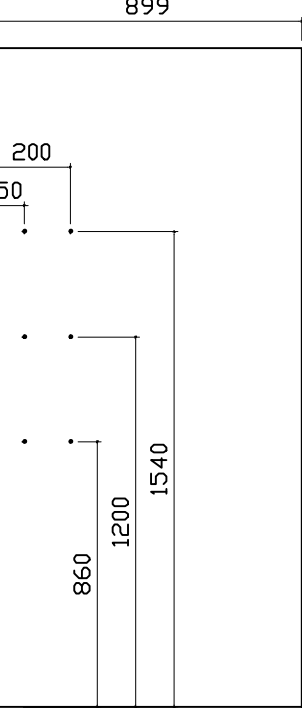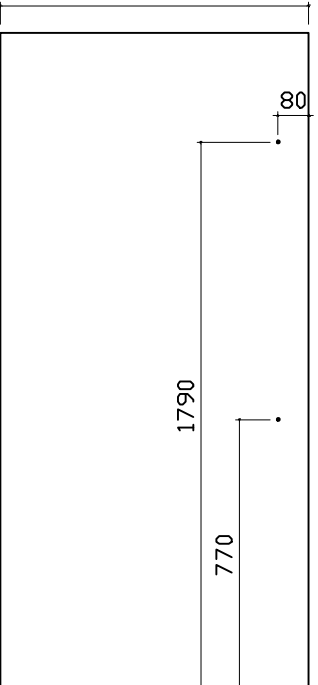パネル割図		ミラー		収納棚	
ハネF17C2Z 0899 LKYK ハネF16C1G 0799 RKYK ハネF16A T 0799 < W ハネF13A 0499 < W ハネF13NW 0649 < W ハネF13NW 0649 < W ハネF17AD 0899 < W AL勝手 		ハネF17C2Z 0899 LKYK 899 559 341 1659 690 現地加工：φ3.5 		ハネF17C2Z 0899 LKYK 899 200 50 860 1200 1540 現地加工：φ3.5 	
シャフーフックスライダー					
ハネF17C2Z 0899 LKYK 899 80 1790 770 現地加工：φ3.5 					
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称：★大阪ー大阪SR SB3様邸		GRANSPA グランSPA	
		現場番号：C4529601		プラン番号：1801A-2410-0700T	
		大阪支社 販売課		担当営業：SB3	
				穴開け指示図	1/1
				作成日：2024年10月27日	
				担当アドバイザー：ウォルナットブラック	
