

システムバス 御見積書

御名前 北海道-中央SR SB5 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2024年8月1日
プラン番号 1200B-2405-0044T
現場番号 C3870211

タカラスタンダード株式会社
◆札幌中央ショールーム
札幌市中央区北3条東11丁目338番地
苗穂ヒラクスEAST 1階
TEL 011-219-1611 / FAX 011-219-1614
◆北海道支店 販売一課
TEL 011-862-6111 / FAX 011-862-6183

商品
御見積金額 ￥653,800 (税込 ￥719,180)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥146,500 (税込 ￥161,150)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(BR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームベージュ
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ベージュ
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	樹脂
カウンター/下カバーカラー	ベージュ / -
浴槽前カウンターカラー	-
エプロン材質/カラー	樹脂 / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ブリックダーク
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	13A / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		若林

◆ 備考

■売却時注意
浴槽追い炊き穴無し、浴槽用水栓無しです。
売却時現場により、追い炊き穴加工か、
水栓の追加が必要となります。

--	--

No.*

御名前 北海道-中央SR SB5

様

現場番号	C3870211	プラン番号	1200B-2405-0044T	作成日	2024/8/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイ特)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームベージュ)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	FRP(ベージュ)	1	-88,000	-88,000
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	FRP浴槽用保温材なし(ベージュ)	1		
11	浴槽形状	FRPラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	浴槽パン	なし	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF9032SJN1 水栓上部カウンター(ベージュ)	1		
15	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032SJN1	1		
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	ワイドカウンター	1	-38,000	-38,000
18	シャワーフックスライドバー	あり	1		
19	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1		
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	フラット天井	1	-15,000	-15,000
22	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	天井付スクエア照明+ダウンライト(1灯)(電球色)	1		
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	ロングミラー	1	-6,500	-6,500
27	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
29	ハンドバー	樹脂製 L型600×600タイプ(風呂フタフック付)(バー:ベージュ、フック:ホワイト)	1	+22,000	+22,000
30	収納棚	収納棚なし	1		
31	どこでもラック	タオルハンガーL(ホワイト)	1	+2,800	+2,800

御名前 北海道-中央SR SB5 様

現場番号	C3870211	プラン番号	1200B-2405-0044T	作成日	2024/8/1
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	吊り金具	62LL	1	+16,500	+16,500
33	給水給湯管	洗い場1水栓<上配管 カウンター側接続>	1		
34	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
35	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンなし)	1		
システムバス合計			35		¥653,800

商品総合計	35	¥653,800
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥146,500 (税込 ¥161,150)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

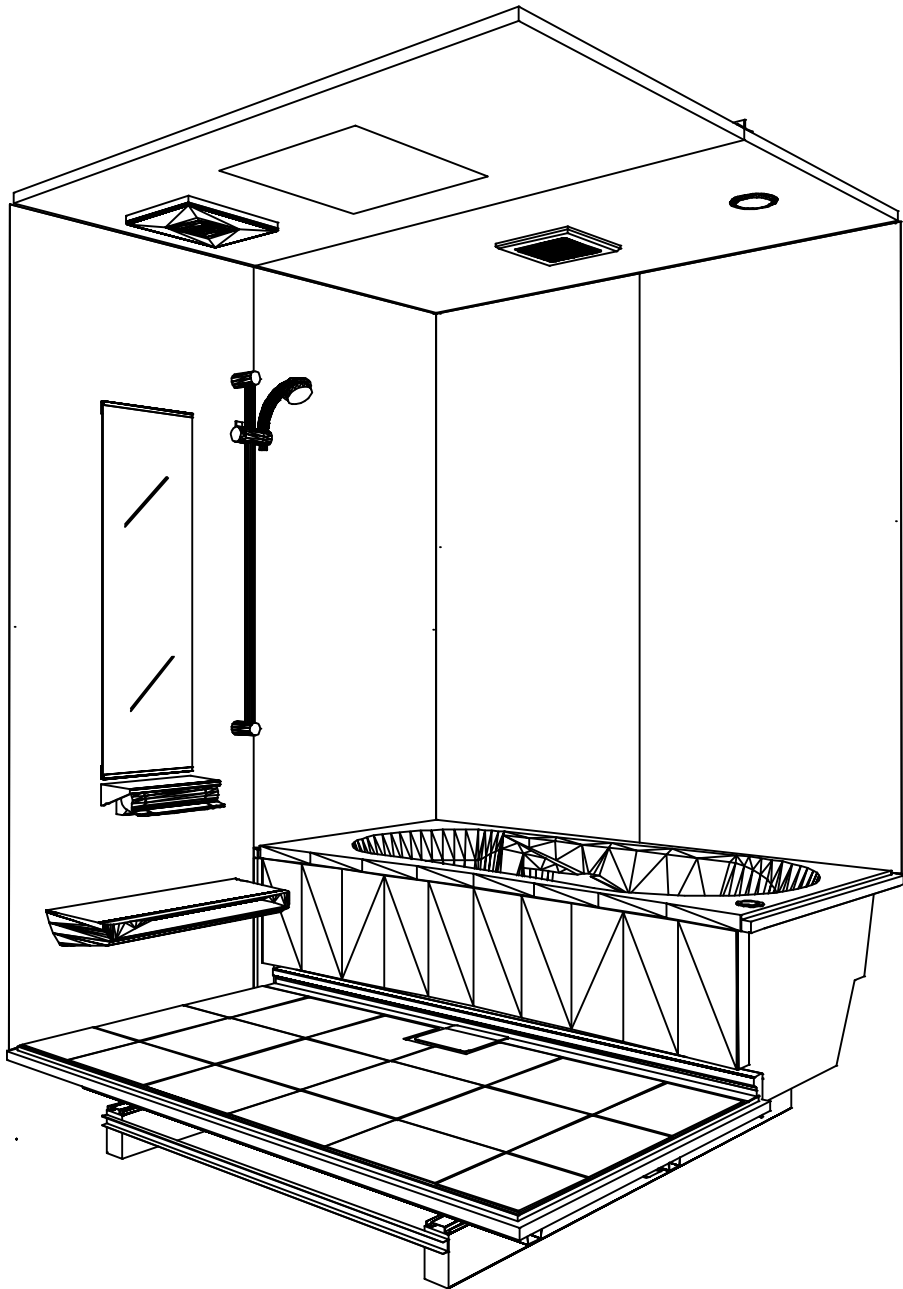

鳥瞰図

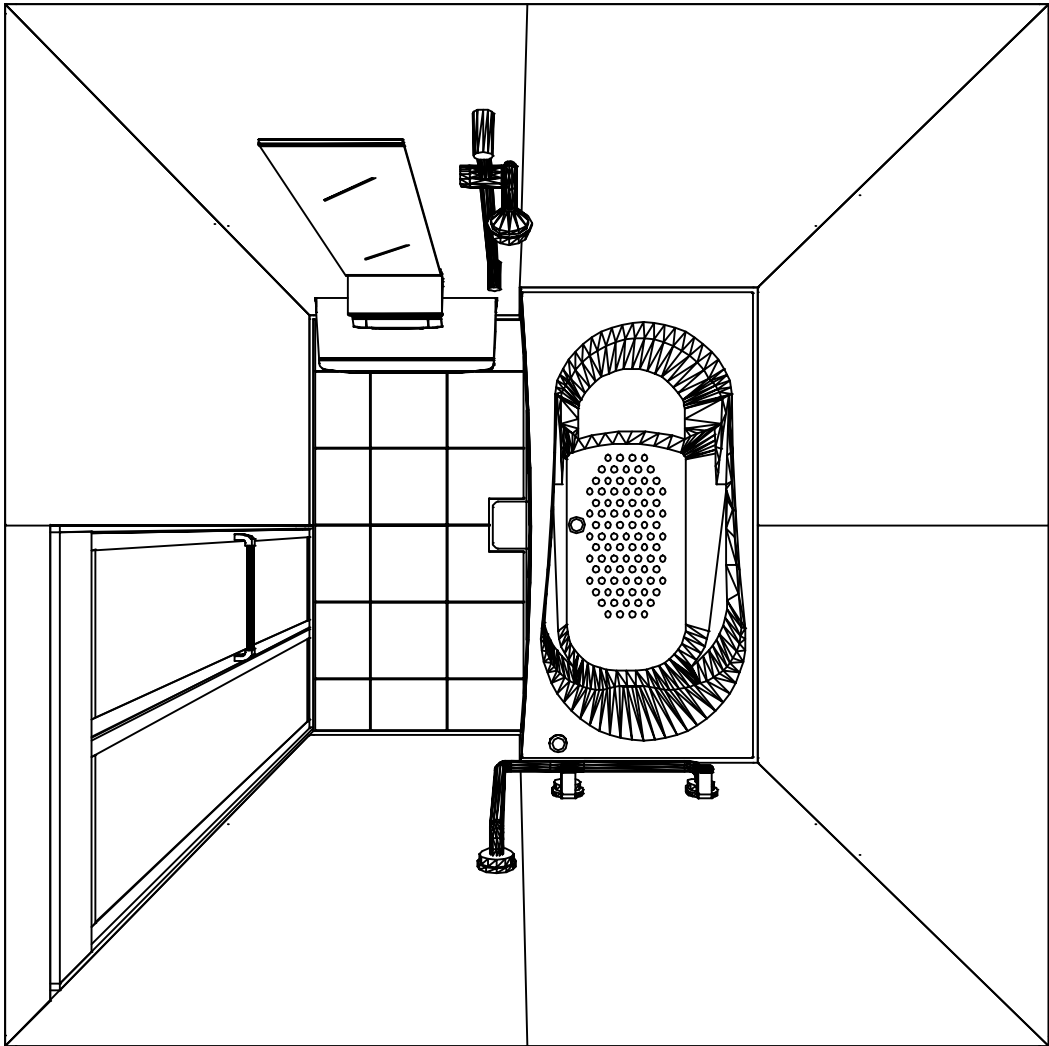

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 北海道ー中央SR SB5様邸	GRANSPA グランスパ	姿図	
現場番号： C3870211	プラン番号： 1200B-2405-0044T	作成日： 2024年8月1日	
札幌中央ショールーム	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

カウンター面


洗場側面

浴槽側面


カウンター対面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

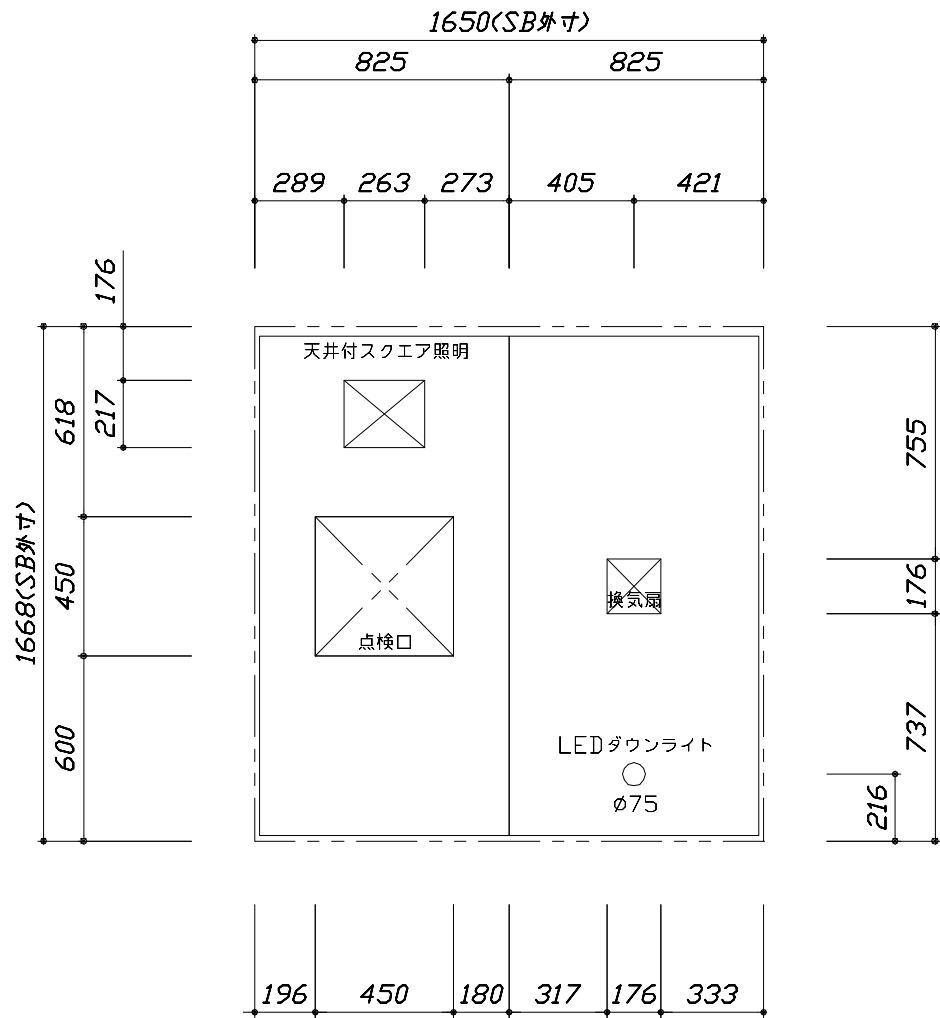

< 天井伏図 >

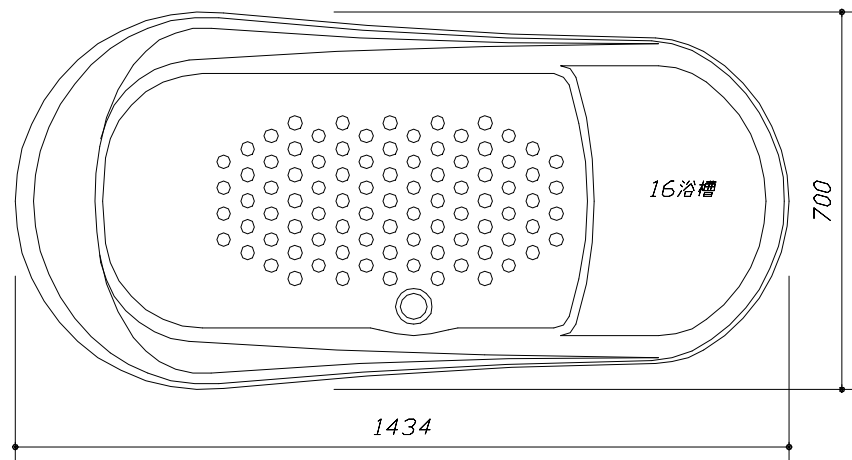



< 浴槽詳細図 >

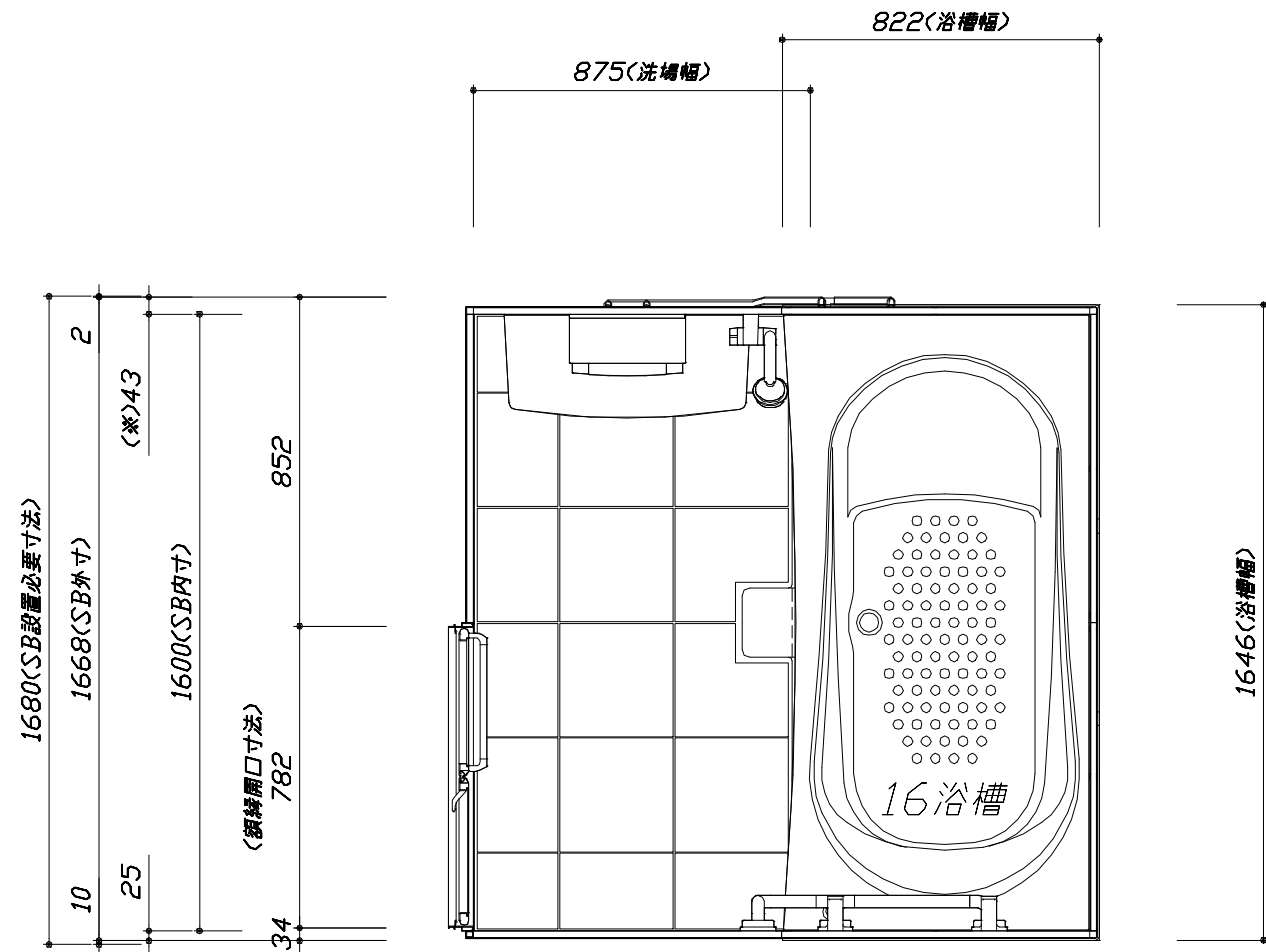

< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。


- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・【★注】：ハンドバーをドア付近に設置する場合、開き戸・折戸開閉時の干渉や風呂フタ立てかけスペースが不足するおそれがあるため、設置位置にご注意ください。
- ・天井の寸法はご確認ください。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

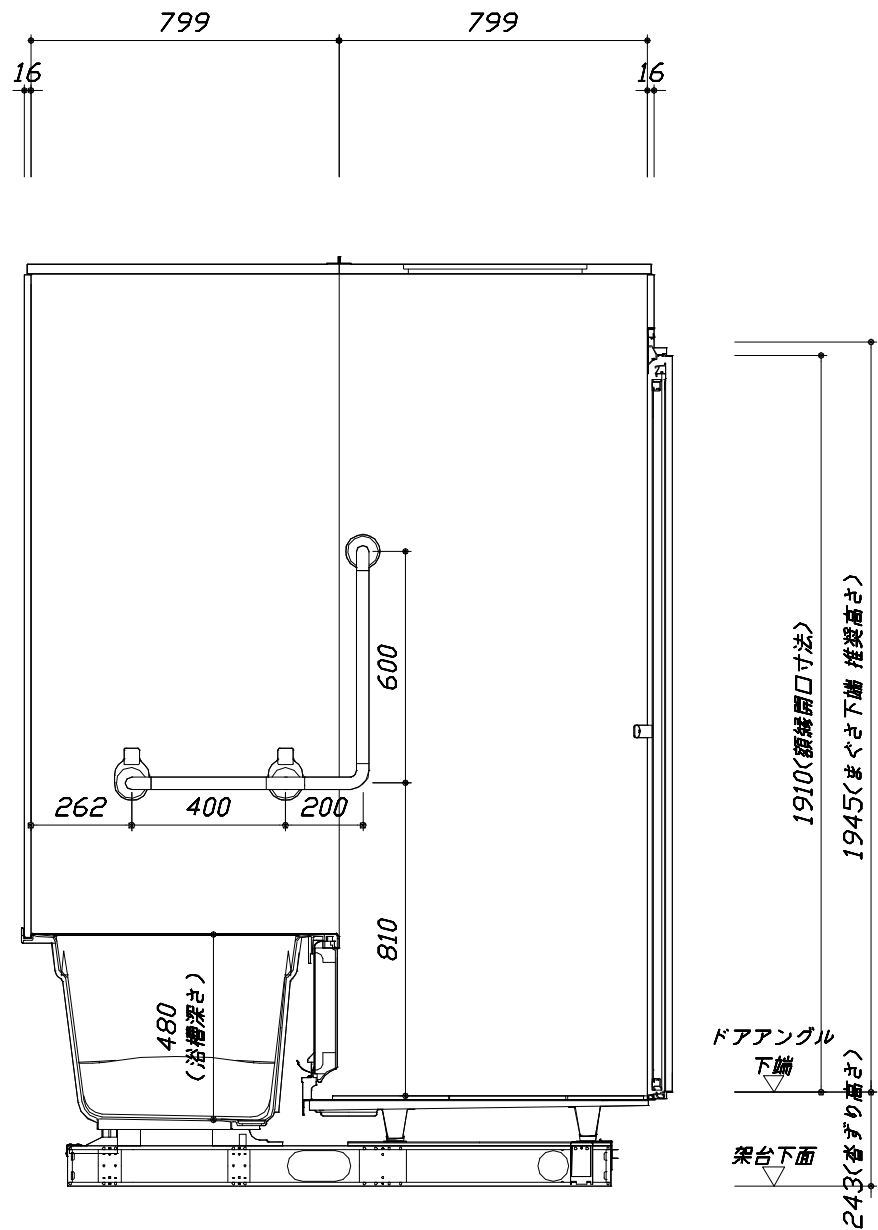

ドアアングル
下端
架台下面
243(全高)
1910(全幅)
1945(全奥行)

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>


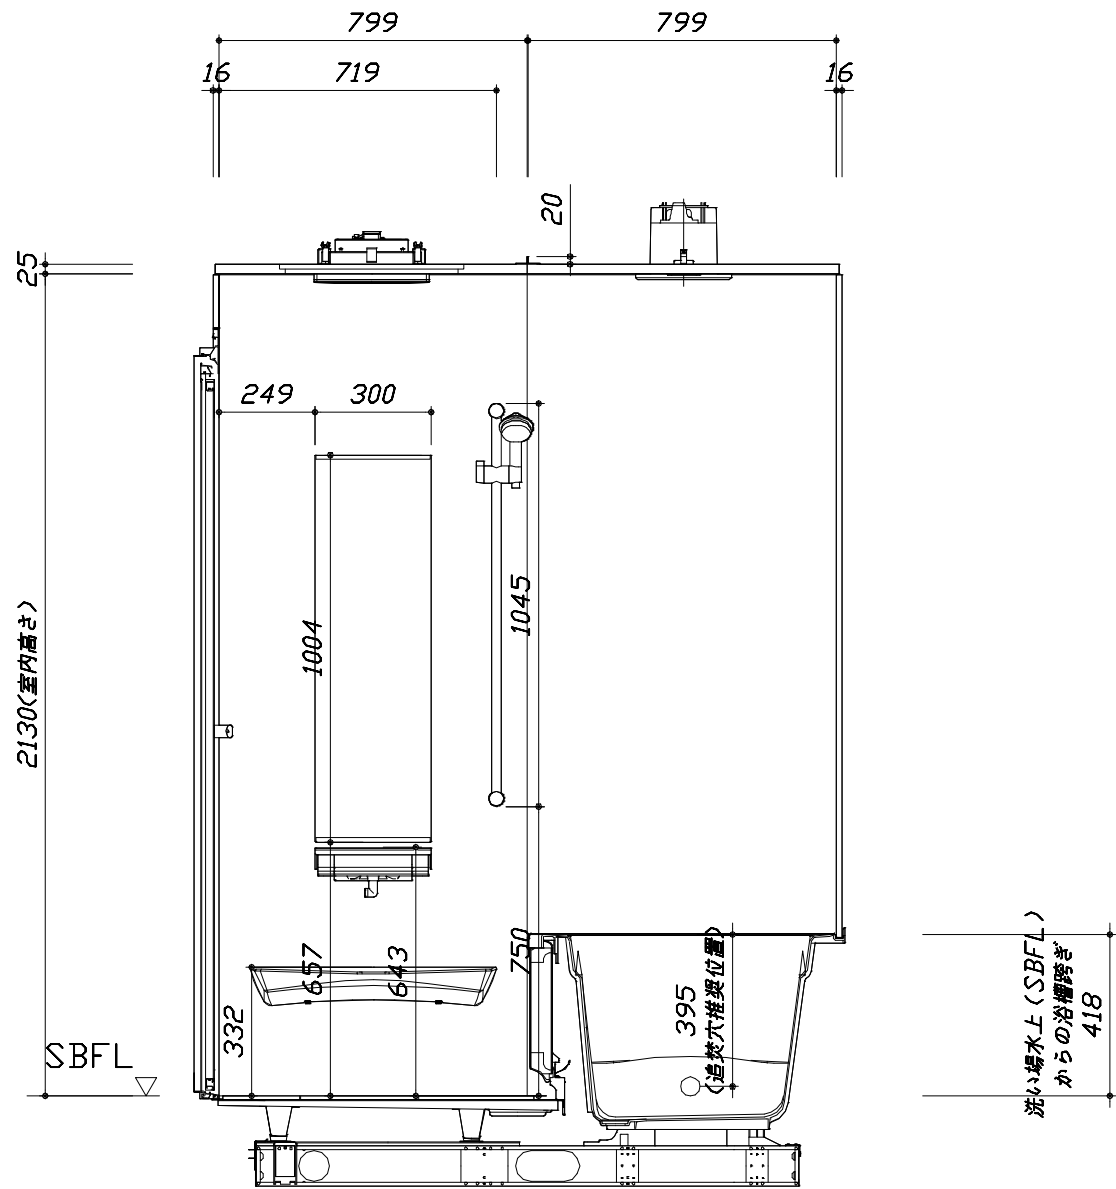


洗い場水上(SBFL)
からの浴槽深さ
418

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・【★注】：ハンドバーをドア付近に設置する場合、開き戸・折戸開閉時の干渉や風呂フタ立てかけスペースが不足するおそれがあるため、設置位置にご注意ください。
- ・天井の寸法はご確認ください。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

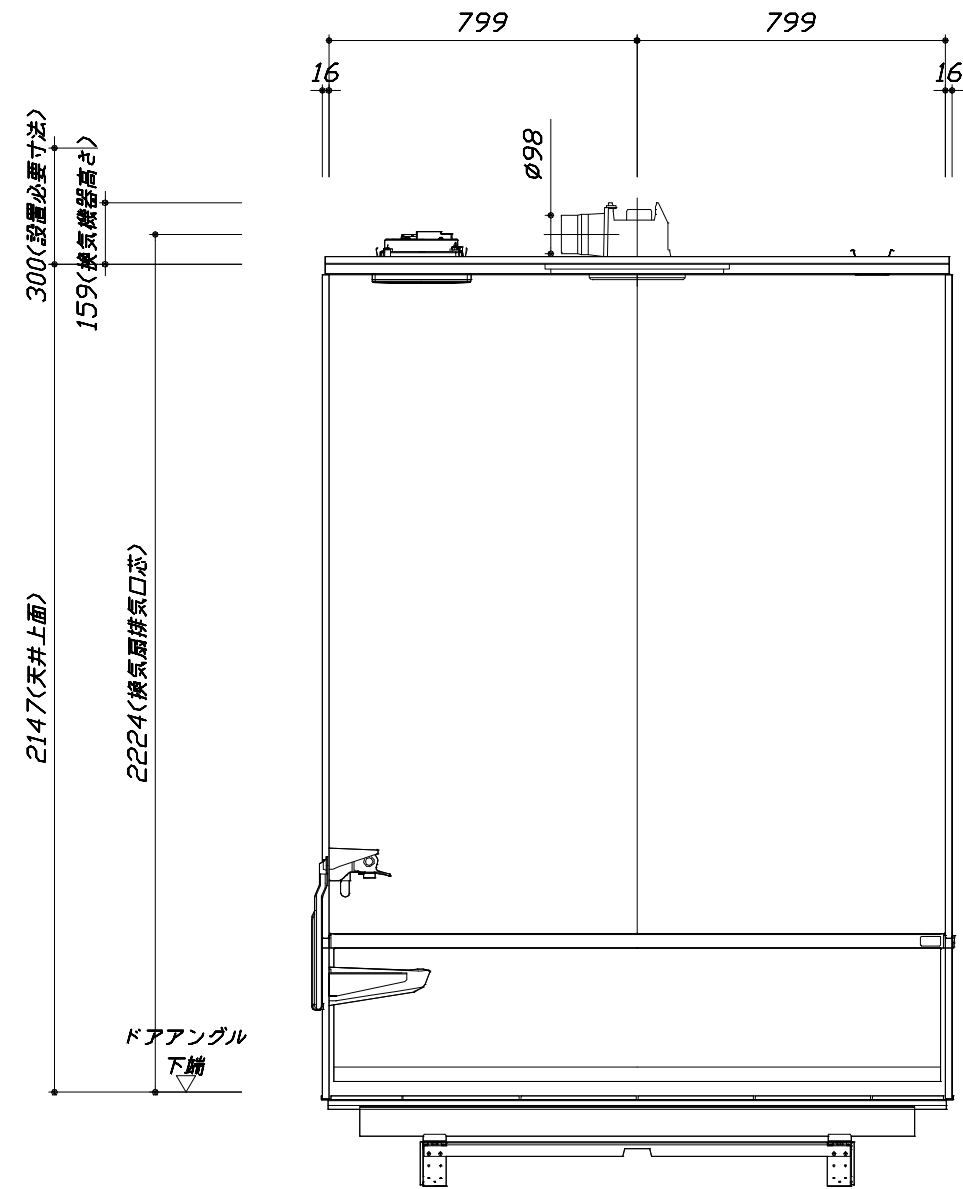

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< 浴槽側面図 >

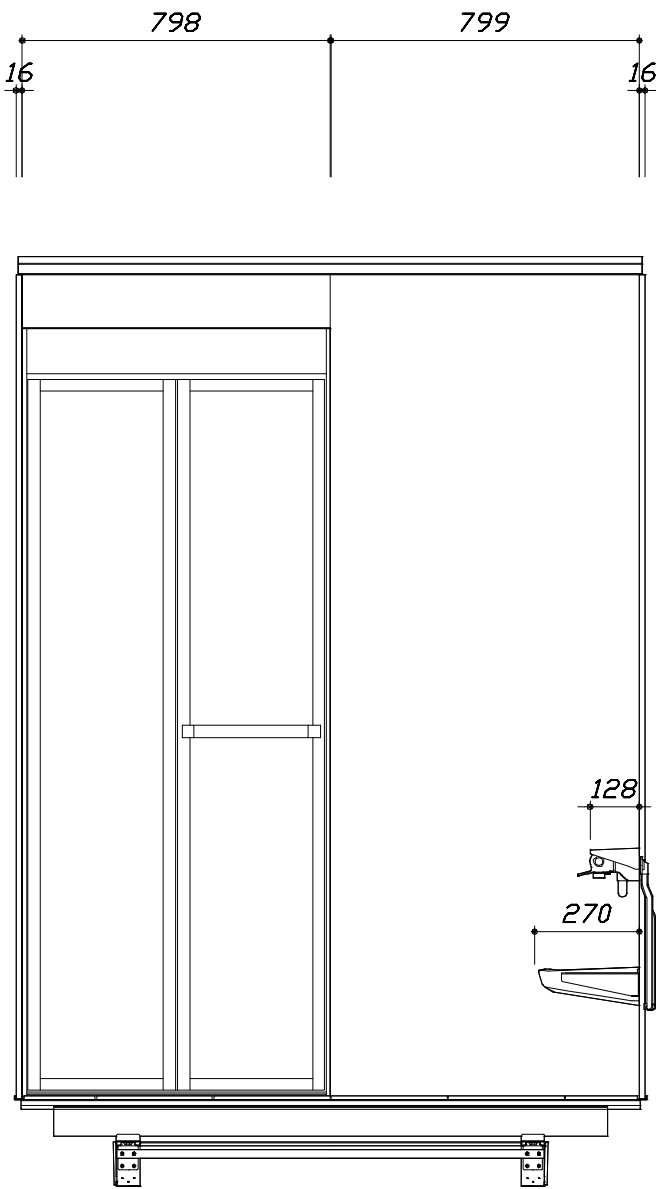

< 洗場側面図 >

Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 北海道ー中央SR SB5様邸
現場番号： C3870211
札幌中央ショールーム

GRANSPA グランspa
プラン番号： 1200B-2405-0044T
担当営業：

施工図3
縮 尺： 1:20
作成日： 2024年8月1日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽（ベンチ付）（285リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A B S 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングミラー
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK KF9032SJN1)（樹脂ホース：シルバー）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（スライドバー-TN-1020）
照明	天井付スクエア照明＋LEDダウンライト（LED 15.1W電球色）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)（ダクト径φ98）ホワイト
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	－
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	樹脂製 L型(フロフタフック付) ベージュ
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	D：ベージュ
カウンター	D：ベージュ
パネル(カウンター面)	BI：ブリックダーク
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	D：ベージュ
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	HD：カームベージュ
ドア / 天井	W：ホワイト / W：ホワイト
収納棚	－
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
浴室用電源配線、接続工事							○		浴室機器の事後電気工事		
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。




■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

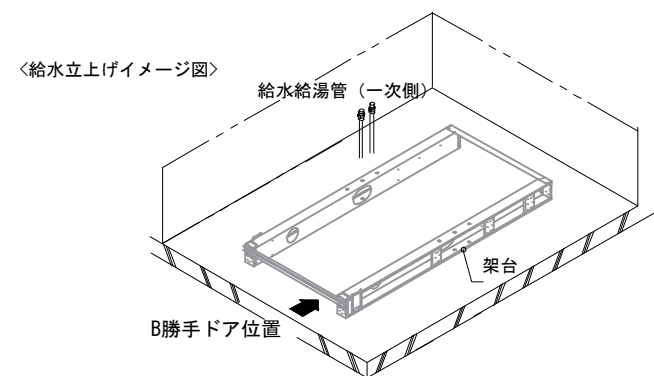



■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。

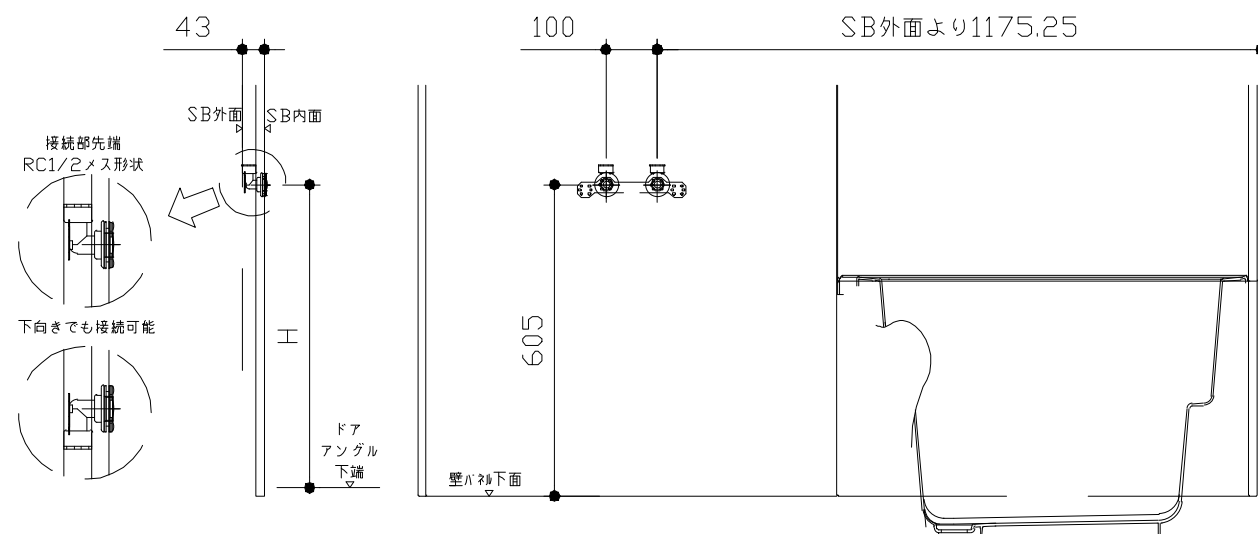


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	589
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	580

＜給水給湯管取合詳細図＞

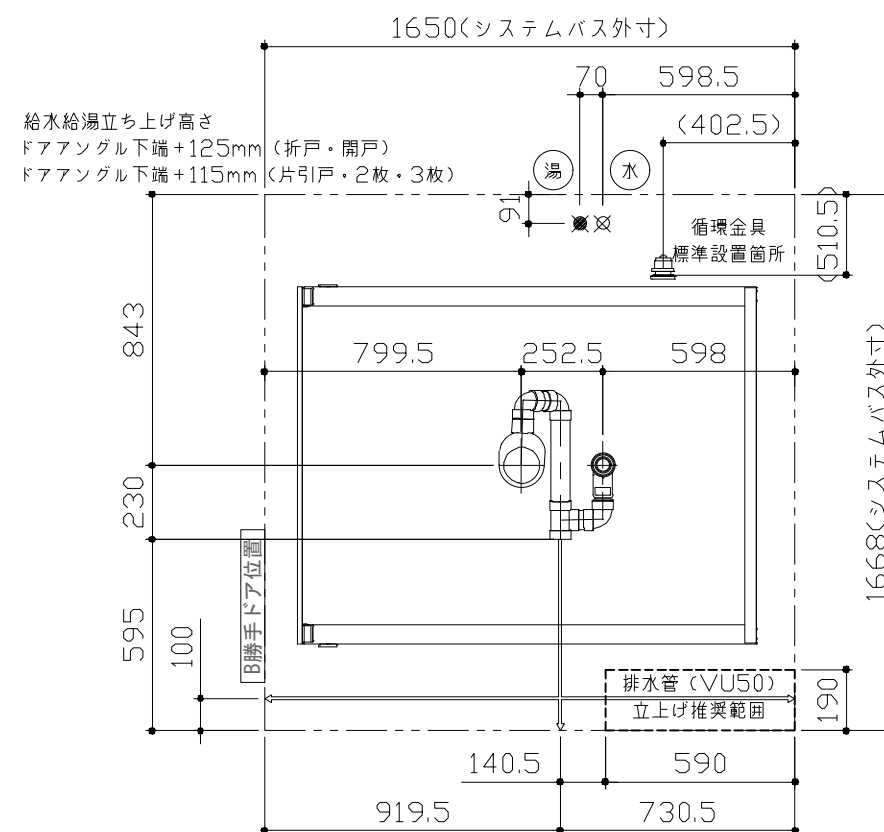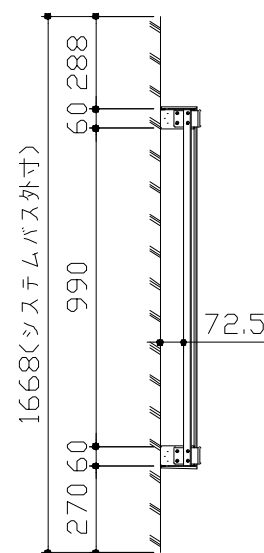


■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

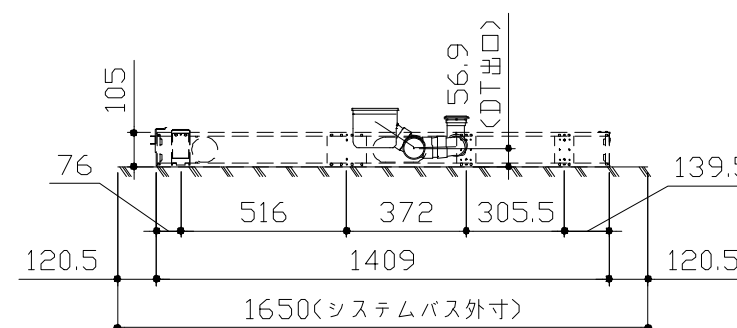


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

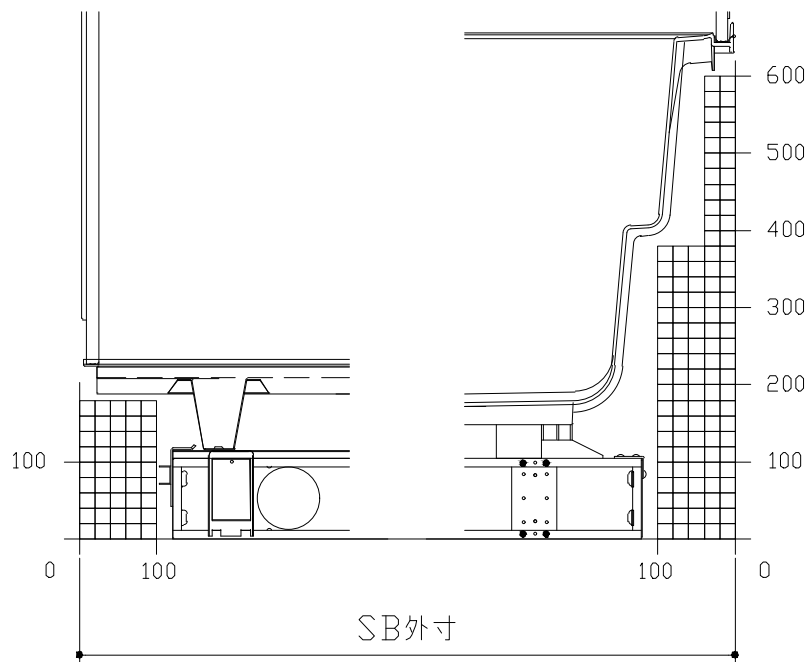


B矢視

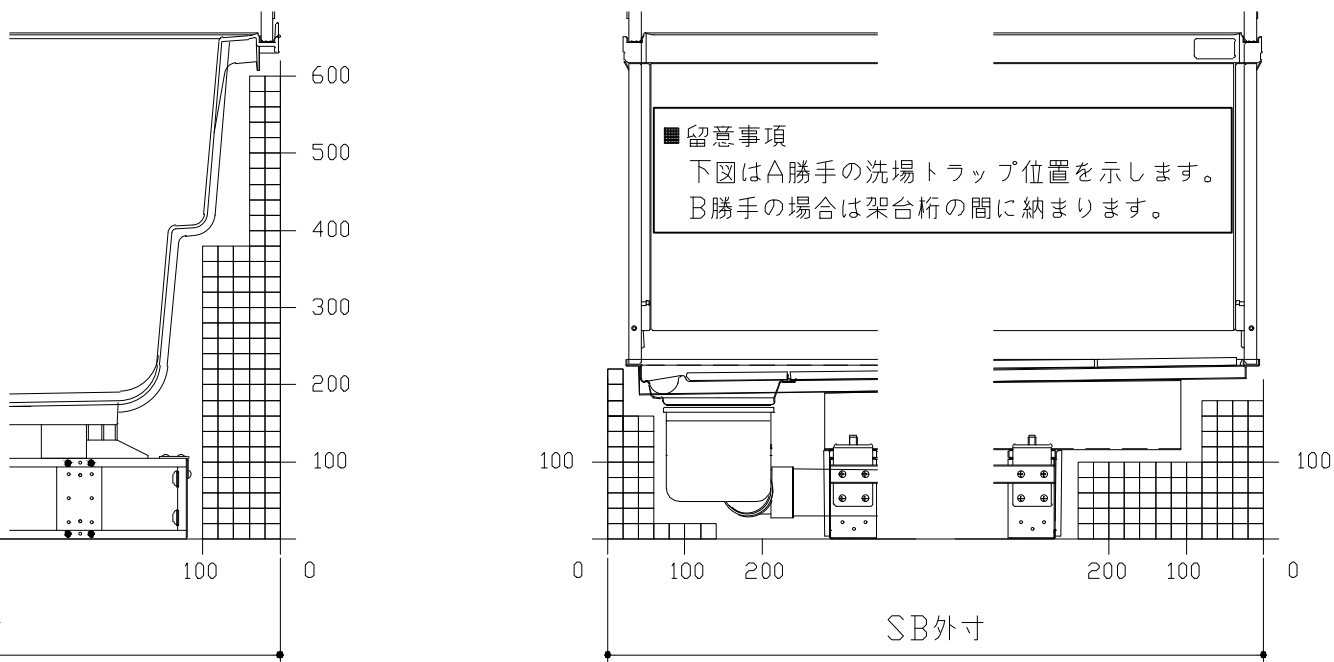


A矢視

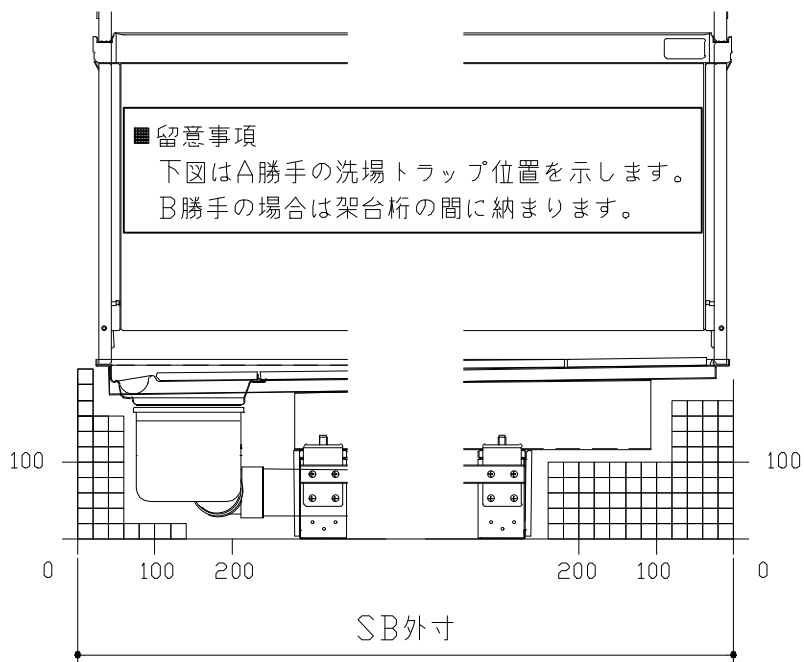


D矢視

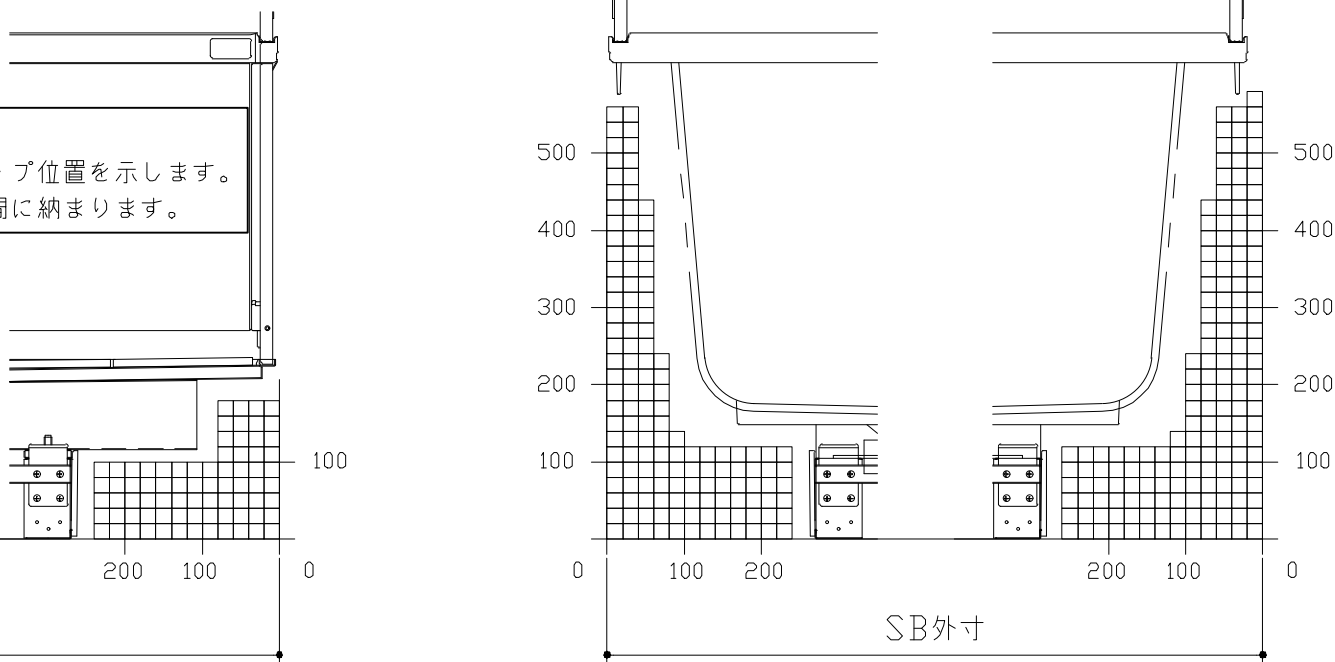

C矢視



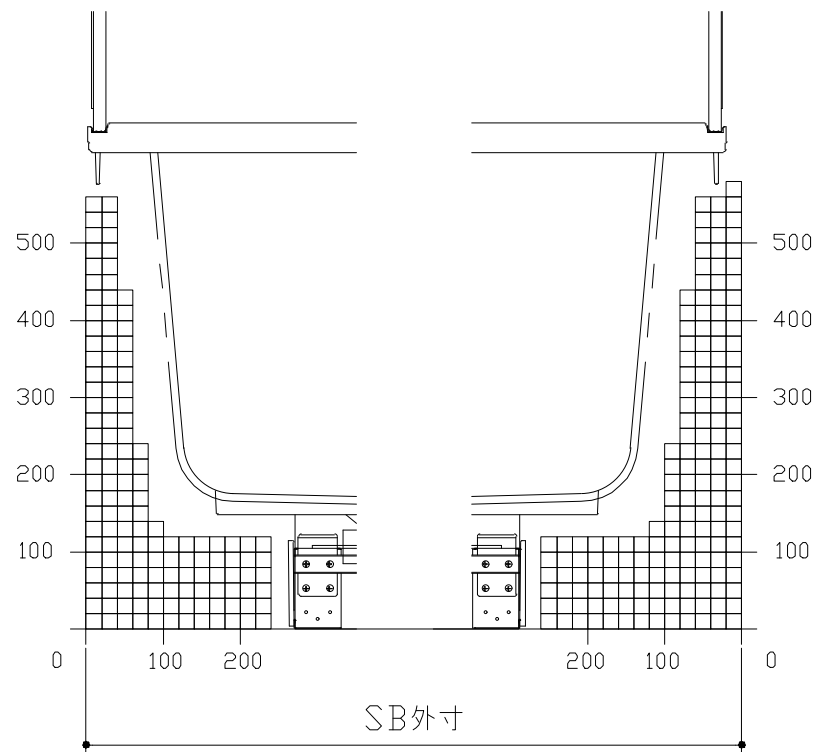



F矢視

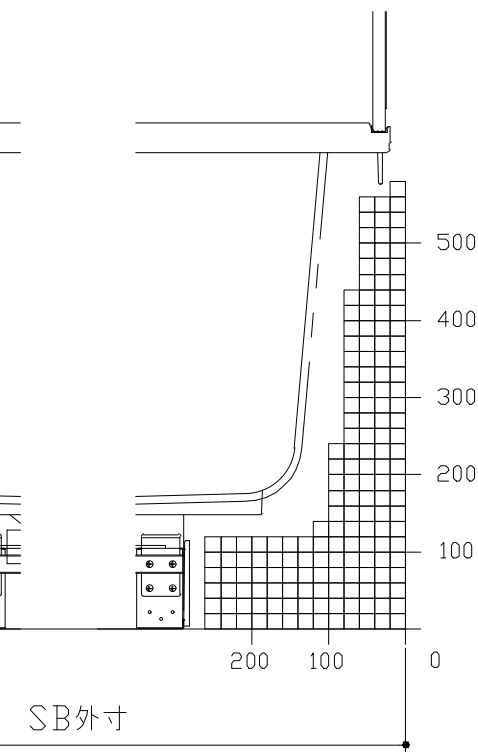

E矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

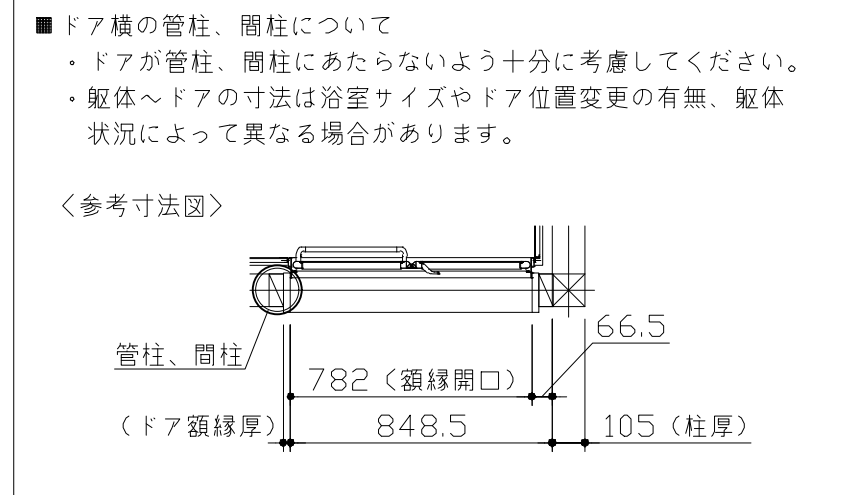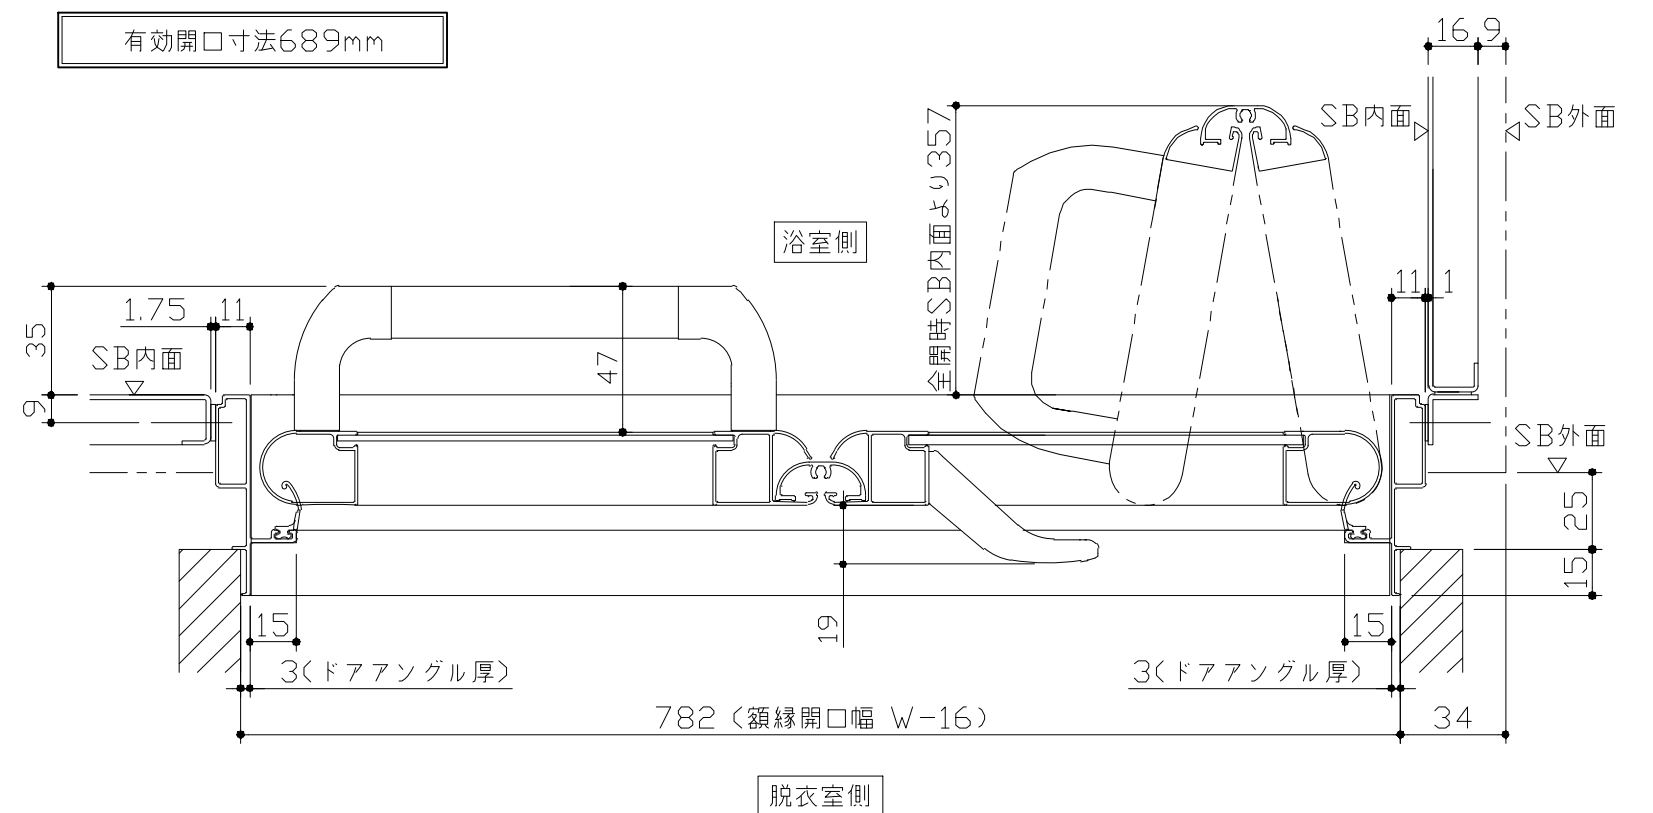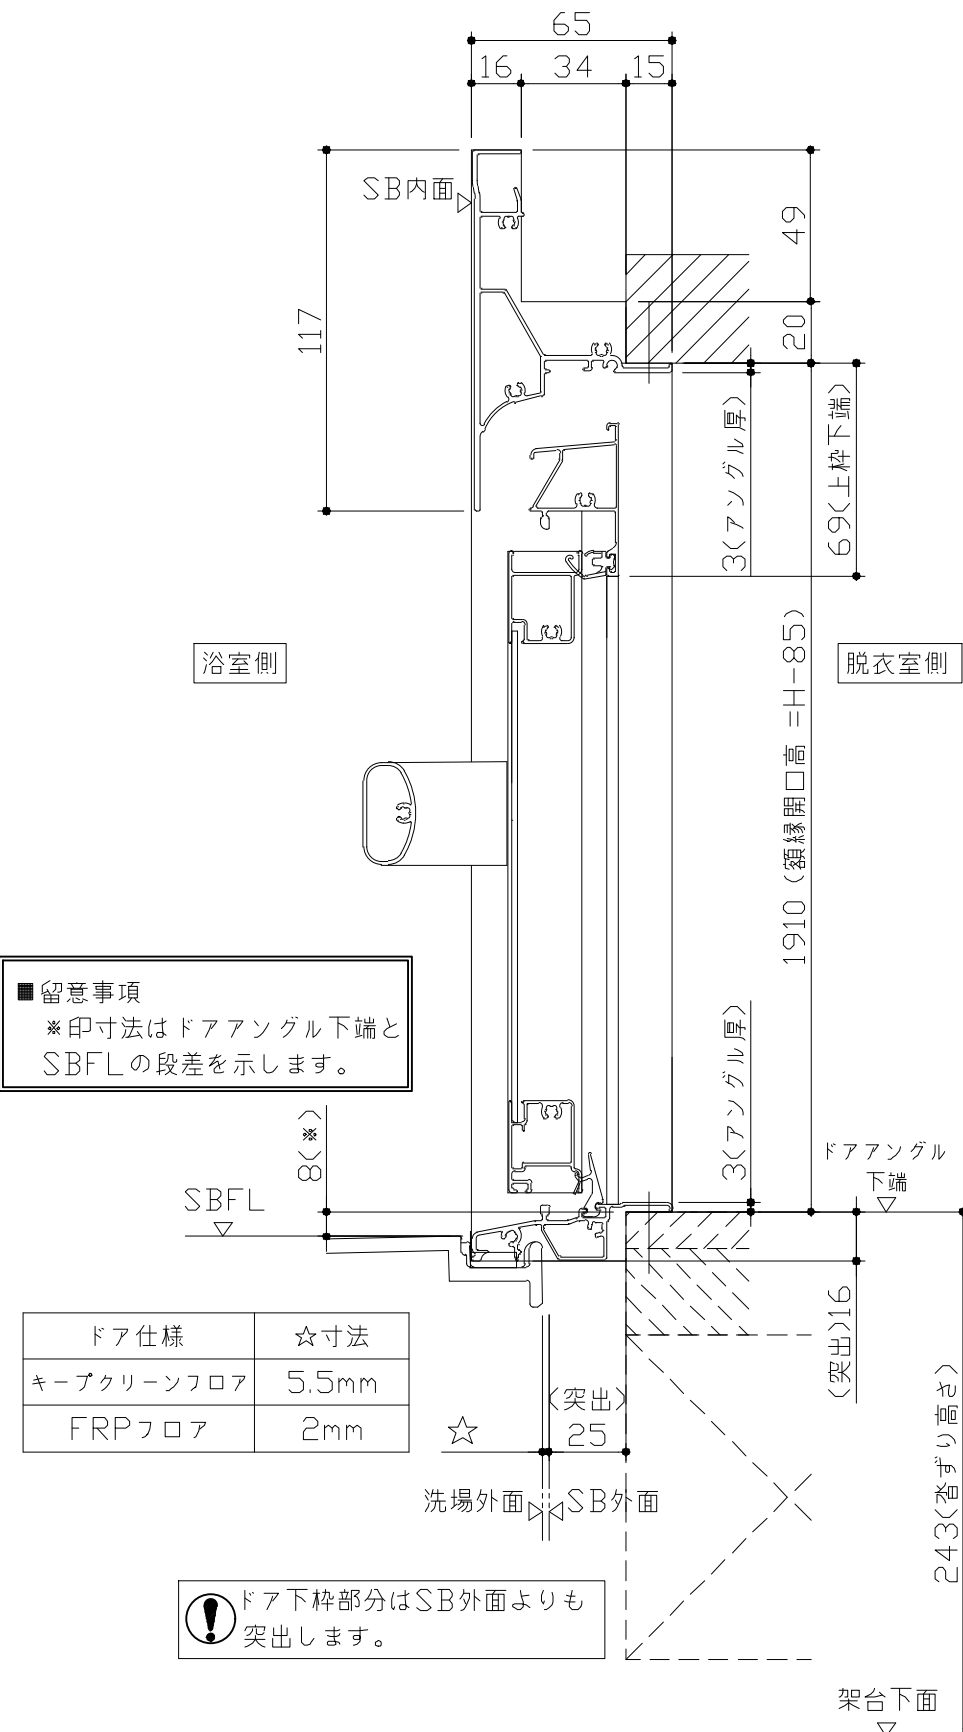


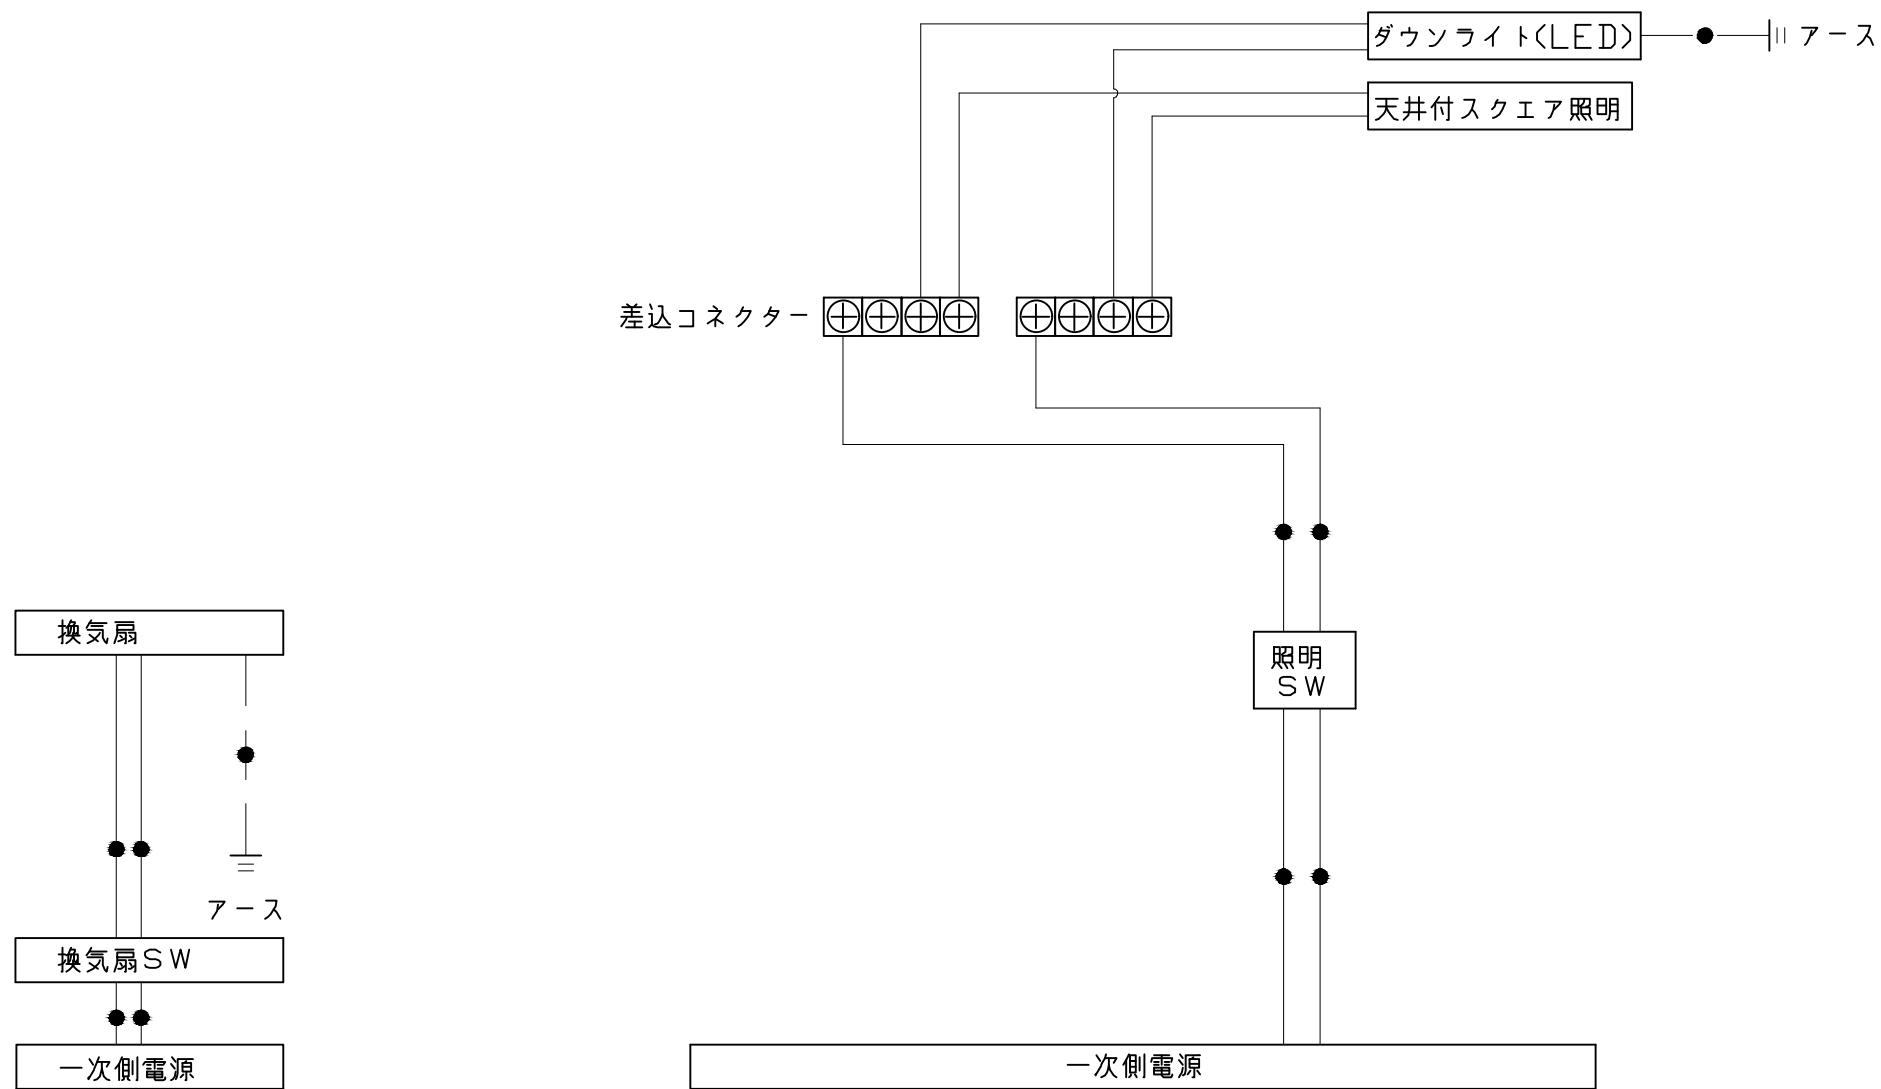

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。


アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

吊り金具寸法図

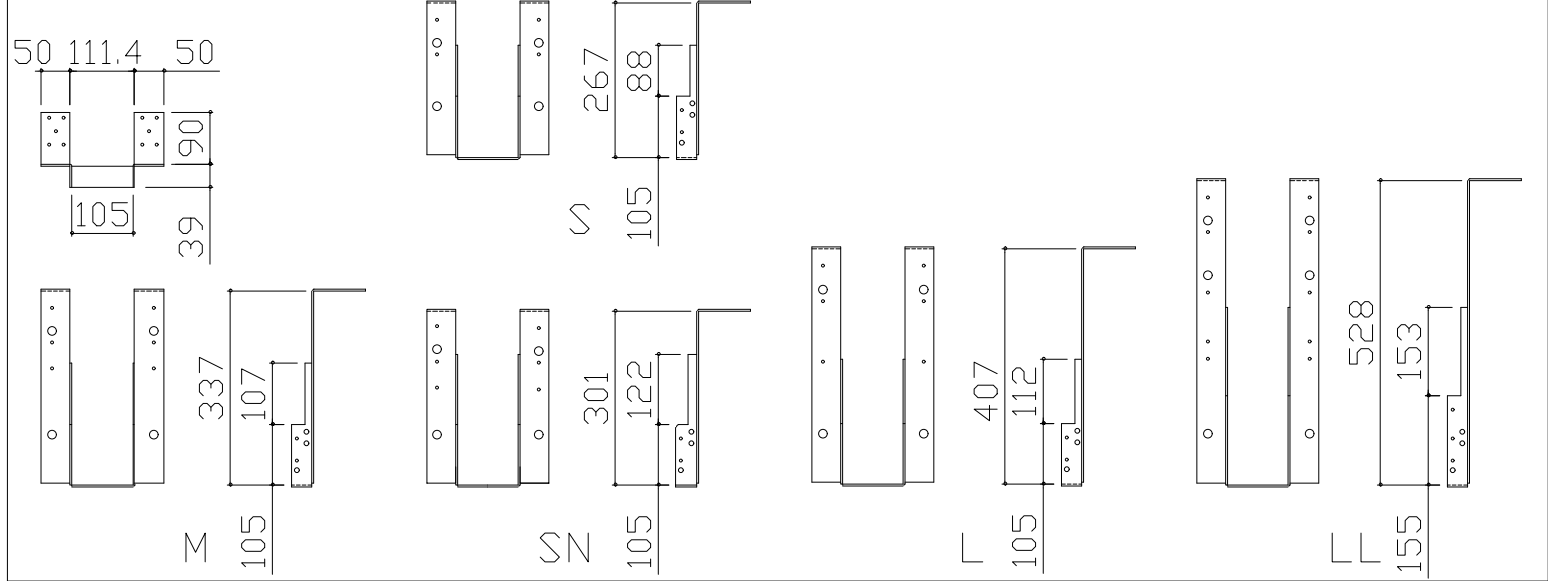


■吊金具設置条件について

- 吊金具を設置する梁（土台）には600～900kgの重量がかかります。
十分な強度を確保した梁（土台）を設置してください。
- 吊金具を設置する梁（土台）の高さ寸法（h）に以下の制約条件があるのご注意ください。

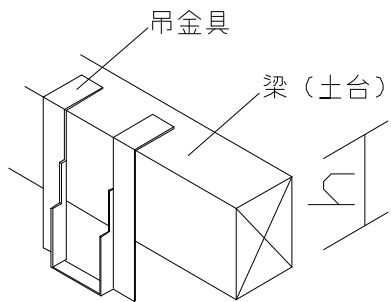


金具セット	h寸法
S	105以上
SN	105以上
M	150以上
L	210以上
LL	240以上

ウケバリ接続金具寸法図



ウケバリ断面図



■設置必要材料（現地調達）

【受け梁材が木材の場合】


- 受け梁材（105角 材質：ベイツガ、ベイマツ1級相当品）
- 防錆釘（N-75 80本以上、N-32 20本程度）

【受け梁材が鉄パイプの場合】





- 皿タッピンネジ（クロメート、M4×25 20本程度）

【共通】

- コンパネ（厚み：12mm以上）
- （コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル）








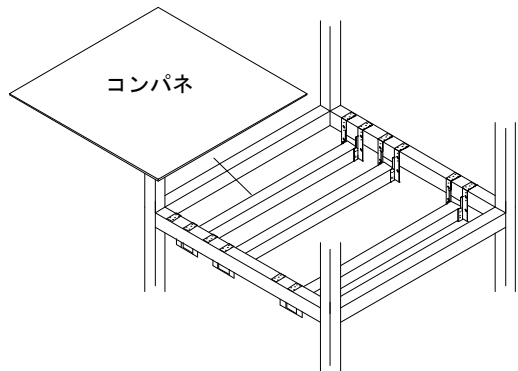





階上に設置する場合などは安全確保（落下防止）の観点よりコンパネを設置してください。

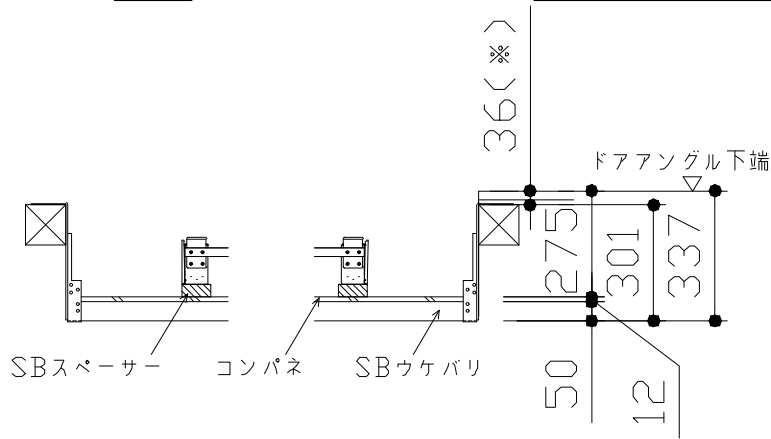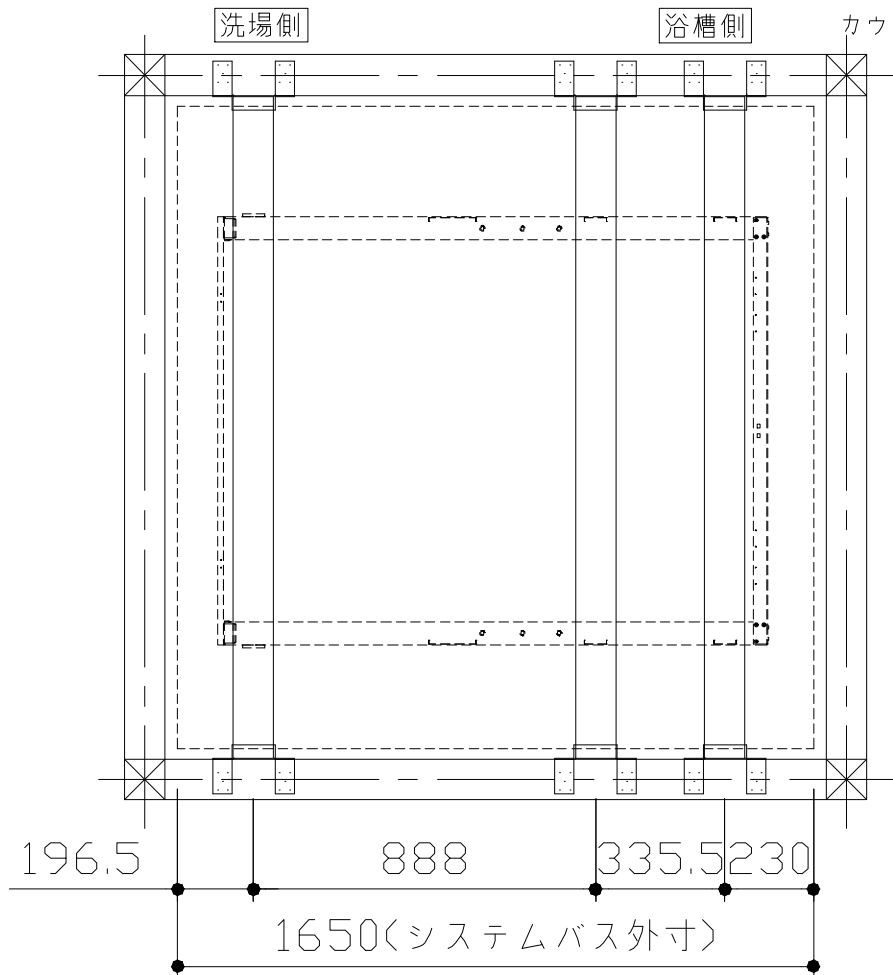

- 吊金具参考納まり
- ・床仕上がり36mm(※)
 - ・ツリカゲSN使用
 - ・SBウケバリ使用

浴槽		洗い場用水栓		照明	
* 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと		パネル下面		天井付スクエア照明 LED 11W (1灯あたり) ダウンライト LED 4.1W (1灯あたり)	
換気機器		カウンター		シャワーフックスライドバー	
管工事		本体: ABS		シャワーフック本体部分詳細	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 北海道ー中央SR SB5様邸 現場番号： C3870211 札幌中央ショールーム		GRANSPA グランspa プラン番号： 1200B-2405-0044T 担当営業：	
				部材詳細図	1/2 作成日： 2024年8月1日 担当アドバイザー：

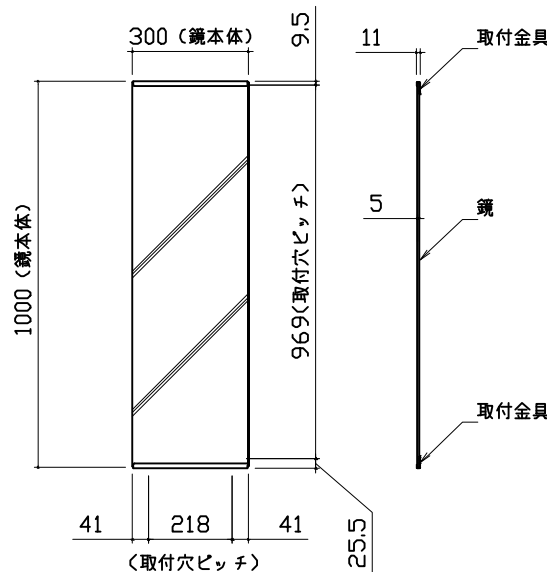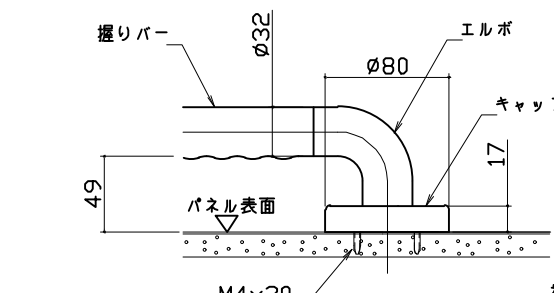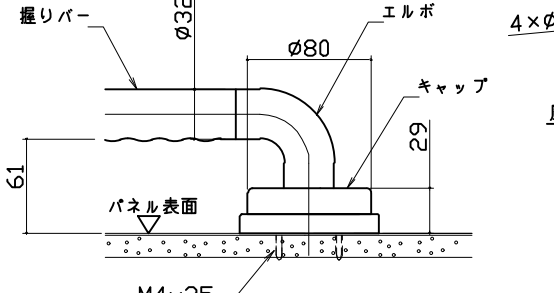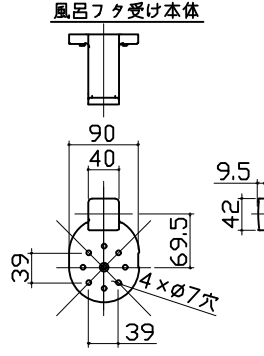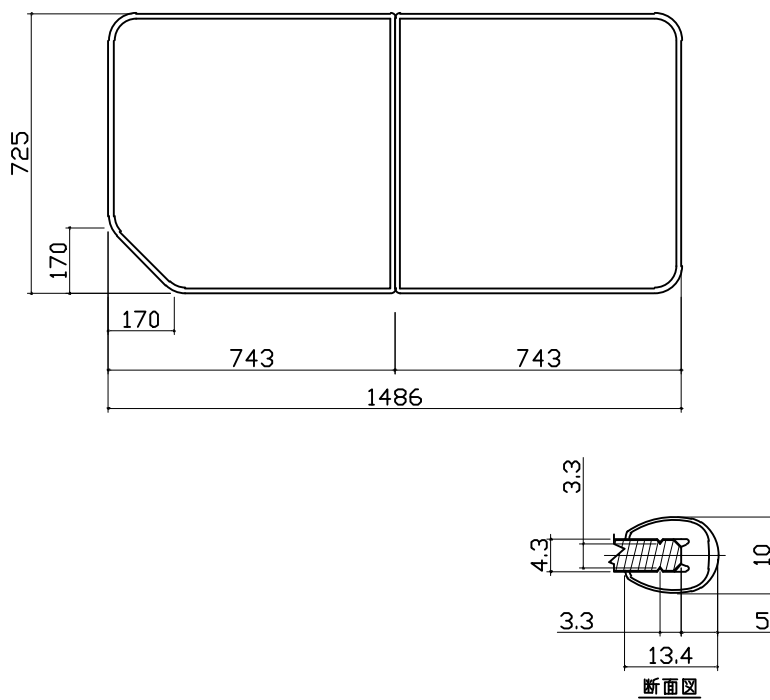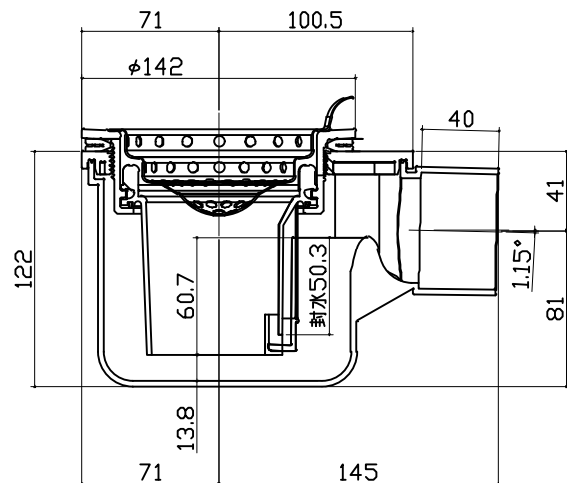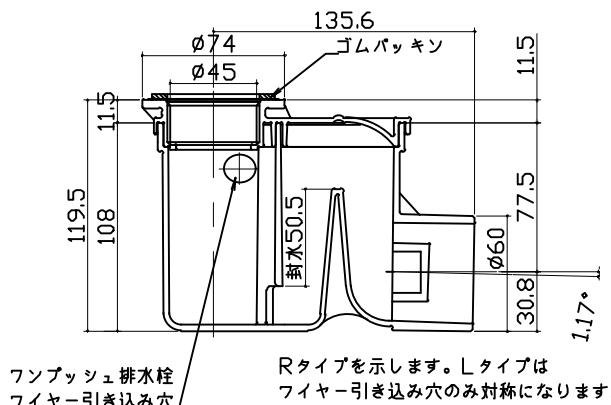ミラー 枠：SUS304 t0.8 ミラー：表面防曇コートあり（ロングクリアミラー-A） 表面防曇コートなし（ロングミラー-A） 	ハンドバー 支持部取合詳細図 安心ハンドバー（風呂フタフック付）以外の場合  安心ハンドバー（風呂フタフック付）の場合  補助スペーサー  風呂フタ受け本体 	風呂蓋 707MZA-16RN 	
洗い場側排水トラップ 	浴槽側排水トラップ  フンプッシュ排水栓 ワイヤー引き込み穴 Rタイプを示します。Lタイプは ワイヤー引き込み穴のみ対称になります。		
Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称： 北海道-中央SR SB5様邸 現場番号： C3870211 札幌中央ショールーム	GRANSPA グランspa プラン番号： 1200B-2405-0044T 担当営業：	部材詳細図 2/2 作成日： 2024年8月1日 担当アドバイザー：

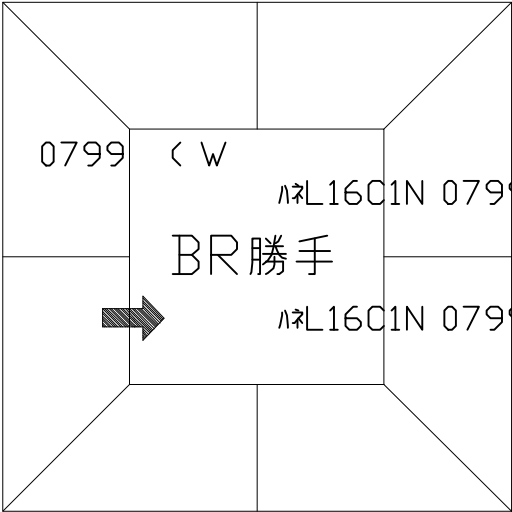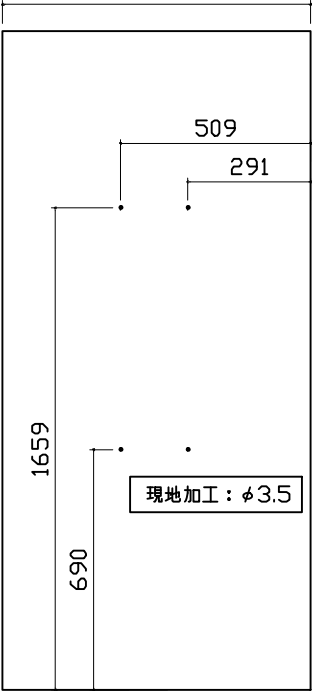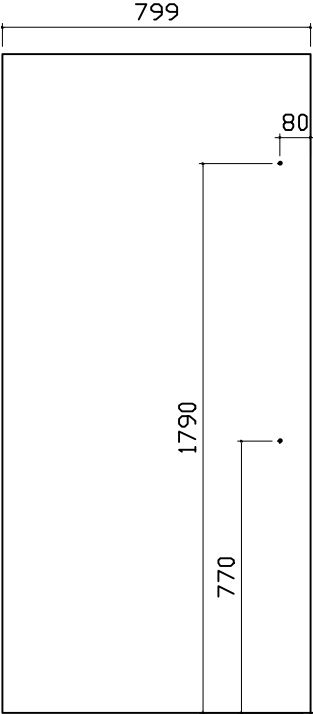パネル割図		ミラー		シャーフックスライドバー	
ハネK16C2Z 0799 L<BI ハネL16C1N 0799 <BI ハネK16A 0799 <W ハネL16C1N 0799 <W ハネL16C1N 0799 <W ハネL16C1N 0799 <W ハネK16A 0799 <W BR勝手 		ハネK16C2Z 0799 L<BI 799 509 291 1659 690 現地加工：φ3.5 		ハネK16C2Z 0799 L<BI 799 80 1790 770 現地加工：φ3.5 	
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 北海道ー中央SR SB5様邸		GRANSPA グランスパ	
		現場番号： C3870211		プラン番号： 1200B-2405-0044T	
		札幌中央ショールーム		担当営業：	
				担当アドバイザー：	
				穴開け指示図	1/1
				作成日： 2024年8月1日	
