

システムバス 御見積書

御名前 群馬-高崎SR SB2 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

作成日 2025年5月8日
プラン番号 7401A-2505-0196T
現場番号 C2786063

タカラスタンダード株式会社
◆高崎営業所
群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
TEL 027-395-8001 / FAX 027-370-0007

◆高崎ショールーム
TEL 027-395-8000 / FAX 027-363-1000

商品
御見積金額 ￥687,400 (税込 ￥756,140)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥103,000 (税込 ￥113,300)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームグレー
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ライトグレー
浴槽形状	スクエア浴槽
カウンター材質	樹脂
カウンター/下カバーカラー	ホワイト / -
浴槽前カウンターカラー	-
エプロン材質/カラー	樹脂 / ライトグレー
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	スタッコグレー
パネルカラー(周辺)	スタッコグレー
ガス種 / 周波数	LPG / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
②		河合

◆ 備考

御名前 群馬-高崎SR SB2

様

現場番号

C2786063

プラン番号

7401A-2505-0196T

作成日

2025/5/8

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイト)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームグレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	FRP(高断熱浴槽)(ライトグレー)	1	-85,000	-85,000
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	FRP浴槽用保温材なし(ライトグレー)	1		
11	浴槽形状	FRPスクエア浴槽	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	浴槽パン	なし	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)SB1811 水栓上部カウンター(ホワイト)	1	-5,700	-5,700
15	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:SB1811	1		
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	ワイドカウンター	1	-38,000	-38,000
18	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
19	浴室パネル	ハイクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+40,000	+40,000
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	フラット天井	1	-15,000	-15,000
22	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	マグネットショートミラー	1	-3,000	-3,000
27	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+3,000	+3,000
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
29	ハンドバー	ステン I型400タイプ	1	+7,500	+7,500
30	収納棚	スクエアタイプ(2段)<ホワイト>	1	+1,200	+1,200
31	どこでもラック	タオルハンガーL(ホワイト)	1	+2,800	+2,800

御名前 群馬-高崎SR SB2 様

現場番号	C2786063	プラン番号	7401A-2505-0196T	作成日	2025/5/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	どこでもラック	風呂フタフック(ホワイト)	1	+2,100	+2,100
33	循環金具セット	ELX	1	+11,500	+11,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
35	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			35		¥687,400

商品総合計	35	¥687,400
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥103,000 (税込 ¥113,300)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

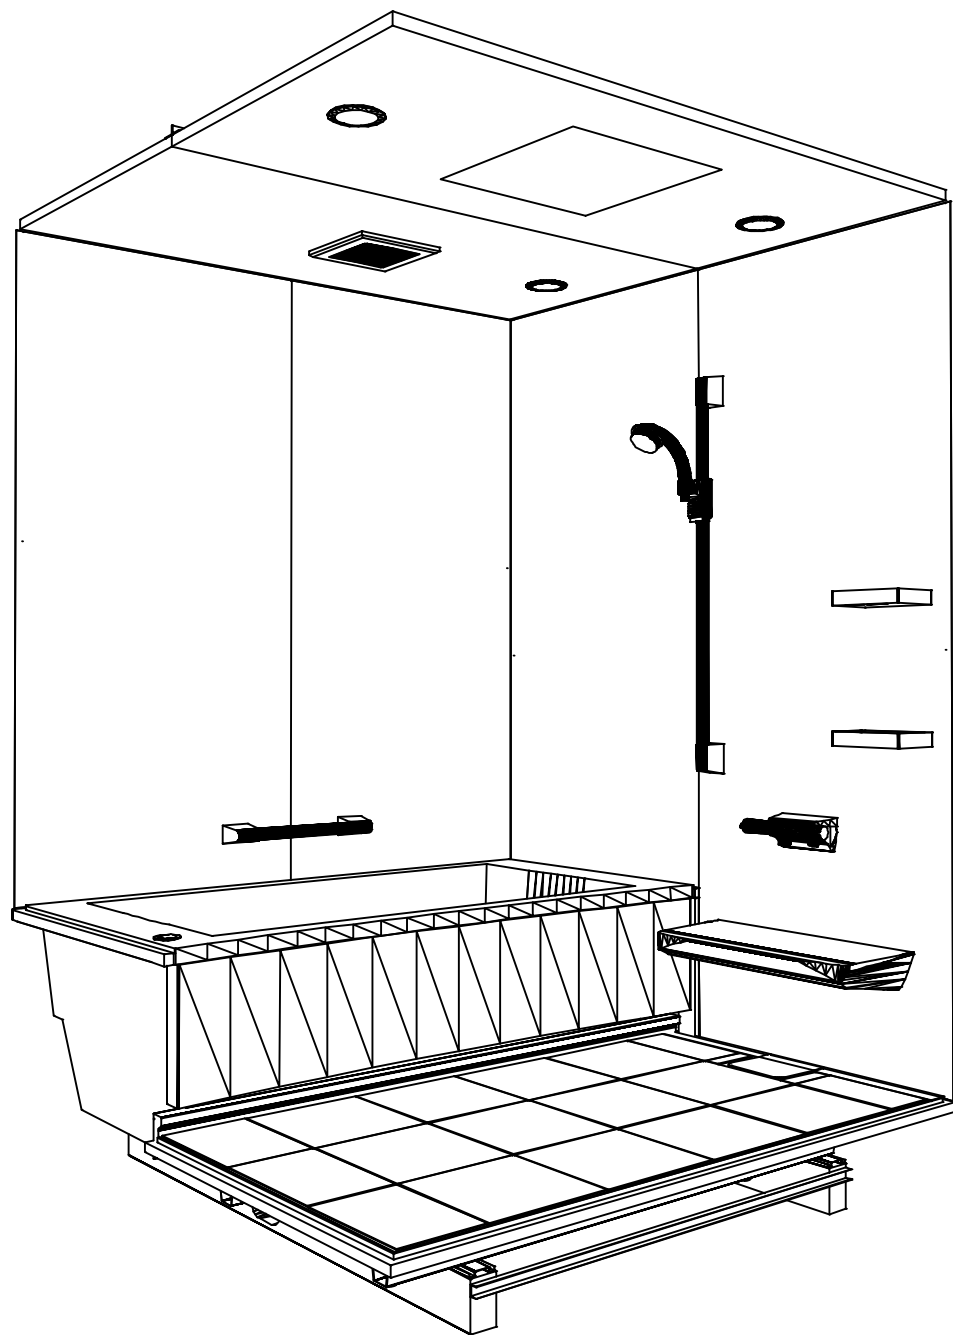

鳥瞰図

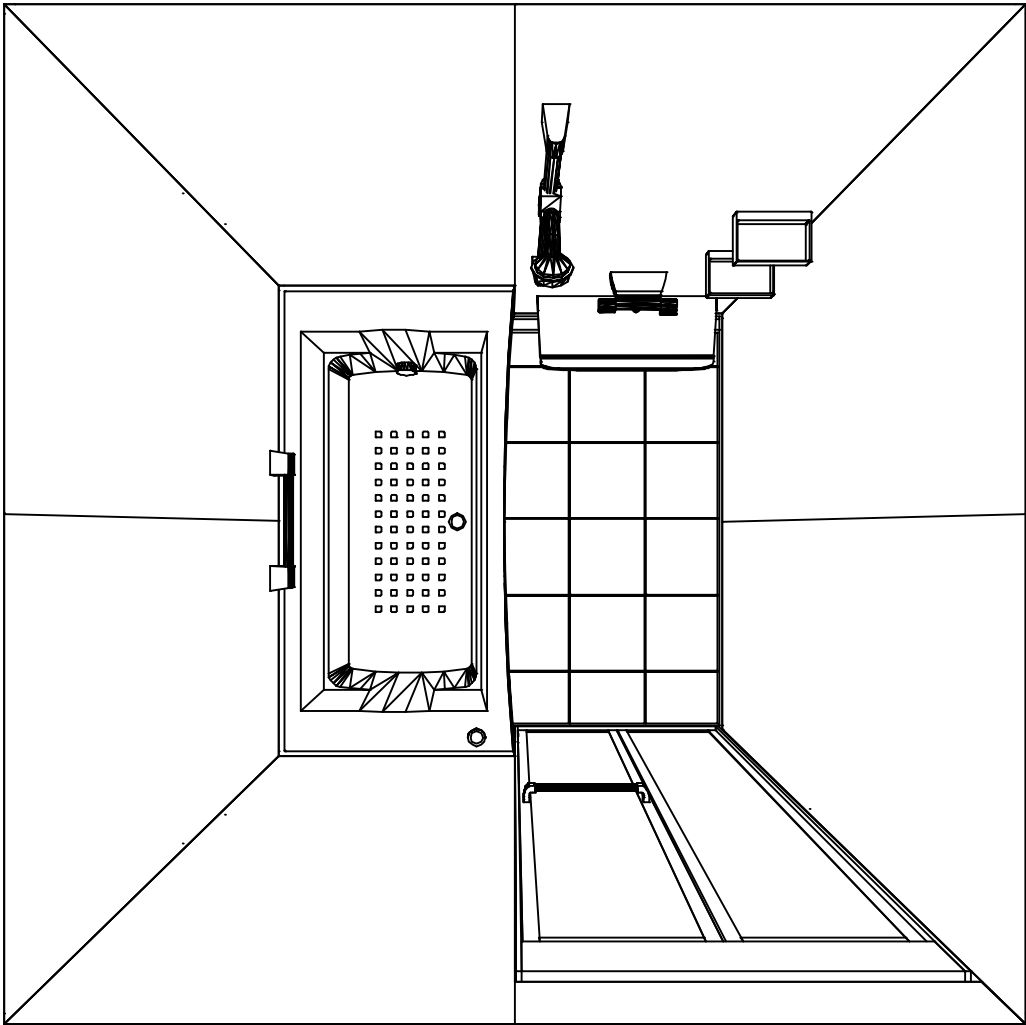

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 群馬-高崎SR SB2様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C2786063	プラン番号： 7401A-2505-0196T	作成日： 2025年5月8日	
高崎営業所	担当営業： ②	担当アドバイザー：	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 注意事項



* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

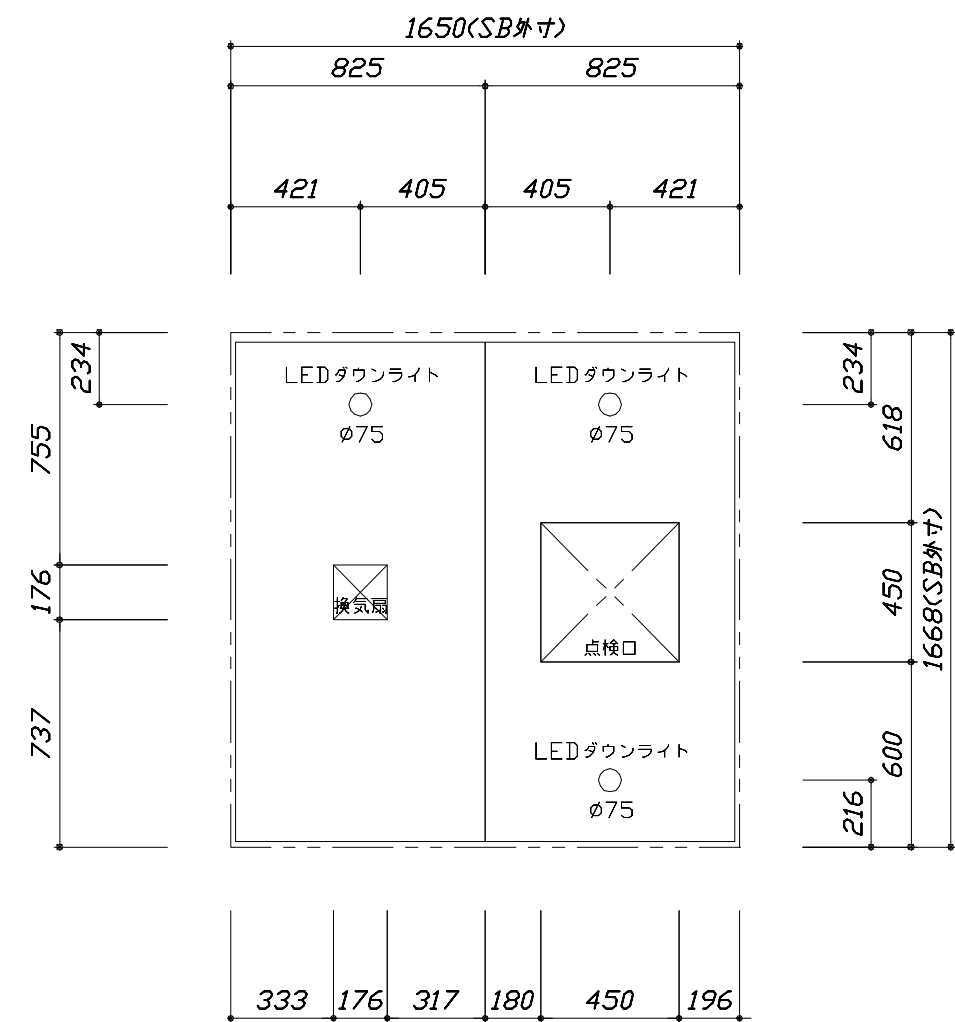

<天井伏図>

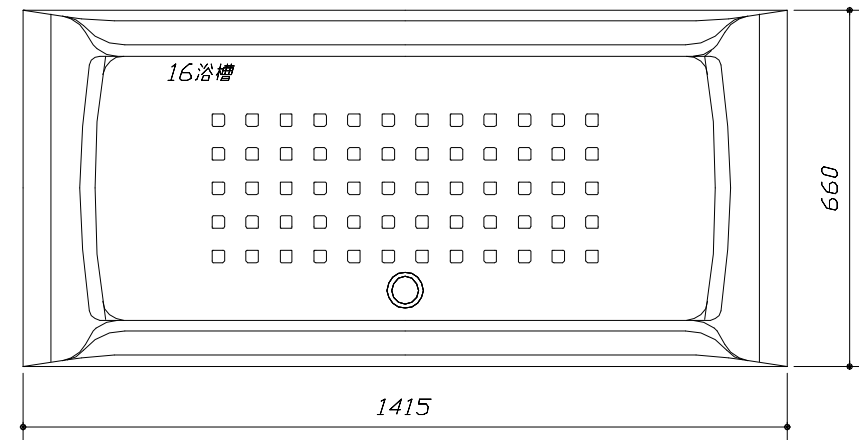



<浴槽詳細図>

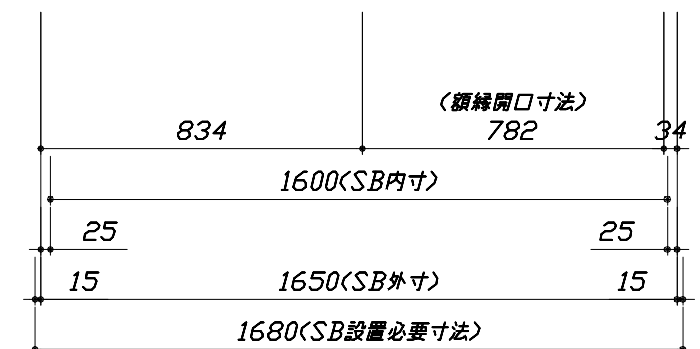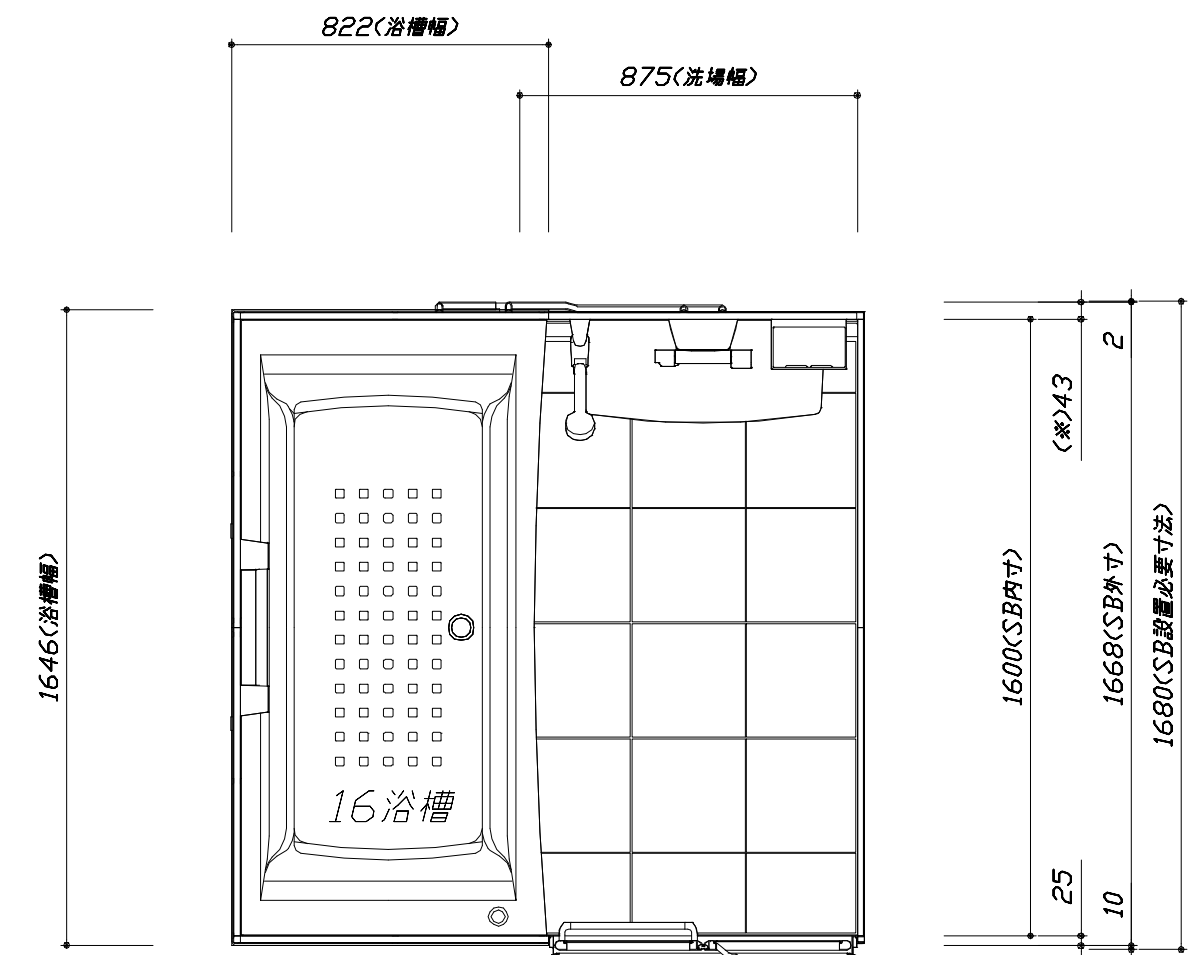

<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

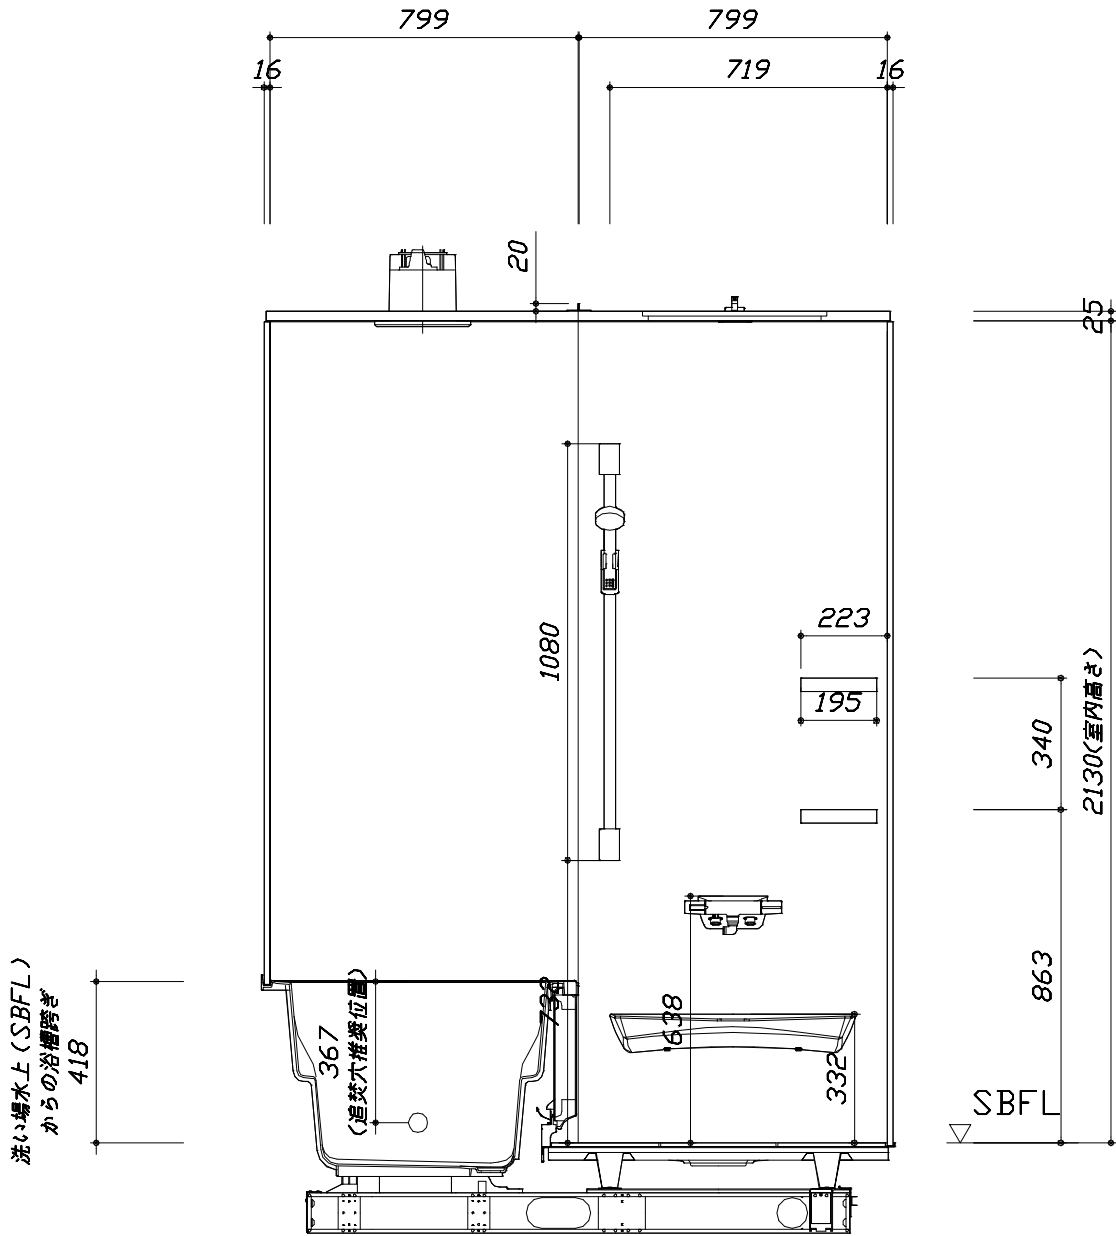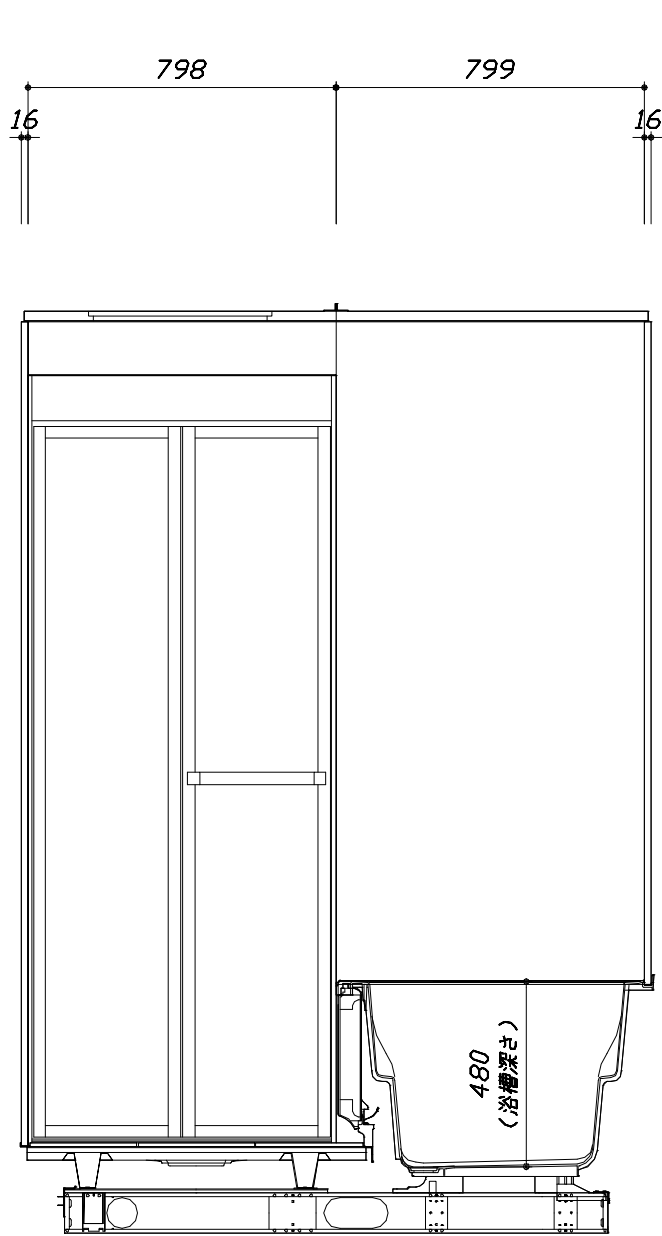



■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

< カウンター対面図 >

< カウンター面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドファングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・奥行・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

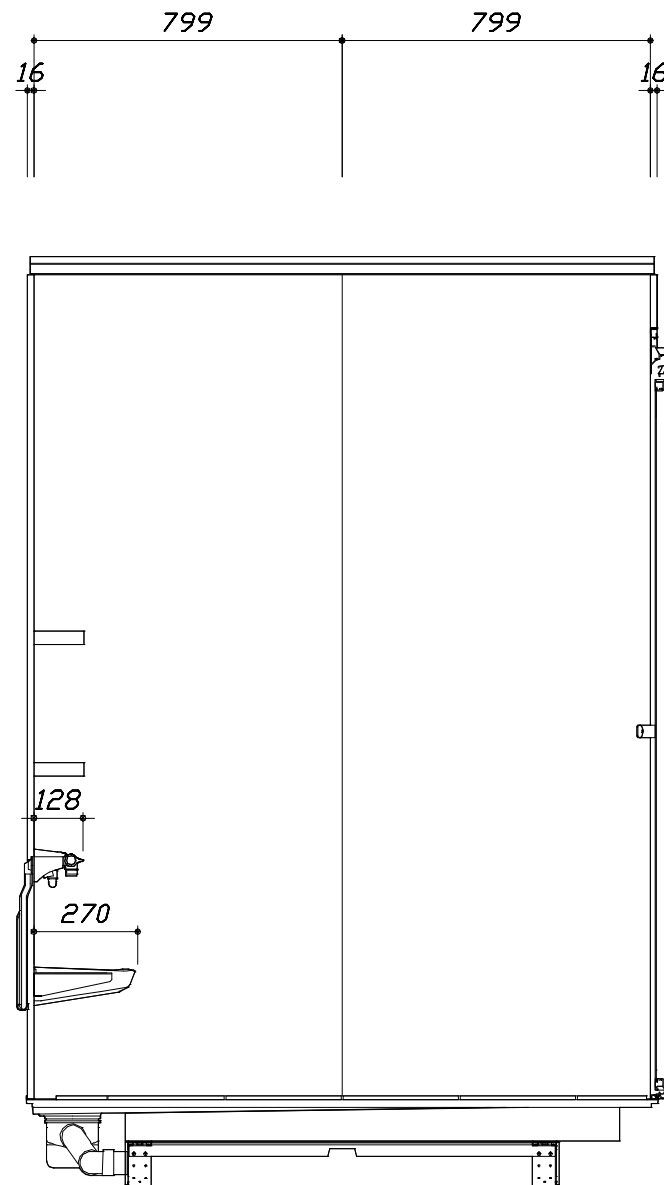

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

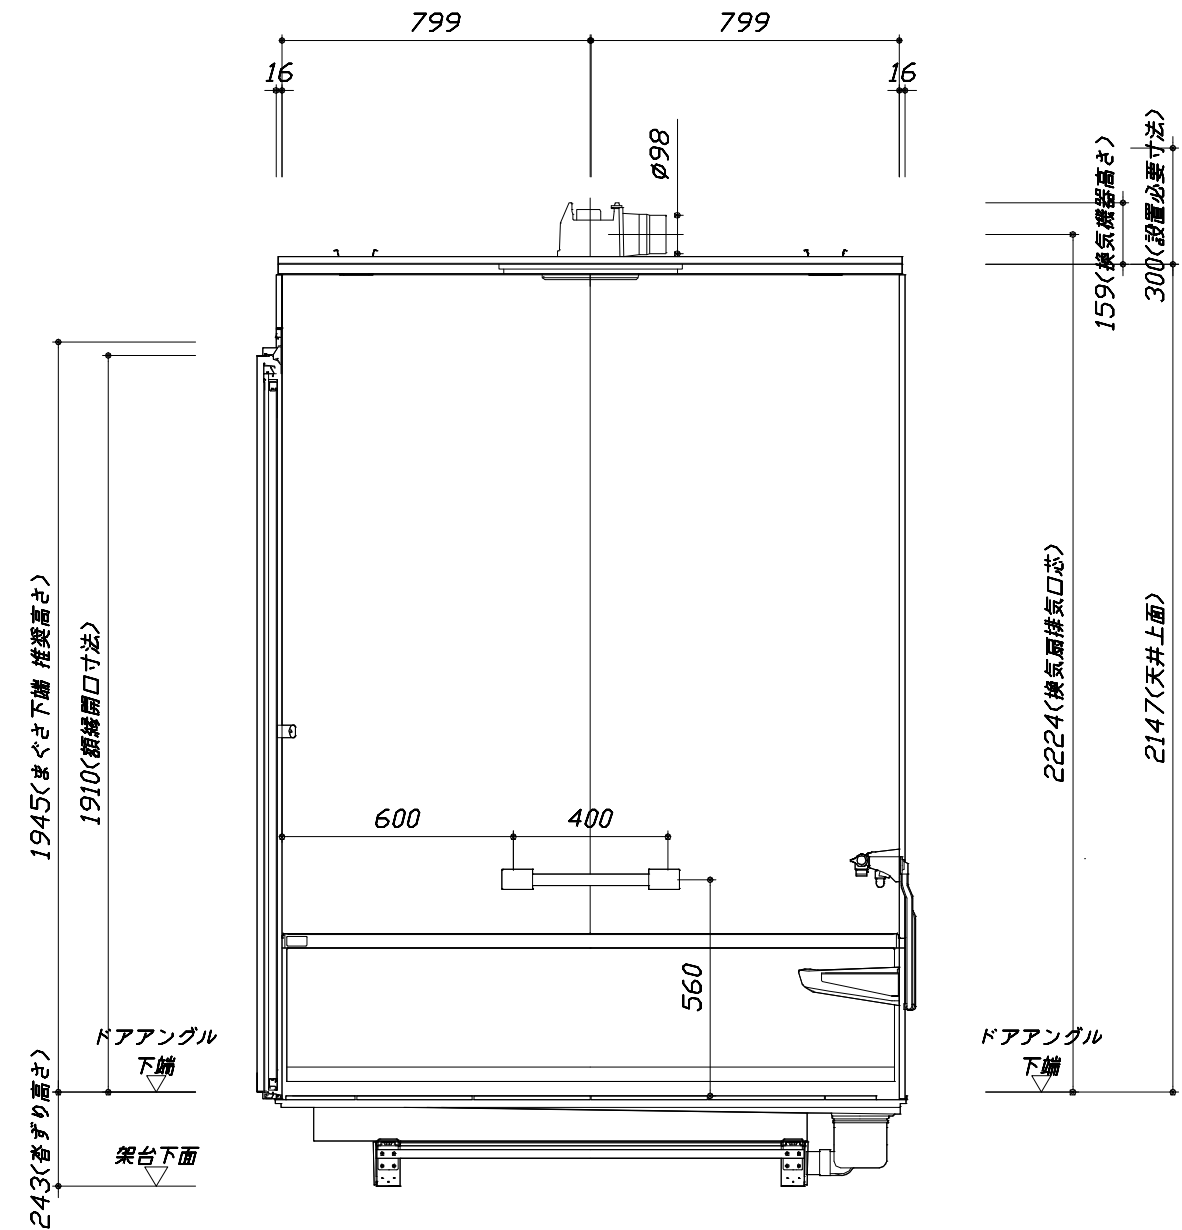

< 浴槽側面図 >

Takara standard

タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬-高崎SR SB2様邸	GRANSPA グランSPA	施工図3	縮 尺： 1:20
現場番号： C2786063	プラン番号： 7401A-2505-0196T	作成日： 2025年5月8日	
高崎営業所	担当営業： ②	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	ガラス繊維強化樹脂（FRP）裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	スクエア浴槽（325リットル）追い焚き穴:あり
浴槽パン	－
浴槽エプロン	A B S 樹脂
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア:19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス/上部換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	A B S 樹脂・封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	250kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ショートミラー（マグネット固定）鏡面:PETフィルム、基材:HIPS樹脂、アルミ樹脂複合板
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（2段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(SB1811)（樹脂ホース:シルバー）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S MH）
照明	LEDダウンライト（LED 12.3W白色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)（ダクト径φ98）ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットELX：ホース先端部R1/2オスネジ仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	ステンレスタイプ I型400タイプ
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	G：ライトグレー
カウンター	W：ホワイト
パネル(カウンター面)	MSG：スタッコグレー
パネル(周辺・3面)	MSG：スタッコグレー
水栓上部カウンター	W：ホワイト
浴槽エプロン	G：ライトグレー
洗場	HG：カームグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / W：ホワイト
収納棚	スクエアタイプ(W:ホワイト)
タオル掛け	－
ランドリーセット	－

Takara standard タカラストANDARD株式会社	現場名称： 群馬－高崎SR SB2様邸	GRANSPA グランspa	仕様表	
	現場番号： C2786063	プラン番号： 7401A-2505-0196T	作成日： 2025年5月8日	
	高崎営業所	担当営業：②	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事					○		浴室機器の事後電気工事	
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

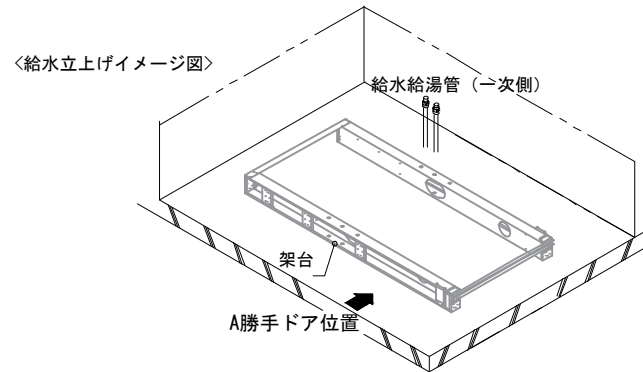

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



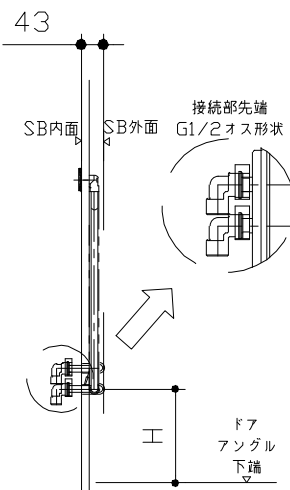
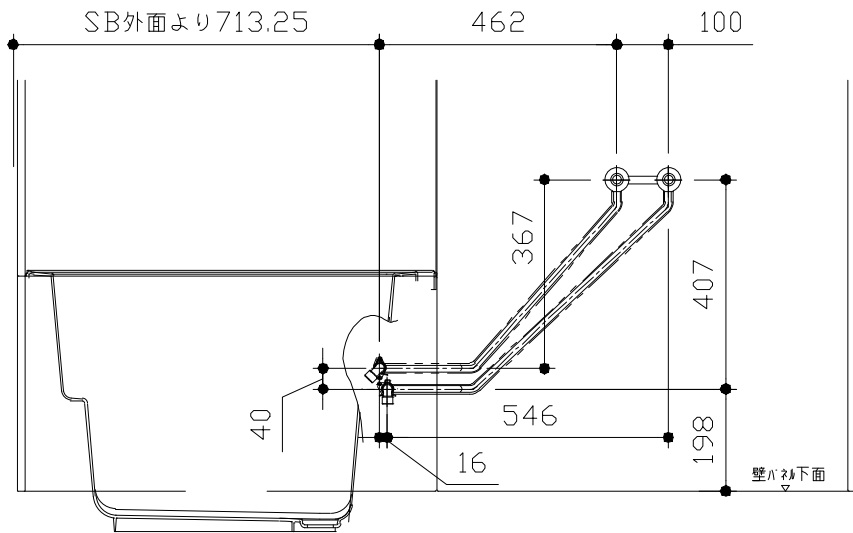


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

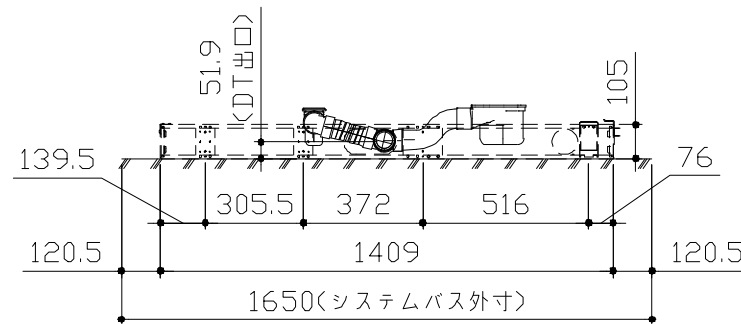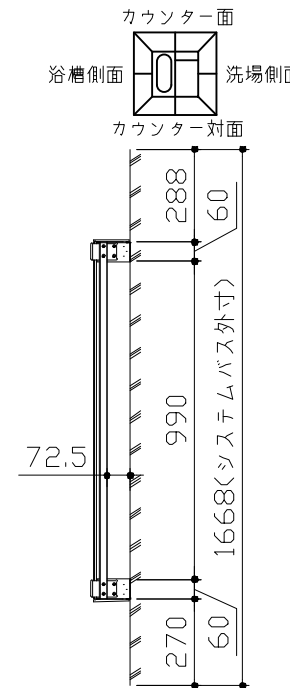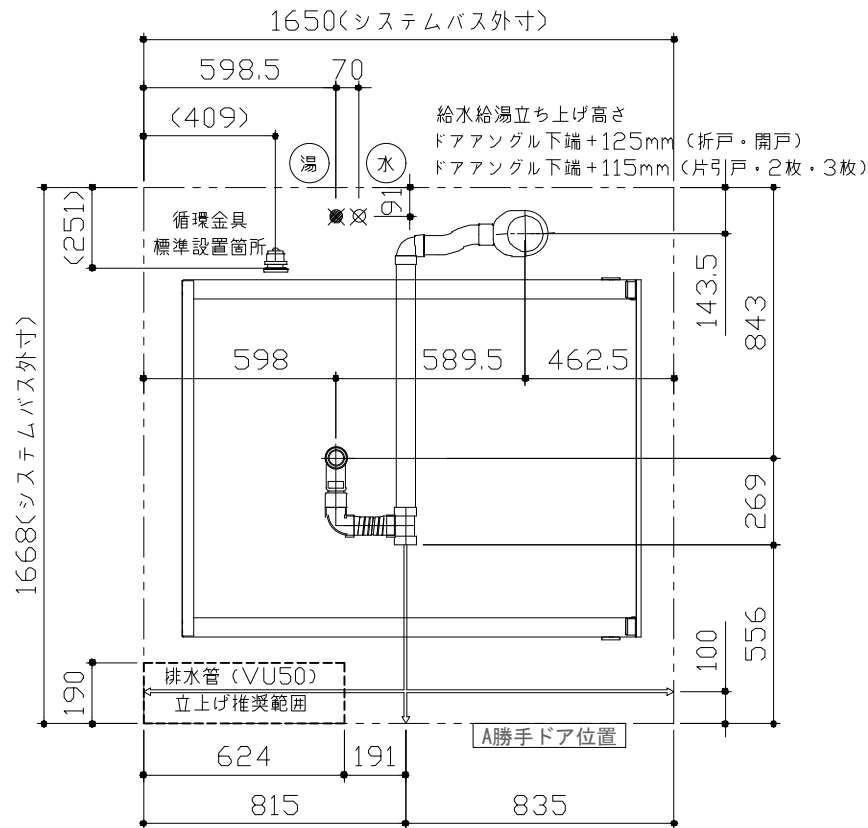

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・カウンター面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

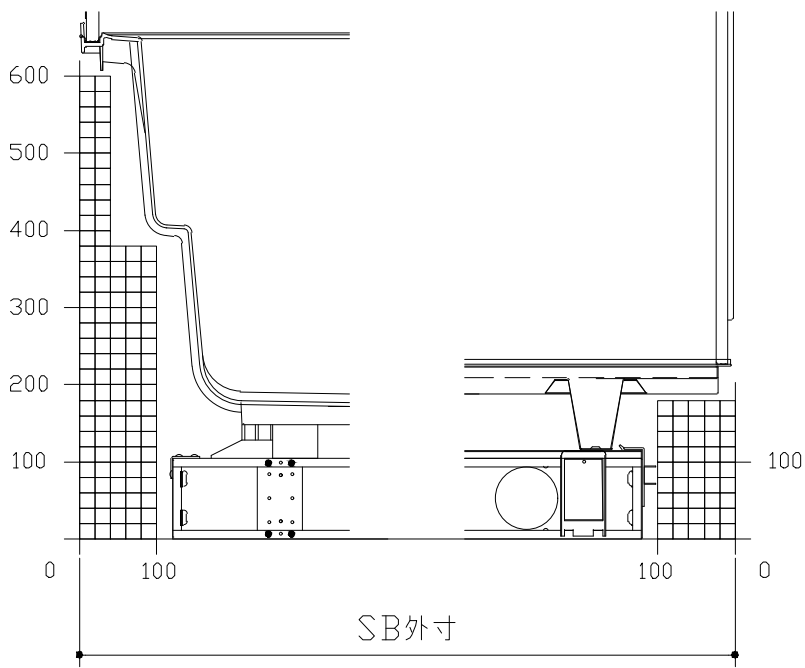


A矢視

B矢視

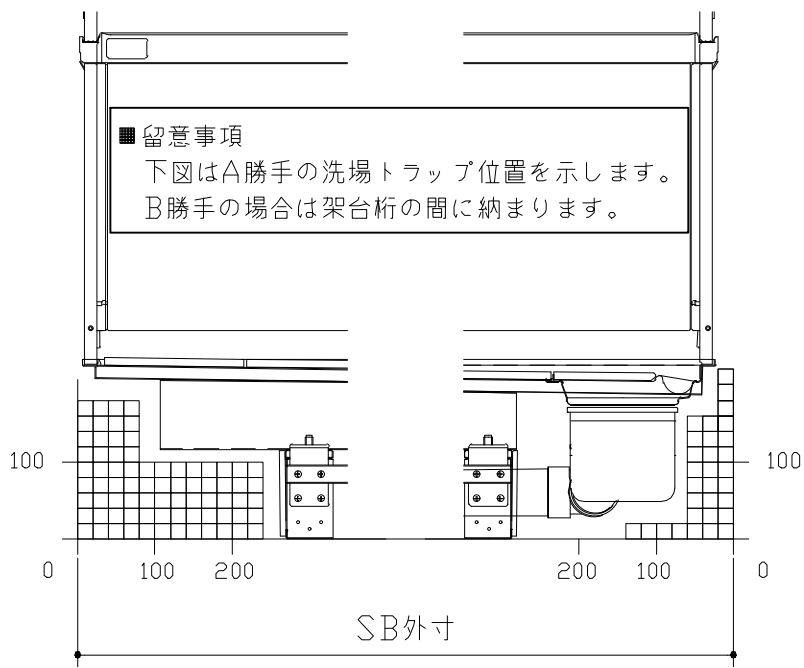

C矢視

D矢視



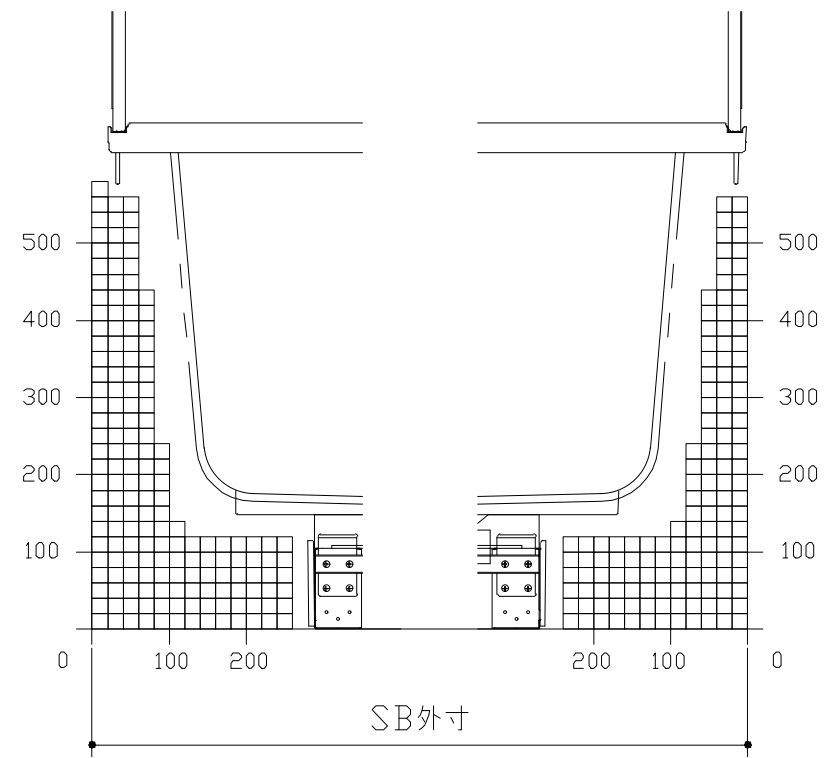


E矢視

F矢視

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

有効開口寸法689mm

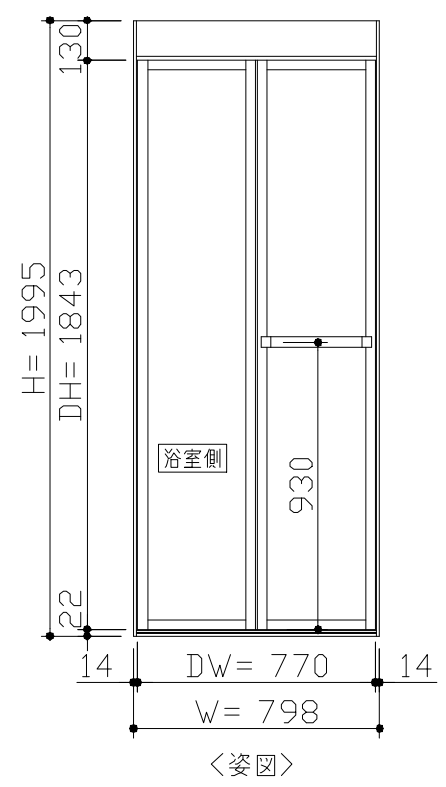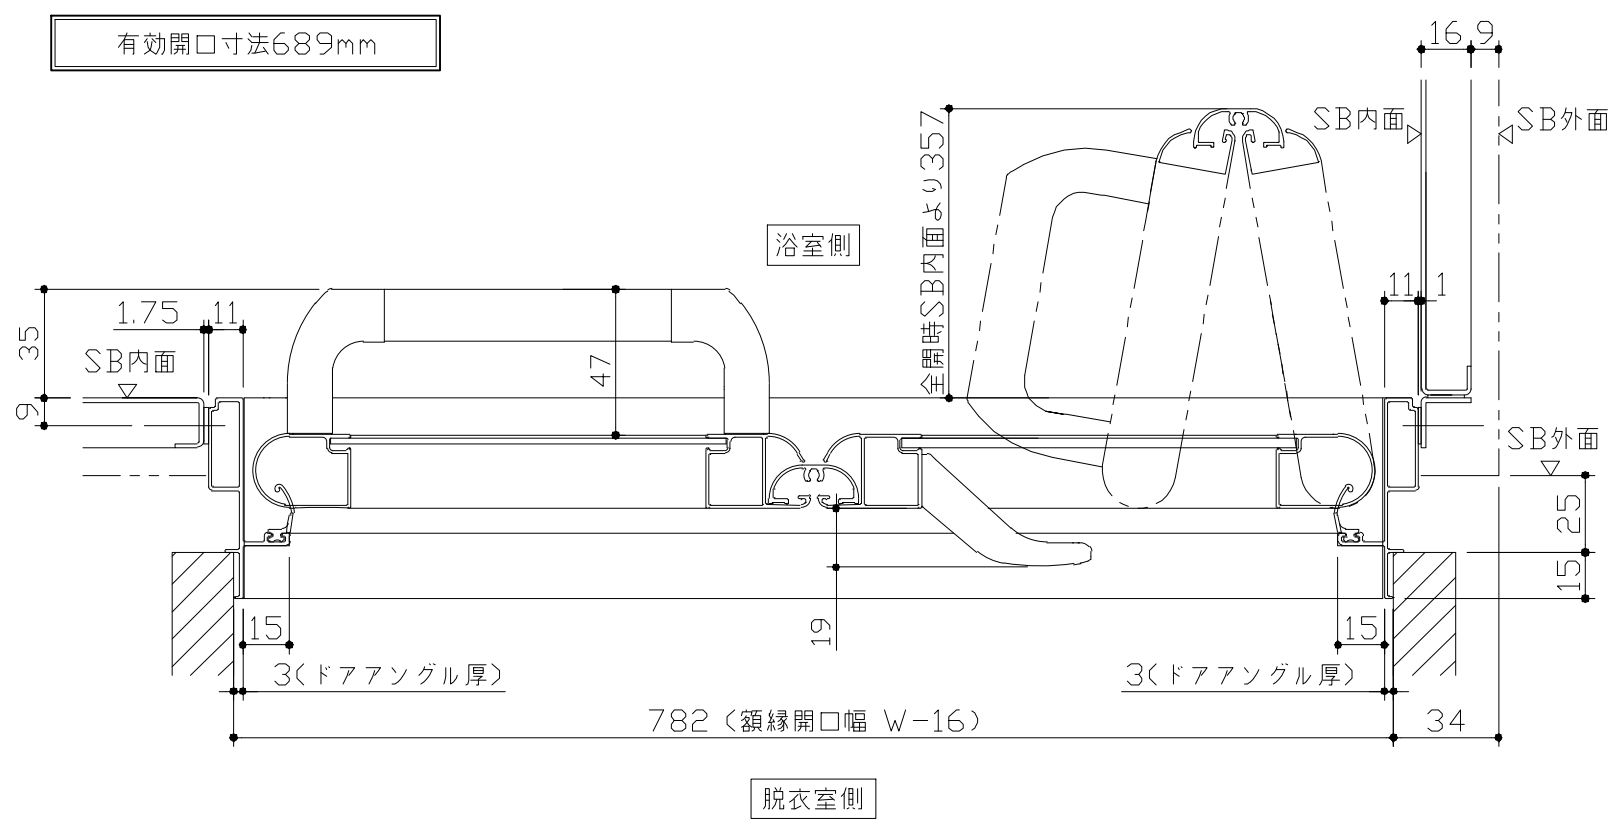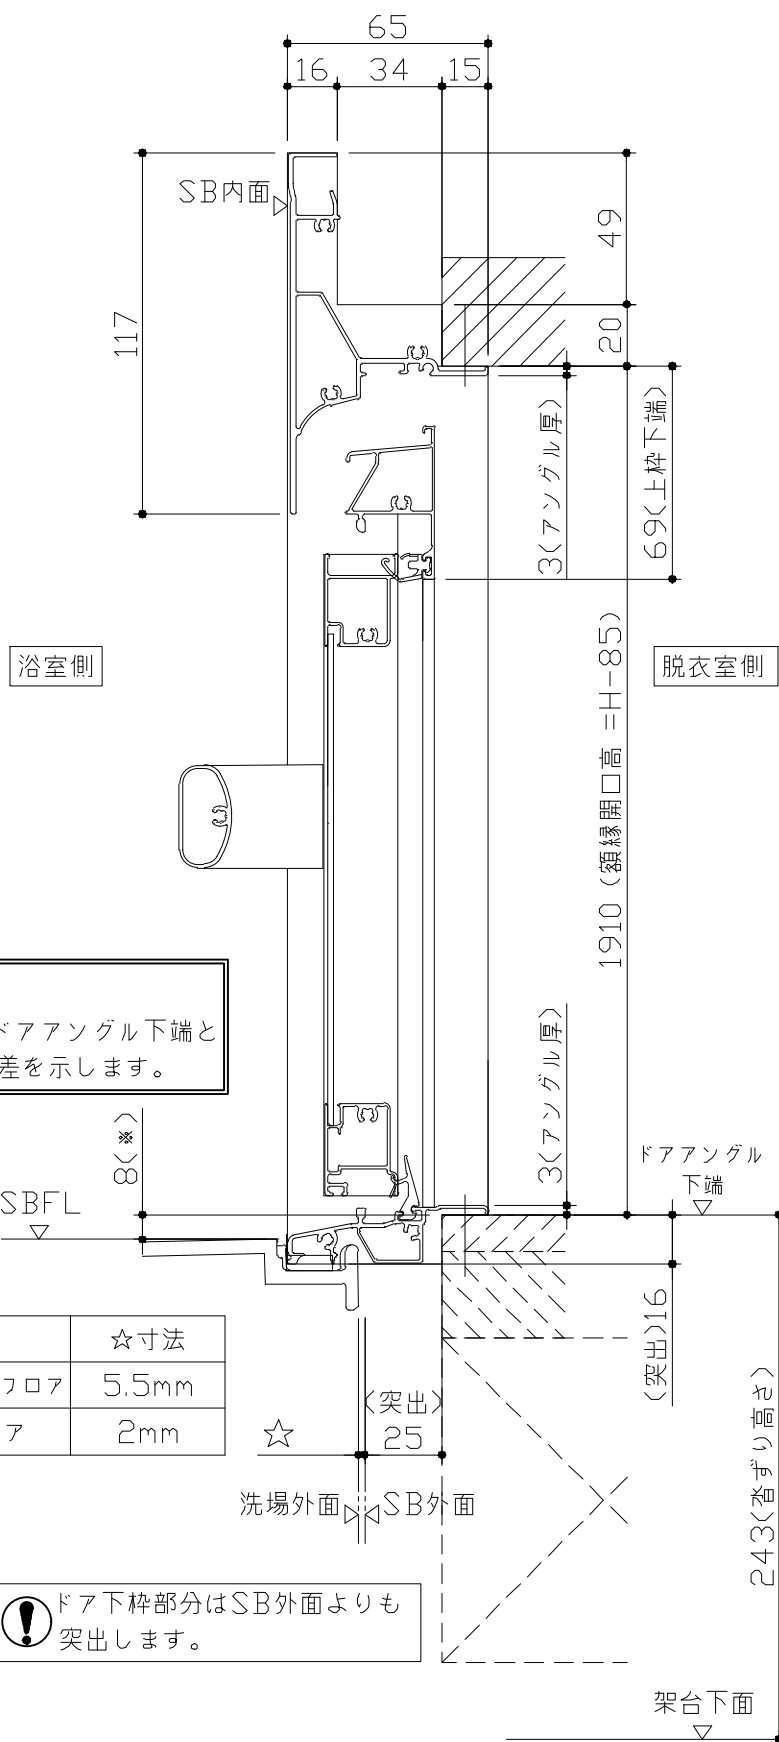


■ 留意事項
※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

❗ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

<参考寸法図>



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬－高崎SR SB2様邸	GRANSPA グランSPA	ドア取合詳細図
現場番号： C2786063	プラン番号： 7401A-2505-0196T	作成日： 2025年5月8日
高崎営業所	担当営業： ②	担当アドバイザー：




一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽	洗い場用水栓	照明		
(排水口深さ) 481.5 (跨ぎ寸法) 418 (浴槽穴 埋入位置) <282> (浴槽穴 埋入位置) 367 * 漏水受け仕様の場合は<>内寸法参照のこと		ダウンライト LED 3.1W (1灯あたり)		
換気機器	カウンター	シャワーフックスライドバー		
管工事 天井厚み 25	本体：ABS	材質 パイプ部：ステンレス 台座部：ABS、POM等 フック部：ABS等 取付部分詳細		
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 群馬－高崎SR SB2様邸 現場番号： C2786063 高崎営業所	GRANSPA グランspa プラン番号： 7401A-2505-0196T 担当営業： ②	部材詳細図 1/3 作成日： 2025年5月8日 担当アドバイザー：

ミラー ミラー：樹脂ミラー、表面防曇コートなし (鏡面：PETフィルム、基材：スチロール樹脂、フルミ樹脂複合板) 260 (鏡本体) (250) (マグネットシート) 570 (鏡本体) 鏡 (300) (マグネットシート)		収納棚 本体：ABS 187 130 105 195 11 22.5 150 (取付穴ピッチ) 22.5 35 取付穴から棚天面まで		ハンドバー支持部取合詳細図 握りバー キャップ パネル表面 皿タッピンネジ 4×14 30 33 72 78.8 55 40 Ø30		
循環金具・フロアダプタ関連 (925) R1/2		風呂蓋 707MZAH-16SNT 725 716 1432 716 断面図 16 14.6 7.4 20		洗い場側排水トラップ 71 100.5 40 41 81 1.15° 145 71 13.8 60.7 122 φ142 排水50.3		
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 群馬－高崎SR SB2様邸 現場番号： C2786063 高崎営業所		GRANSPA グランspa プラン番号： 7401A-2505-0196T 担当営業： ②		部材詳細図 2/3 作成日： 2025年5月8日 担当アドバイザー：

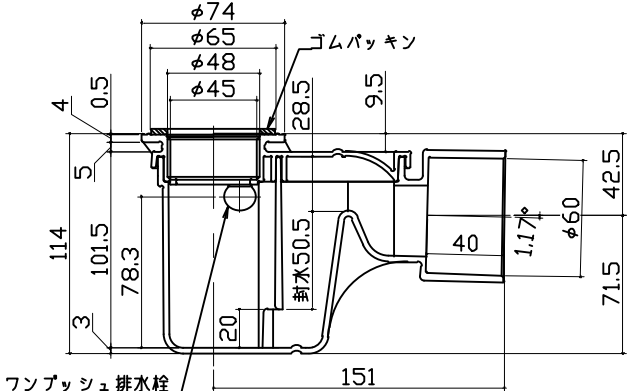浴槽側排水トラップ			
 フロートバルブ排水栓 ファイヤー引き込み穴 Rタイプを示します。Lタイプは ファイヤー引き込み穴のみ対称になります。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬-高崎SR SB2様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図
	現場番号： C2786063	プラン番号： 7401A-2505-0196T	作成日： 2025年5月8日
	高崎営業所	担当営業： ②	担当アドバイザー：
			3/3

パネル割図		収納棚		シャーフックスライドバー	
ハネK16C2Z 0799 R<MSG ハネL16C1N 0799 <MSG ハネL16NW 0799P <MSG ハネL16NW 0799P <MSG ハネL16NW 0799P <MSG ハネK16A 0799 <MSG ハネK16A 0799 <MSG AR勝手 ↑		ハネK16C2Z 0799 R<MSG 799 1200 860 200 50 現地加工：φ3.5		ハネK16C2Z 0799 R<MSG 799 64 33 33 33 754 1774 現地加工：φ3.5	
Takara standard タカラストANDARD株式会社		現場名称： 群馬－高崎SR SB2様邸	GRANSPA グランスパ	穴開け指示図	1/1
		現場番号： C2786063	プラン番号： 7401A-2505-0196T	作成日： 2025年5月8日	
		高崎営業所	担当営業： ②	担当アドバイザー：	
