

システムバス 御見積書

御名前 群馬-高崎SR SB4 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランスパ

作成日 2025年5月8日
プラン番号 7401A-2505-0198T
現場番号 C2788285

タカラスタンダード株式会社
◆高崎営業所
群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
TEL 027-395-8001 / FAX 027-370-0007

◆高崎ショールーム
TEL 027-395-8000 / FAX 027-363-1000

商品
御見積金額 **¥1,477,800 (税込 ¥1,625,580)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥158,000 (税込 ¥173,800)**

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(BR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトグレー
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	—
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	テラゾーホワイト
パネルカラー(周辺)	ウォルナットブラック
ガス種 / 周波数	13A / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		河合

◆ 備考

御名前 群馬-高崎SR SB4

様

現場番号	C2788285	プラン番号	7401A-2505-0198T	作成日	2025/5/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1620サイズ		1	848,000	848,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ブラック)ノ強化ガラス(スモーク)(20サイズ)	1	+91,500	+91,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームグレー)	1		
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーライトグレー)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB220K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+72,000	+72,000
19	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KVK FTB220K	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	ハイクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+40,000	+40,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 B<ブラック色>	1	+21,000	+21,000
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプなし	1	-2,800	-2,800
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(昼白色)	1	+41,000	+41,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 群馬-高崎SR SB4 様

現場番号	C2788285	プラン番号	7401A-2505-0198T	作成日	2025/5/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ロングクリアミラー	1		
33	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
34	タオル掛け	クリアタイプ ブラック	1	+3,000	+3,000
35	収納棚	クリアタイプ ブラック(3段)	1	+17,000	+17,000
36	浴室テレビ	浴室テレビ(HDMI入力・ミラーリング対応)16インチ(ブラック)	1	+255,000	+255,000
37	どこでもラック	シャワーフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
38	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
39	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
40	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			40		¥1,477,800
商品総合計			40		¥1,477,800

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥158,000 (税込 ¥173,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

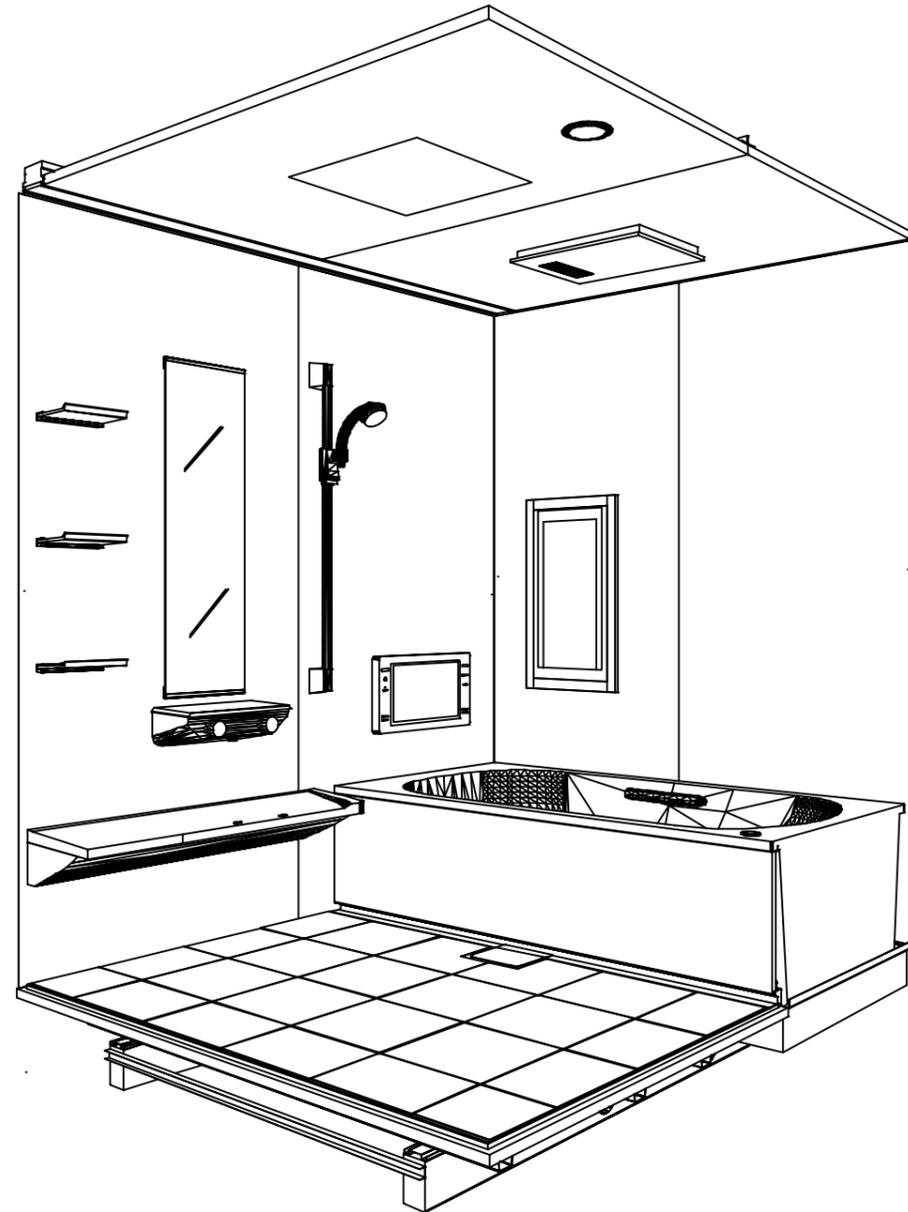

鳥瞰図

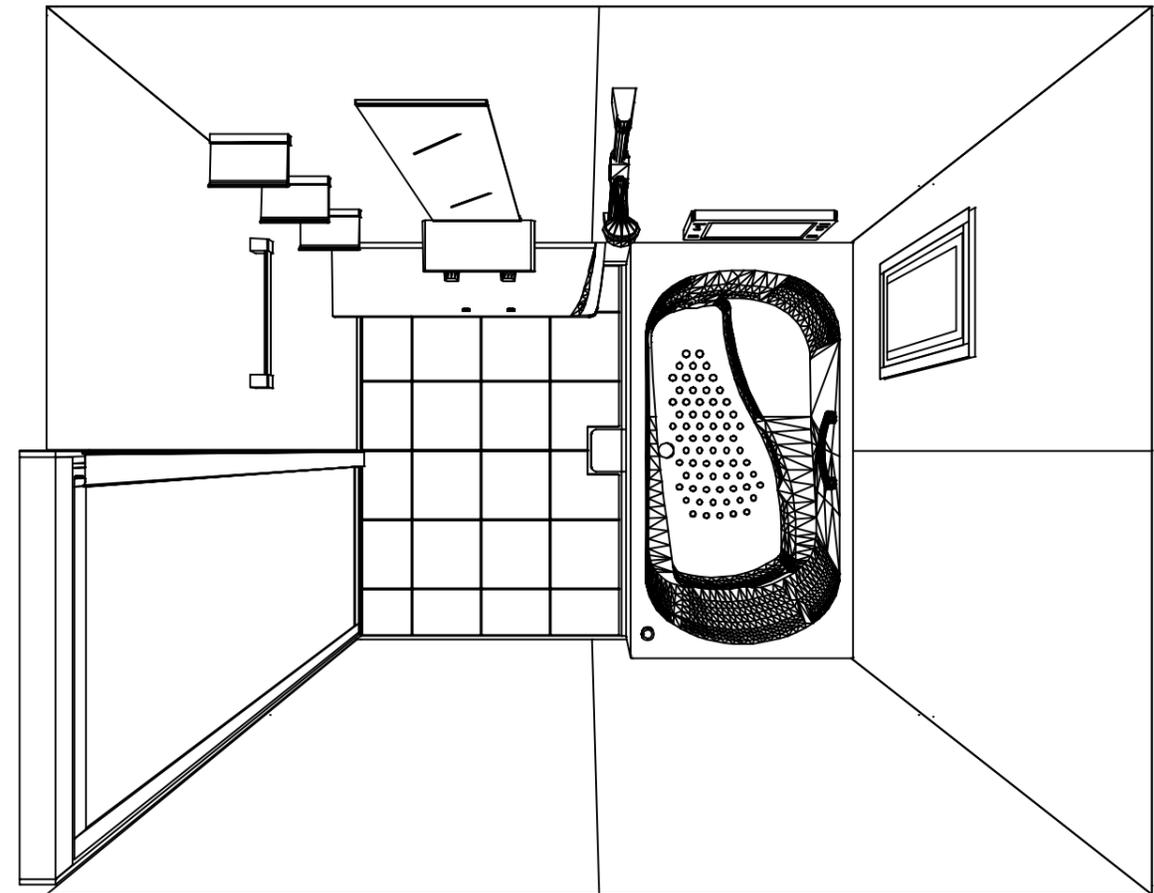


1620



フラット天井

電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。




■ 留意事項
 * 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

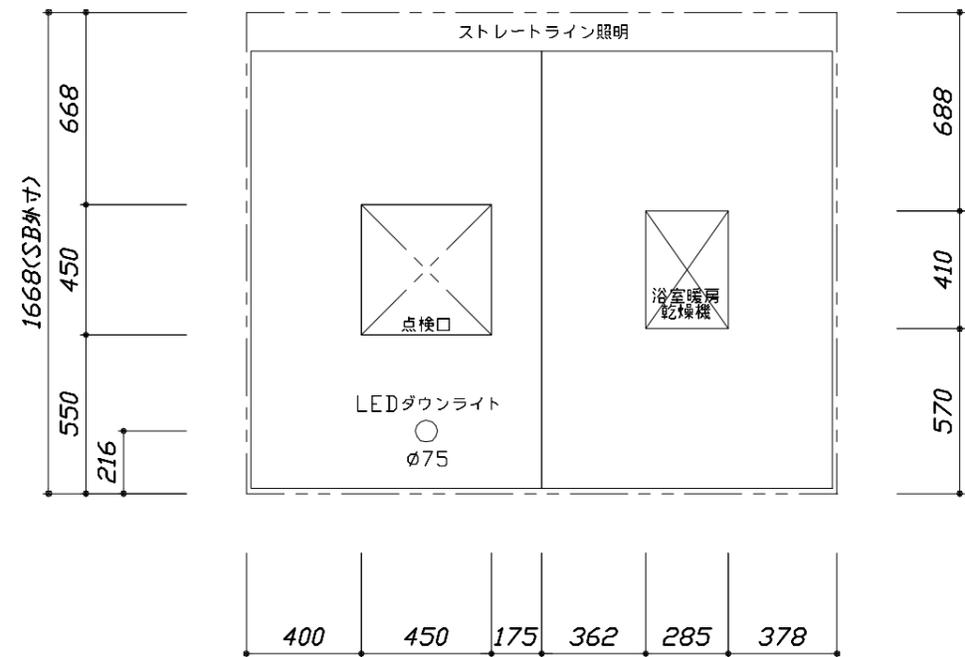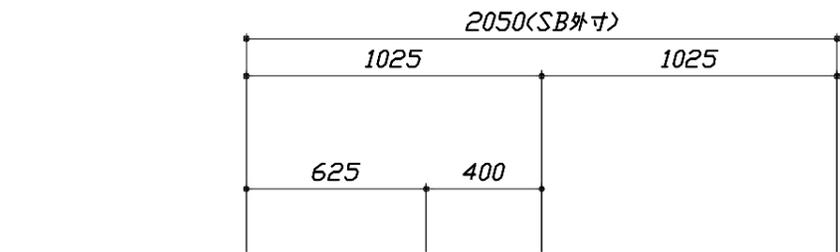

< 天井伏図 >

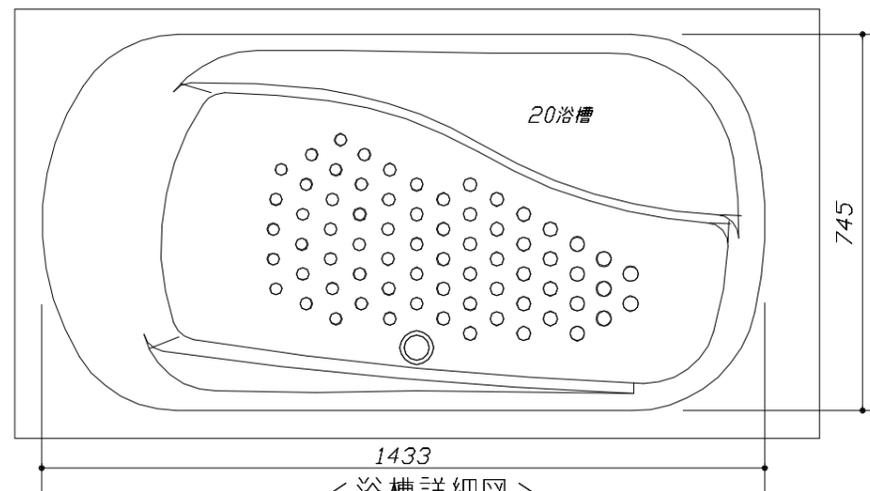

< 浴槽詳細図 >

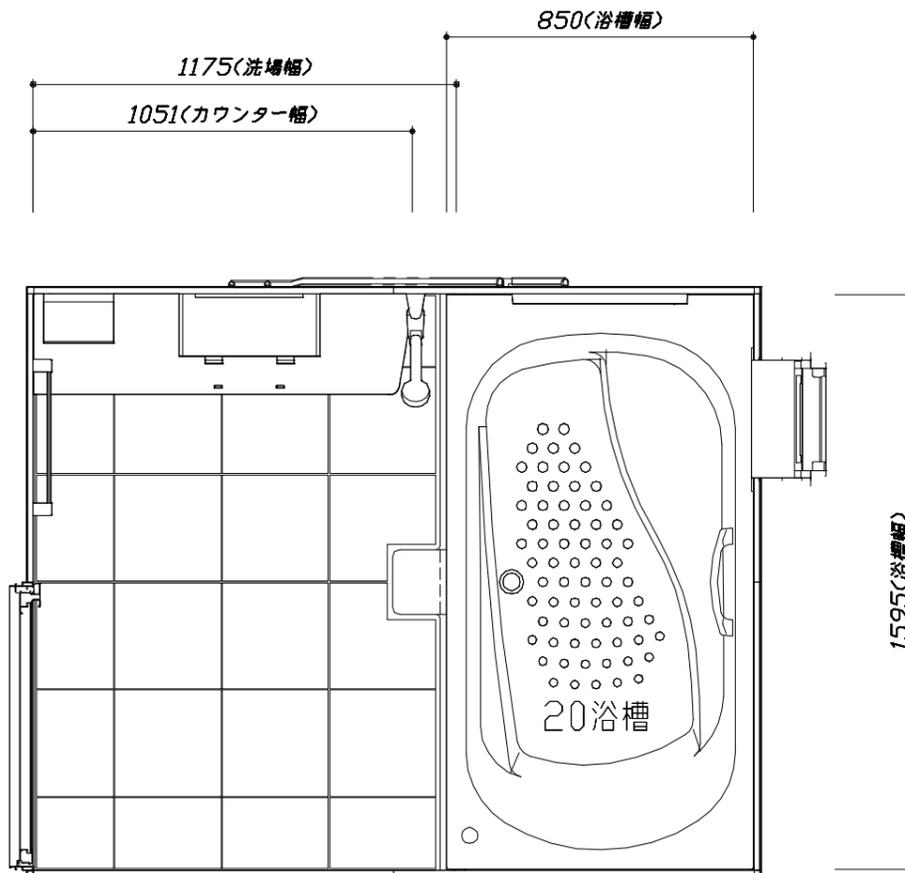

< 平面図 >

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社



現場名称： 群馬-高崎SR SB4様邸
 現場番号： C2788285
 高崎営業所

GRANSPA グランspa
 プラン番号： 7401A-2505-0198T
 担当営業 :

施工図1
 縮尺： 1:25,20
 作成日： 2025年5月8日
 担当アドバイザー：


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

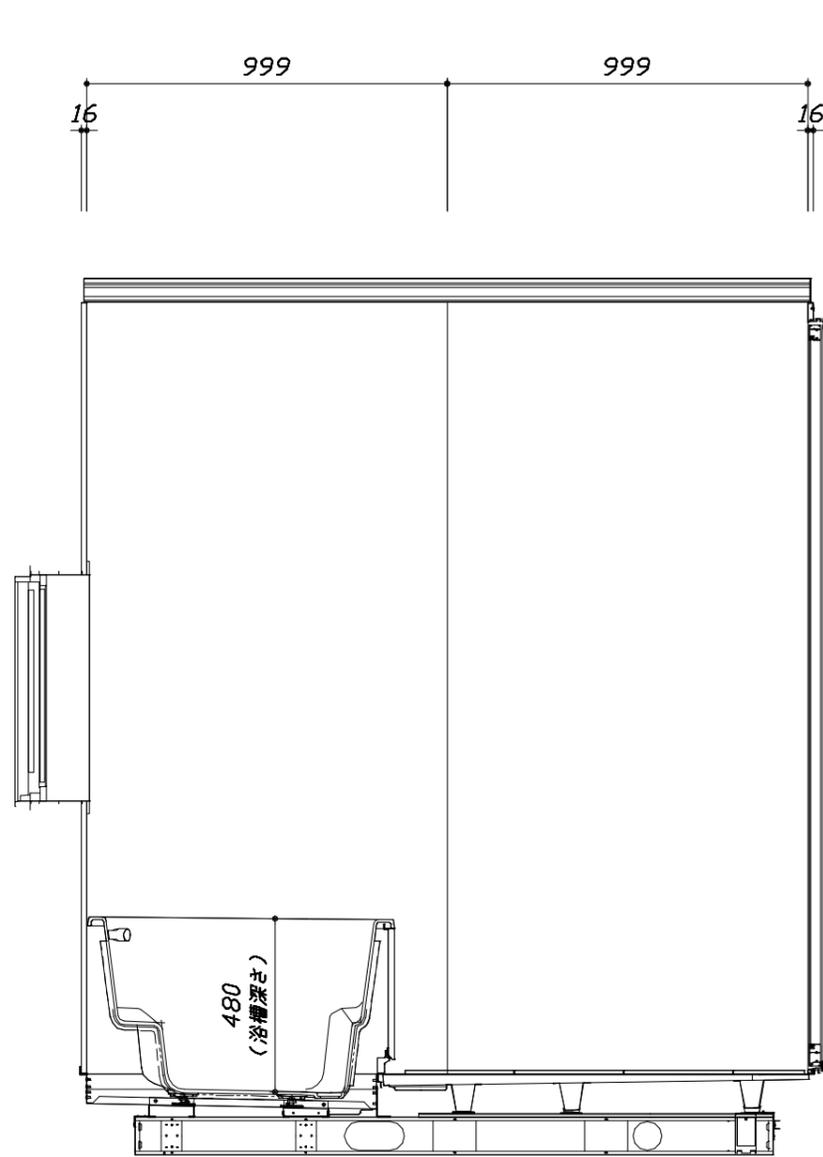

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)



<カウンター対面図>

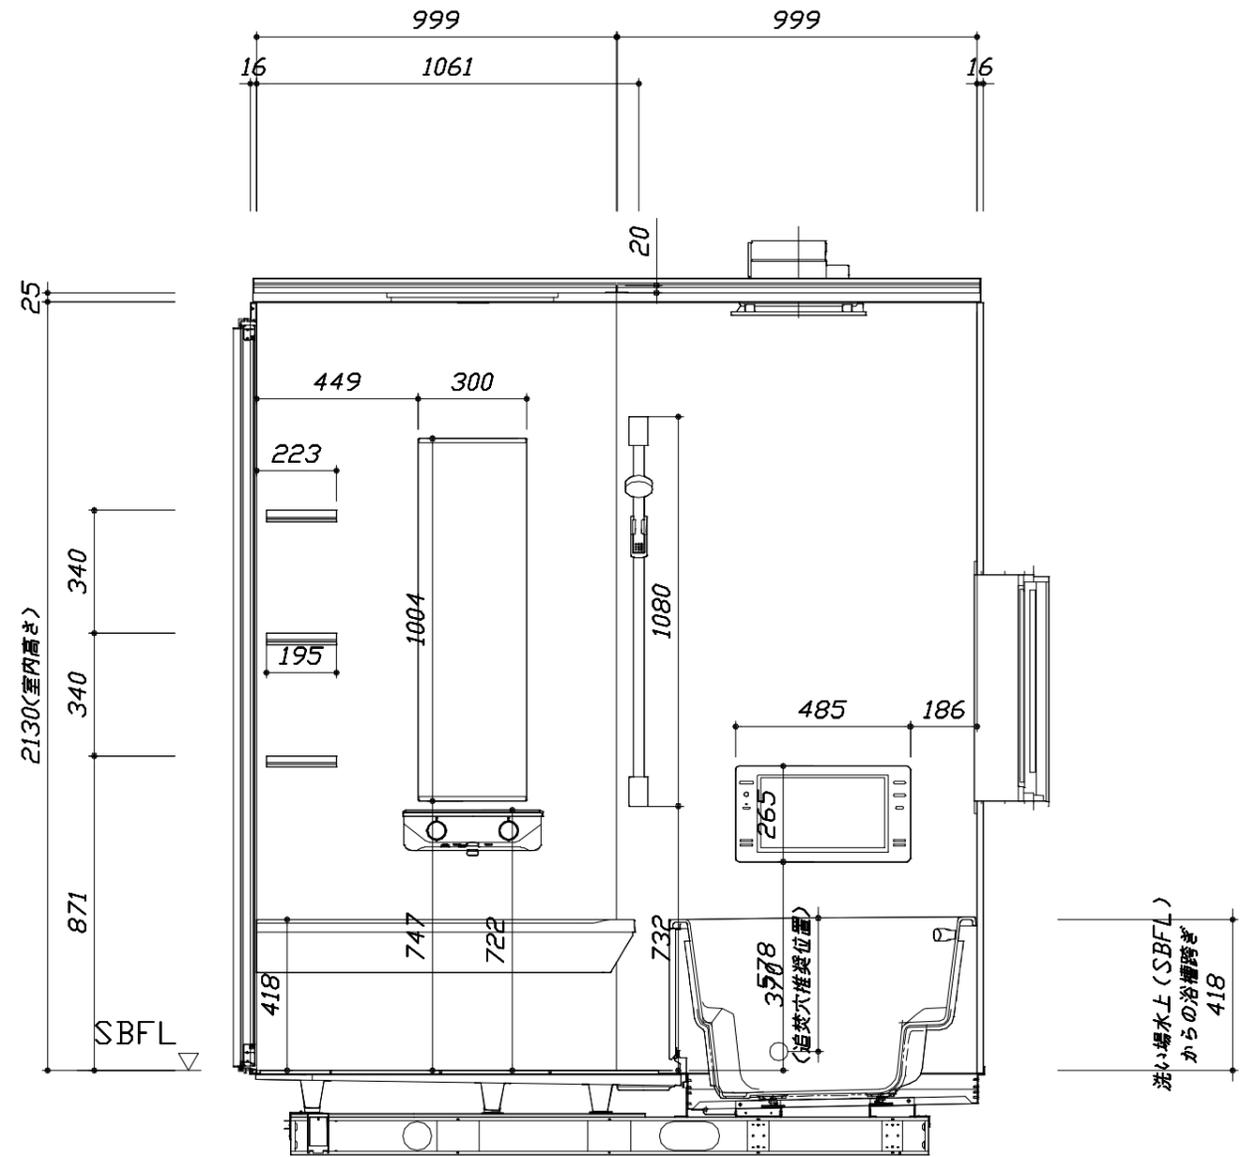

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
- ・大きさ、設置位置等確認をお願いします。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

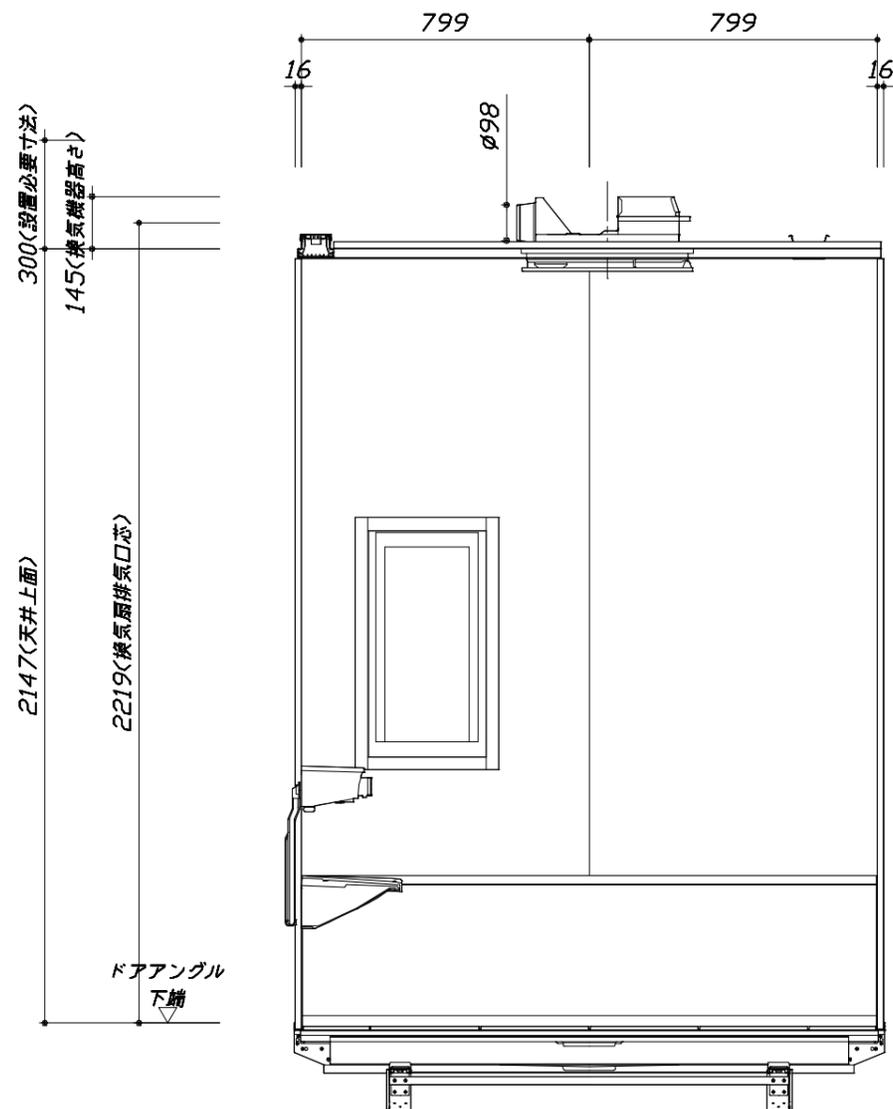

< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
 ドアアングル下端より
 265mm下がり
 (クリア寸法含む)

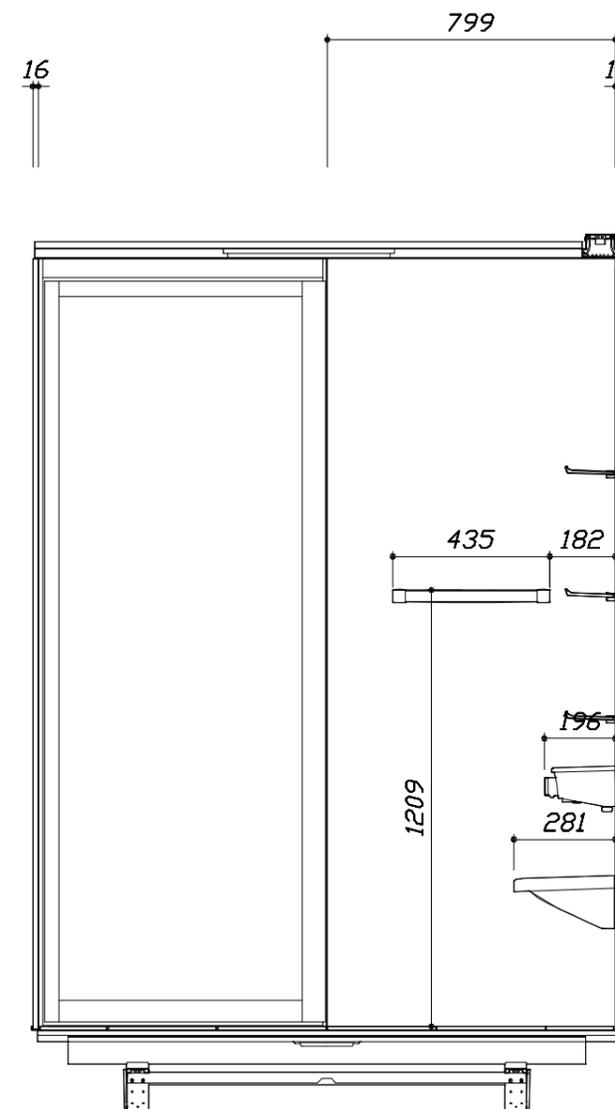

< 洗場側面図 >

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬-高崎SR SB4棟邸
 現場番号： C2788285
 高崎営業所

GRANSPA グランspa
 プラン番号： 7401A-2505-0198T
 担当営業 :

施工図3 縮尺： 1:20
 作成日： 2025年5月8日
 担当アドバイザー：

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様 (発泡ウレタン)
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付) グリップ付 (330リットル) 追い焚き穴：あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サドル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：20高さ開き戸(アルミ框/飛散防止フィルム付強化ガラス/炬型換気口)
窓1	現地手配
窓2	—
窓枠1	ABS樹脂 B：ブラック
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂, 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	365kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製 (3段)
タオル掛け	クリアタイプ：アクリル樹脂製
洗場側水栓	サーモスタット(KVK FTB220K) (樹脂ホース：メタル調)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ) (スライドバー-T1020S MH)
照明	ストレートライン照明 (LED 21.3W昼白色)
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ダクト径φ98) (常時換気対応品)ブラック
フロタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	—
ハンドバー②	—
ハンドバー③	—
ハンドバー④	—
ハンドバー⑤	—
ハンドバー⑥	—
ハンドバー⑦	—

本体カラー

浴槽	GN：シュガーライトグレー
カウンター	KA：ダークグレー
パネル(カウンター面)	JTW：テラゾーホワイト
パネル(周辺・3面)	YK：ウォルナットブラック
水栓上部カウンター	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	HG：カームグレー
ドア / 天井	B：ブラック / B：チャコールブラック
収納棚	クリアタイプ(ブラック)
タオル掛け	クリアタイプ(ブラック)
ランドリセット	—

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建 具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
電気	給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事		
	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事		
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□		浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置						□		洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置						□		浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置						□		天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置【注記1】						□		カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付【注記1】						□		水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付【注記1】						□		浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付【注記1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付						□		浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付【注記1】						□		電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付						□		システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付【注記1】						□		システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付【注記1】						□		システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填						□		接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査【注記2】						□		完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ		○						建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事					○			浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事					○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	管	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
1 3	電気 他	建築側排水配管との接続工事【注記3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
		給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
		内装仕上げ工事		○	○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
			浴室用電源配線、接続工事				○			浴室機器の事後電気工事	
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事				○			浴室全体の電気器具、配線接続工事	

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
 ※【注記2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
 ※【注記3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする




■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

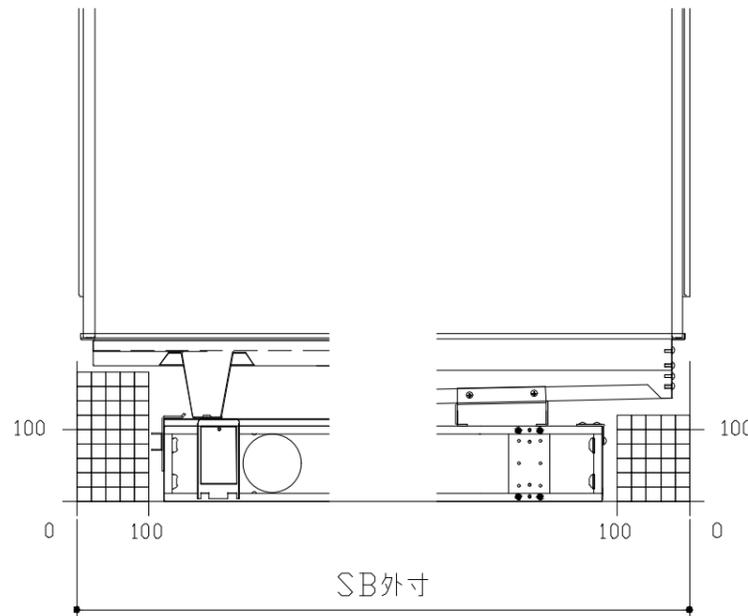

B矢視

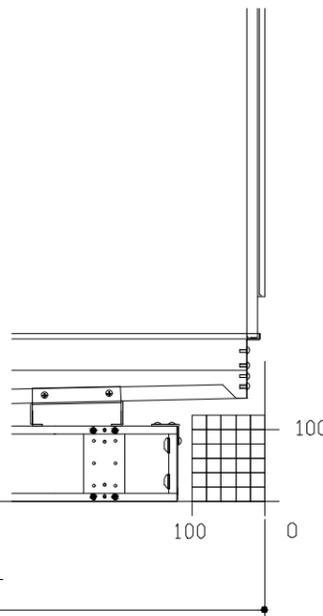


A矢視

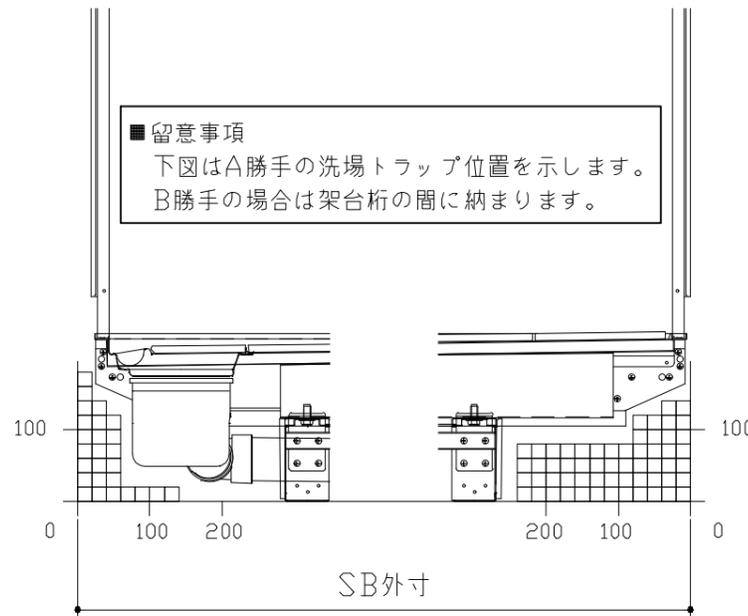


D矢視



C矢視

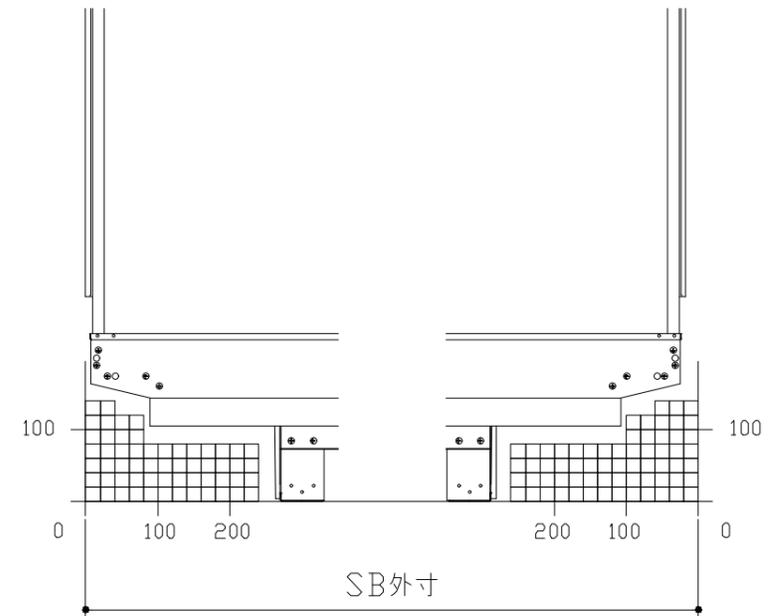


F矢視

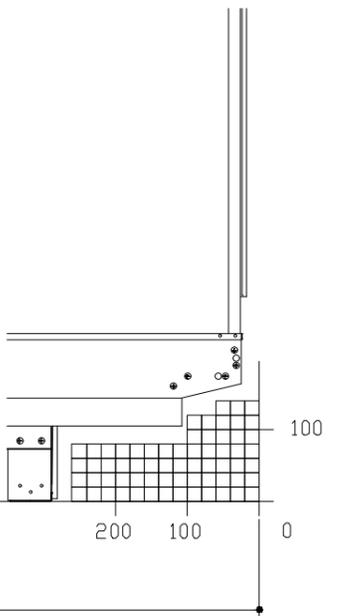

E矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口


有効開口寸法720mm

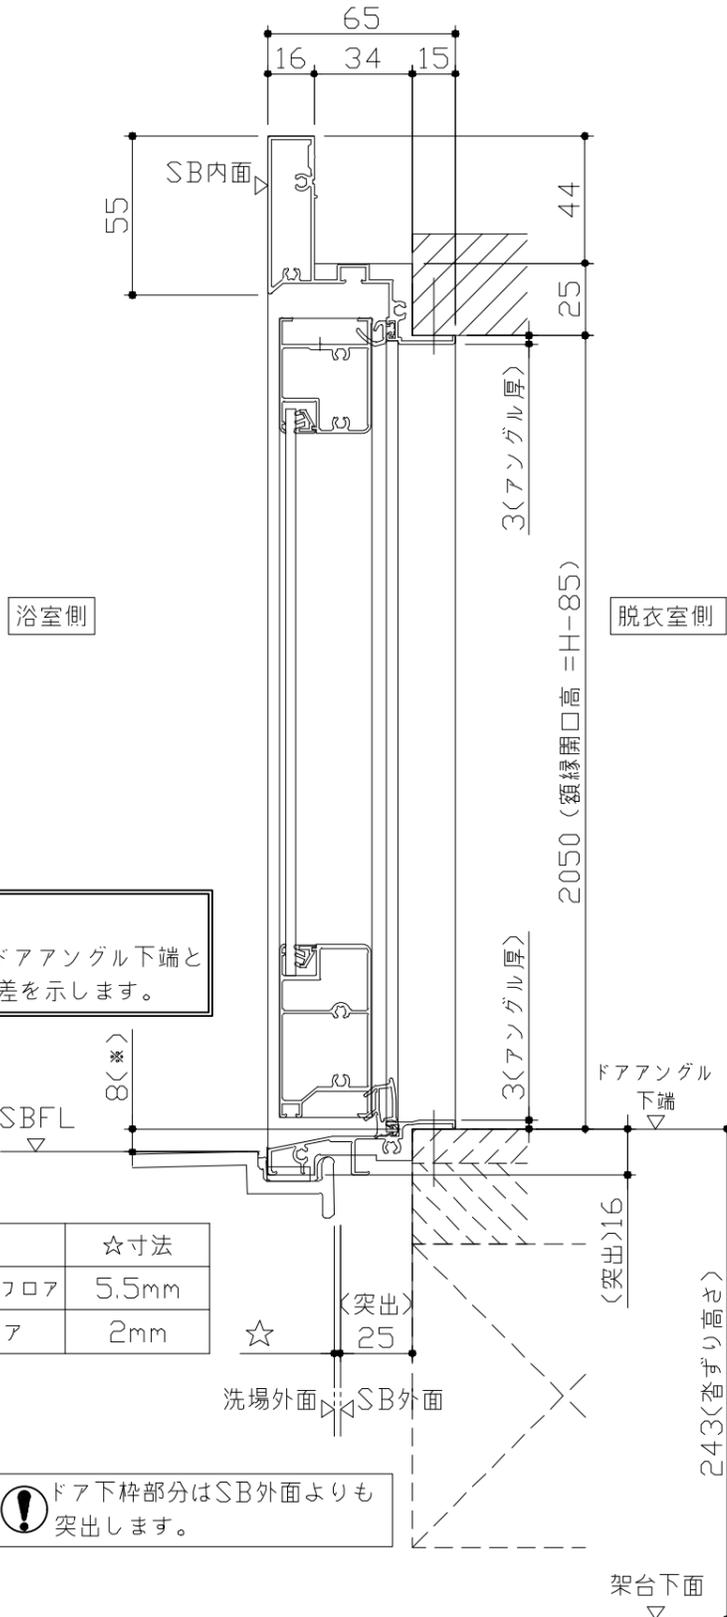


■ 留意事項
 ※ 印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

⚠ ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

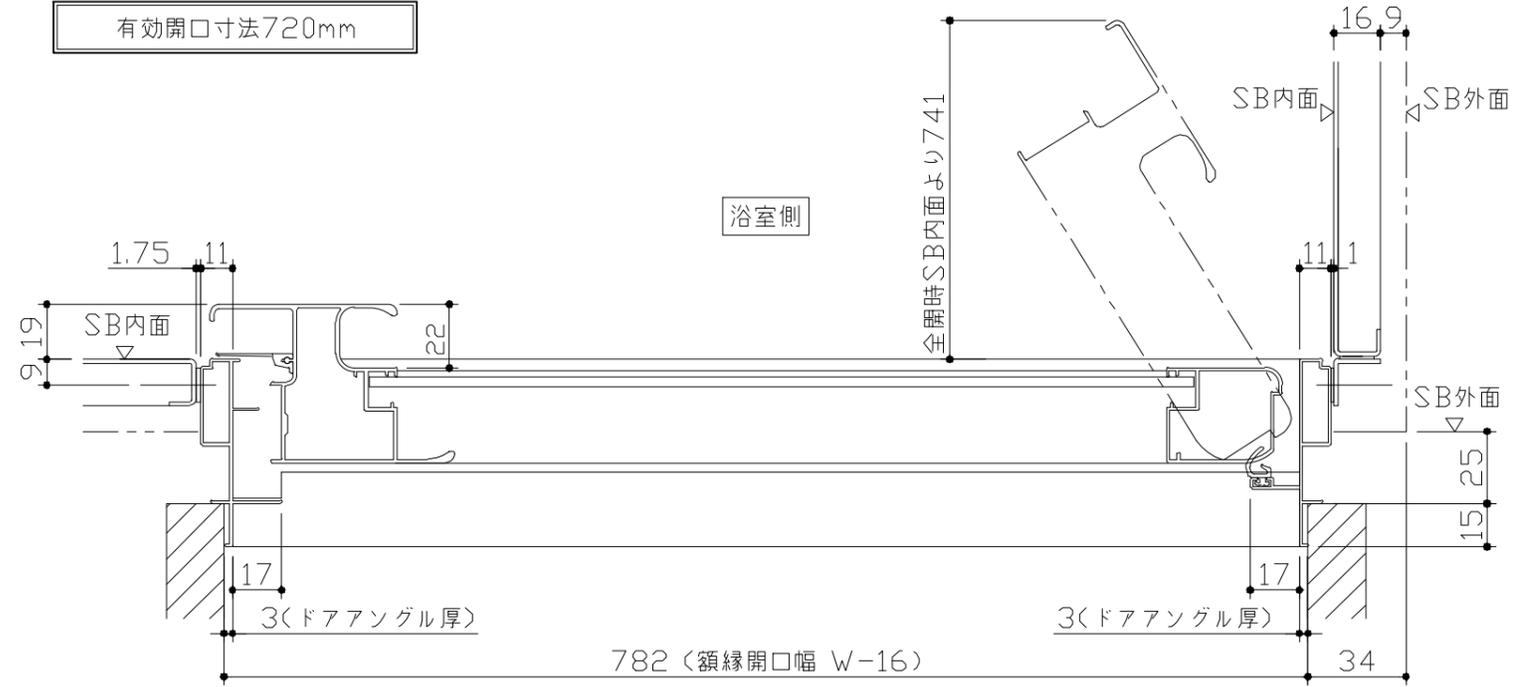




脱衣室側
 ドア開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

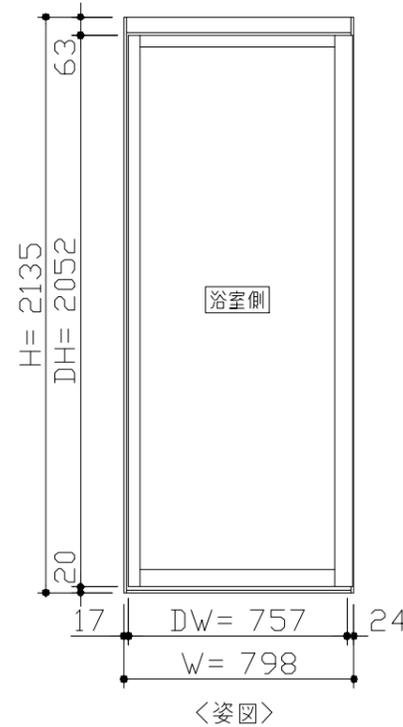

■ ドア横の管柱、間柱について
 ・ ドアが管柱、間柱にあたらぬよう十分に考慮してください。
 ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

＜参考寸法図＞



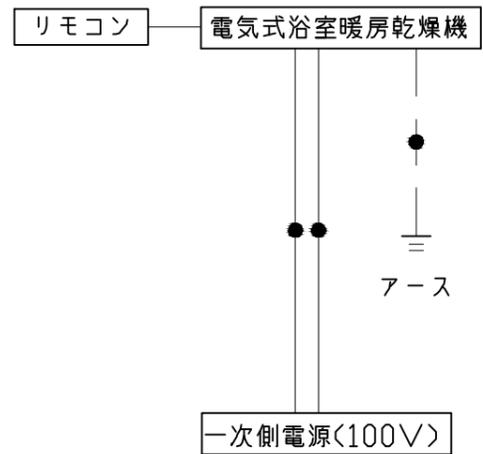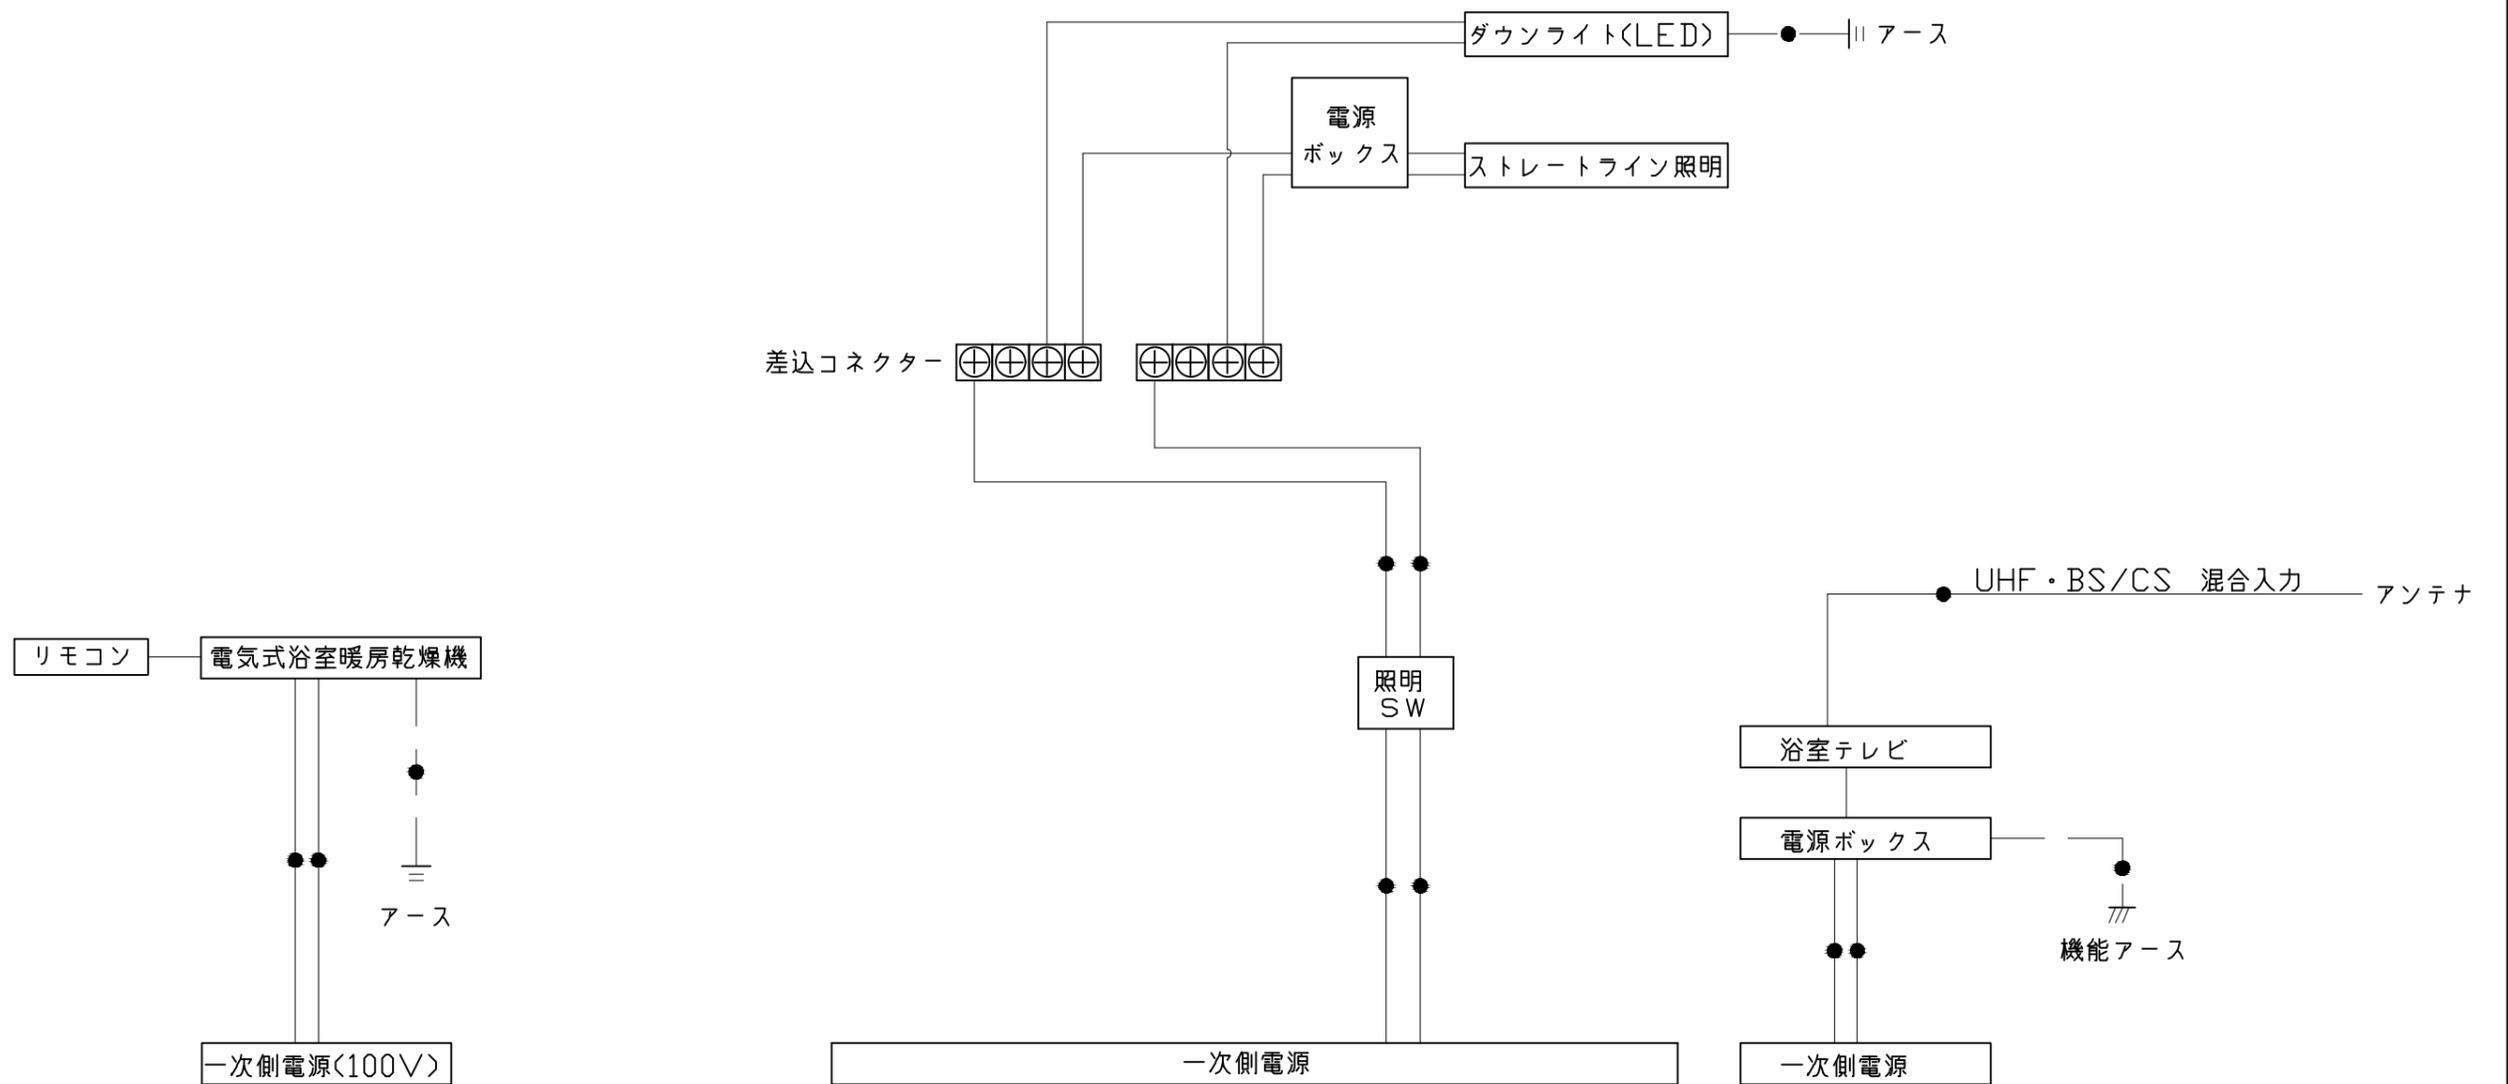


*浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。


一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事(●部)については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者(電気工事士)による施工が必要です。

アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。


浴槽

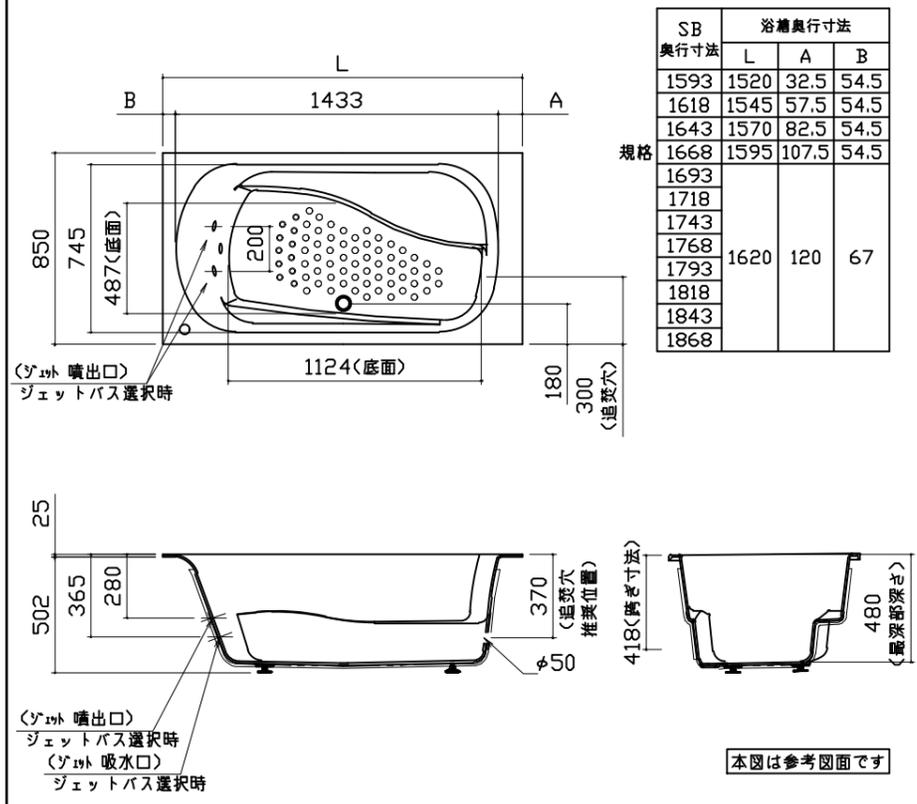


洗い場用水栓

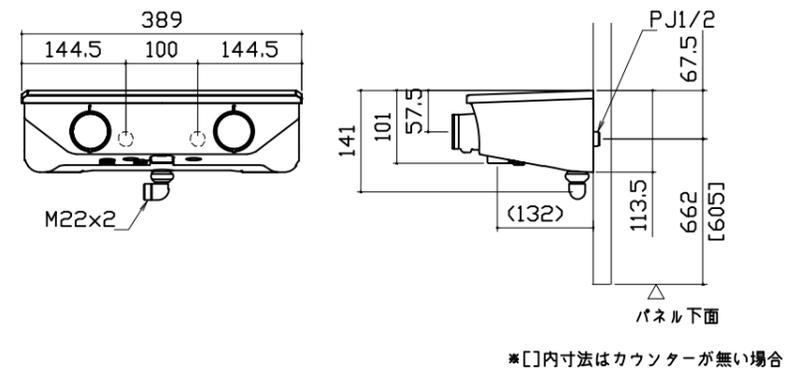


照明

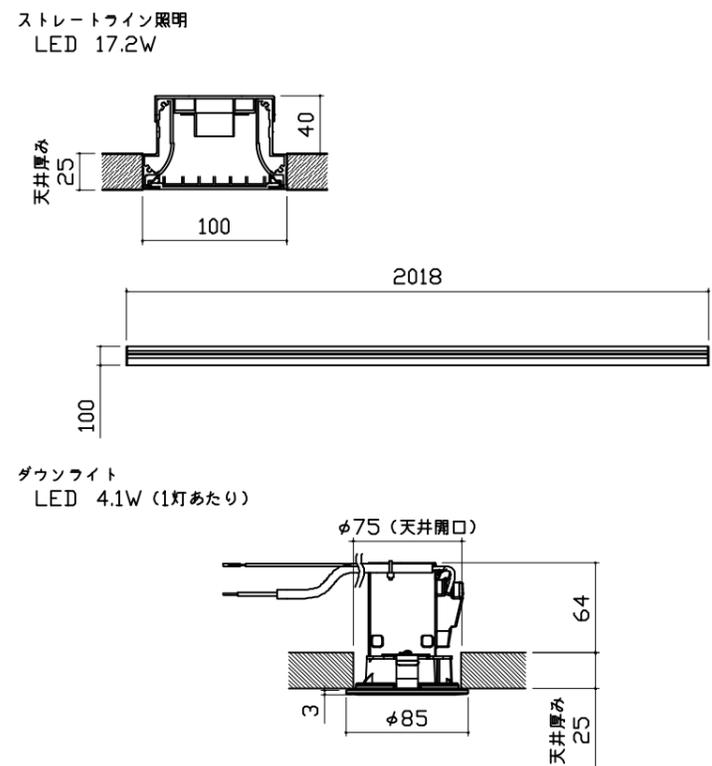


換気機器

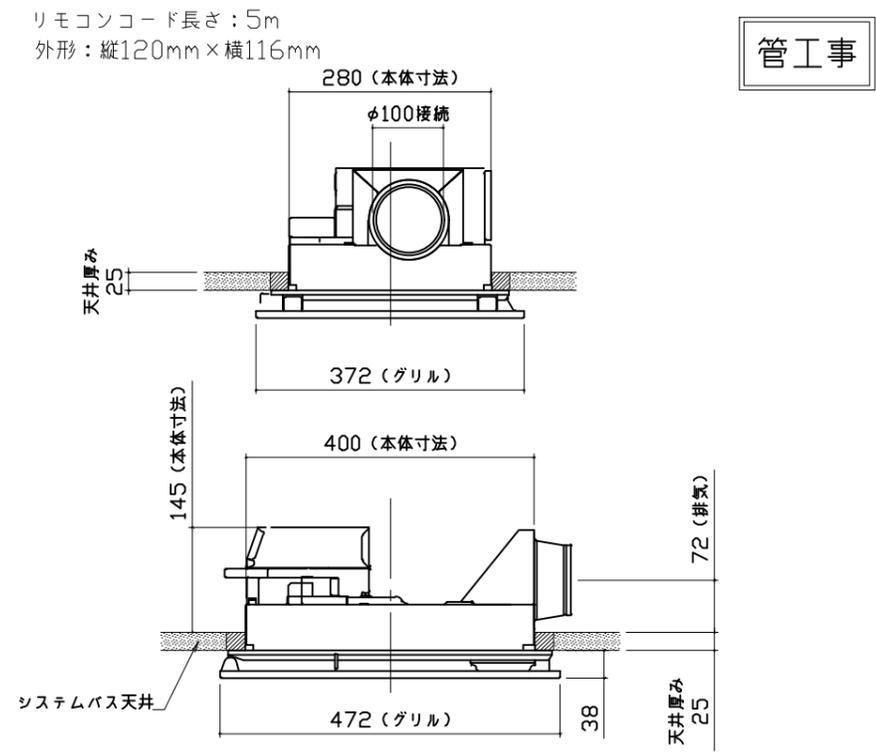

シャワーフックスライドバー

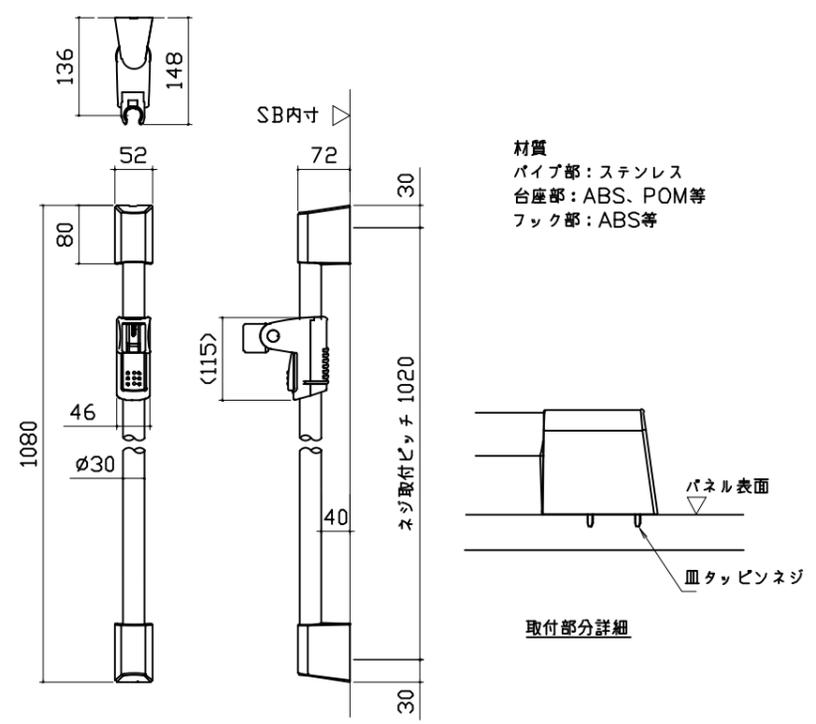


ミラー

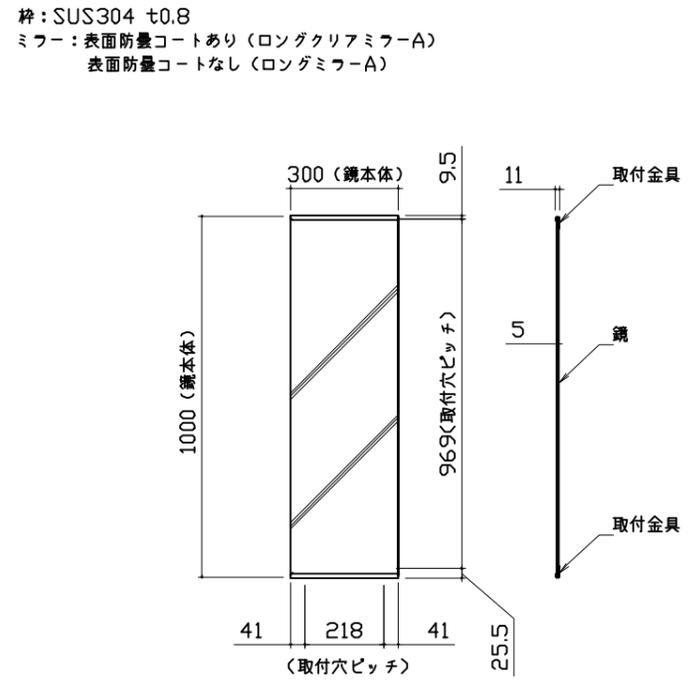


収納棚

本体：PMMA

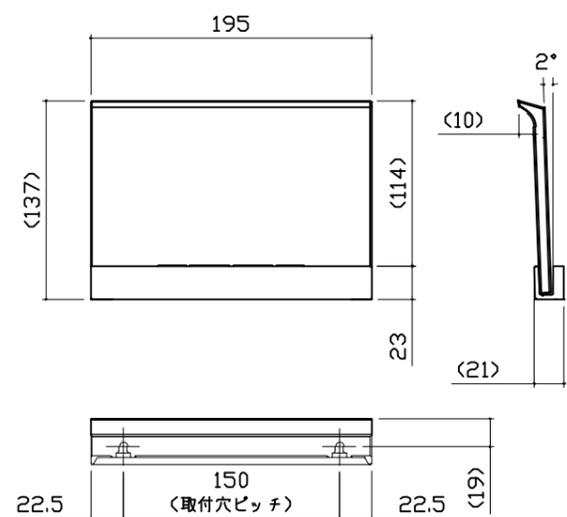


タオル掛け

本体：PMMA
ブラケット：ABS (クロムメッキ仕上げ)

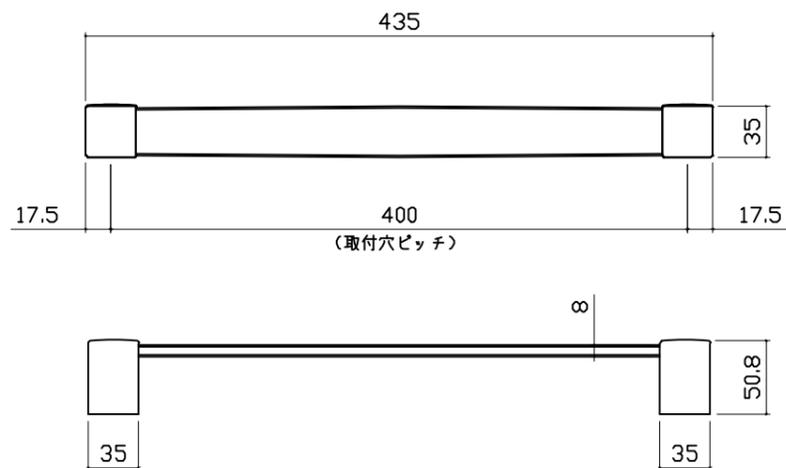


窓枠フリー


※[]寸法はそれ以下に現地加工することができます。
※末尾 E：フクビ化学工業製 NW/NG/NB：キョーセイ製
材質：窓枠本体/カバー AESコートABS ...L1512(E/NG/NB)
AASコートABS ...L1512(NW)
コーナーピース部 ABS ...<E/NW/NG/NB共通>

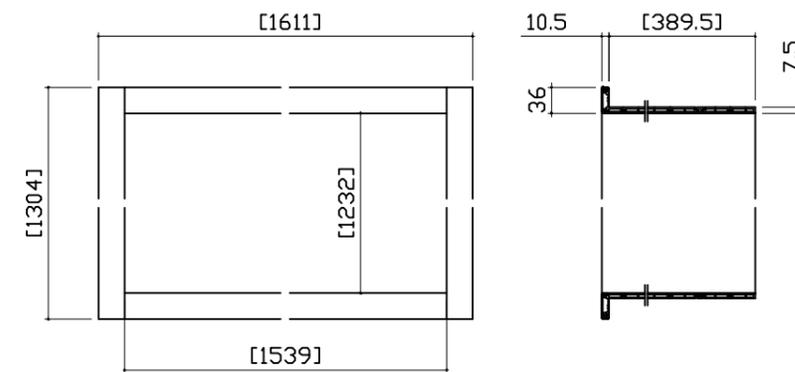


循環金具・フロアダプタ関連

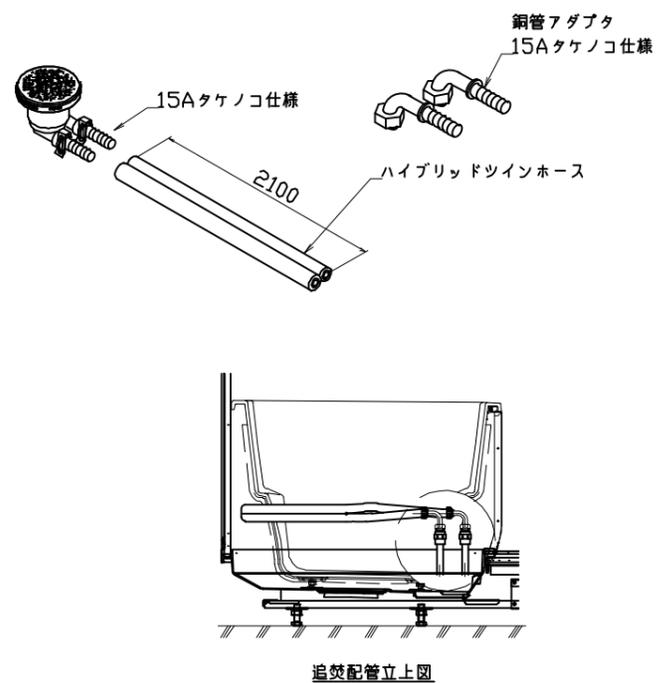


風呂蓋 7079MVA-20WS

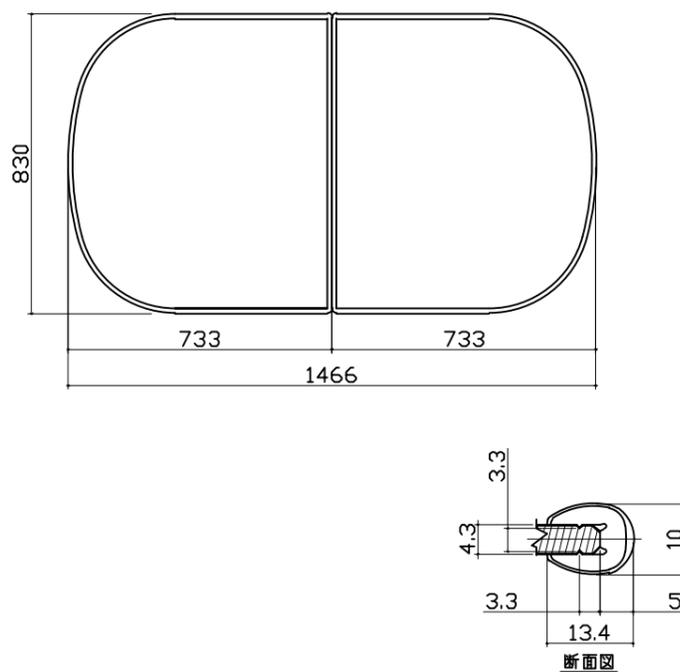

洗い場側排水トラップ

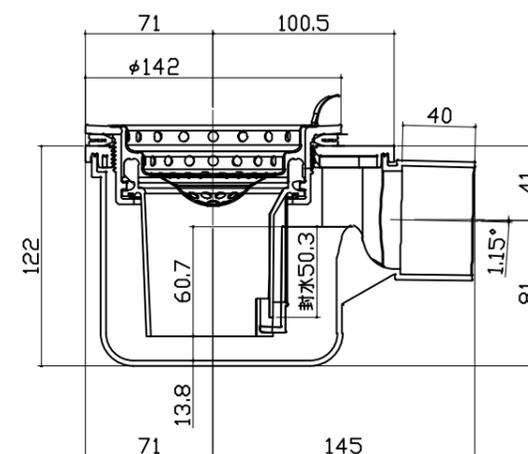


浴槽側排水トラップ

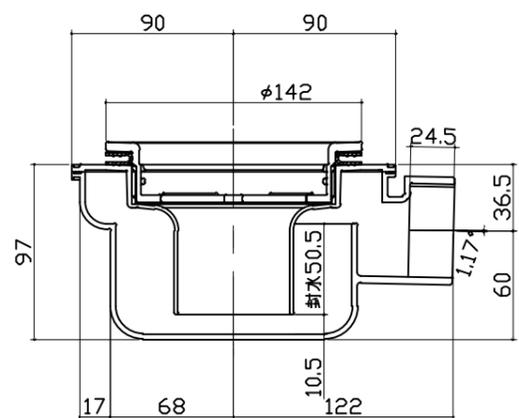

浴室テレビ①

浴室テレビ本体

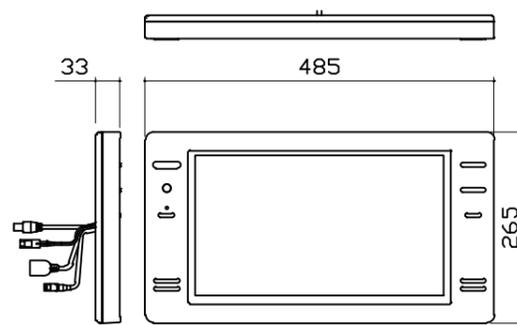


電気工事

※ツインボード製

TV本体仕様	
名称	HDMI入力・45-77型対応浴室テレビ
型式	白色:VB-BB162W(TS) 黒色:VB-BB162B(TS)
外形寸法(mm)	幅485×高さ265×奥行33
質量	モニター:2.2Kg(箱付版含まず)
使用温度範囲	0~50℃
使用湿度範囲	10~90%RH
画面サイズ	16V
スピーカー	1W+1W
映像解像度	1920 × 1080
消費電力	15W(待機時 約1.7W)
アンテナ部	F型接続
受信可能放送	地デジ、BS、CS、CATV
外部入力	あり(HDMI) 注
ミラーリング	対応可 注

注:詳細は説明書およびカタログを参照

電源ボックス



電源ボックス仕様	
名称	電源ボックス
外形寸法(mm)	幅220×高さ74×奥行70
質量	0.70kg
定格入力	AC100V
周囲温度	0~50℃

浴室テレビ②


【工事範囲】

当社工事範囲

1. 浴室テレビ本体、電源ボックスの取付
2. 電源接続ケーブルの浴室テレビ本体および電源BOXへの接続
3. アンテナケーブル、HDMIケーブルの浴室テレビへの接続
4. アンテナケーブル、HDMIケーブルの天井裏への配線(天井裏にテープ貼り)
5. 電源ボックスへのアース線の取付

電気工事業者様 工事範囲

1. 電源ボックスへ一次側100Vの接続
2. アンテナ線の配線及び接続作業
3. HDMIケーブルとHDMIコンセントの接続
4. ブレーカーと漏電遮断機の設定
5. 接地工事およびアース線の接続






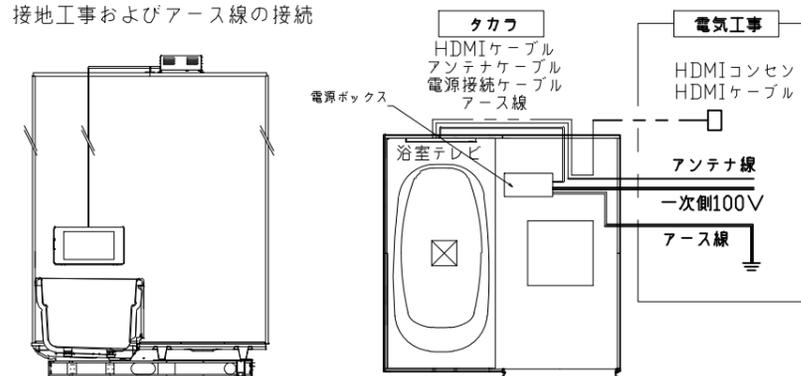


浴室テレビ③

【留意事項】

1. HDMIコンセントおよびHDMIケーブルの接続・設置は、浴室テレビ外部接続を選択された場合のみです。
2. HDMIコンセントおよびHDMIケーブルは、当社指定品(別売)をご使用ください。
3. HDMIコンセントおよびケーブルの先入れの要否について、事前に確認をお願いします。
4. 付属のアンテナケーブルは4mです。4mで長さが足りない場合には、電気工事業者様にて延長加工を行ってください。
*加工方法は設置説参照

電気工事

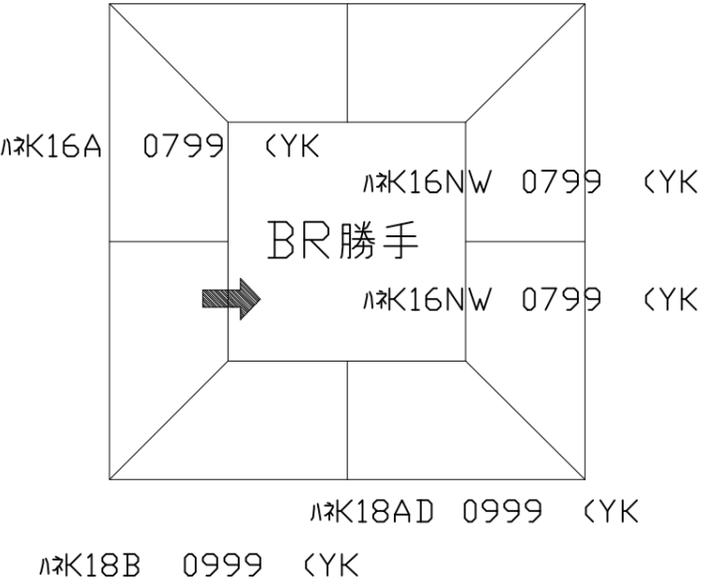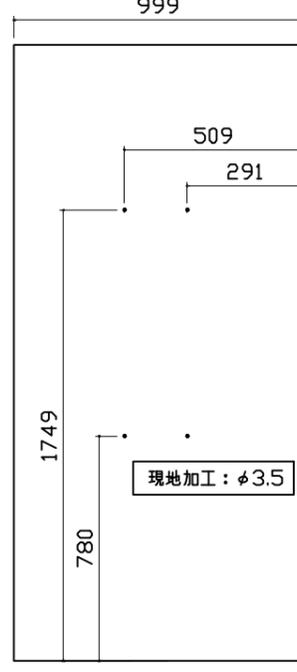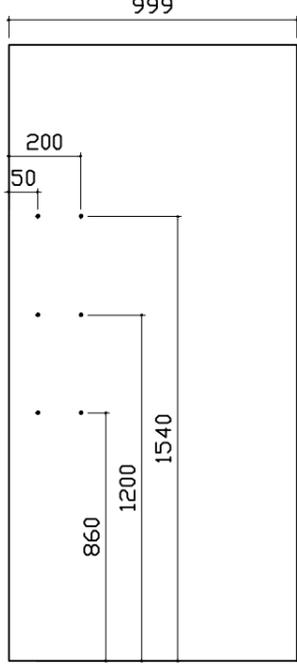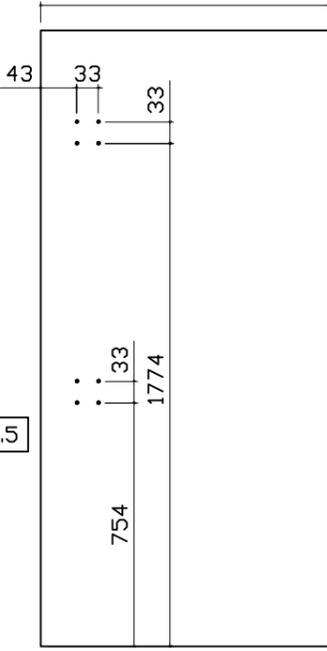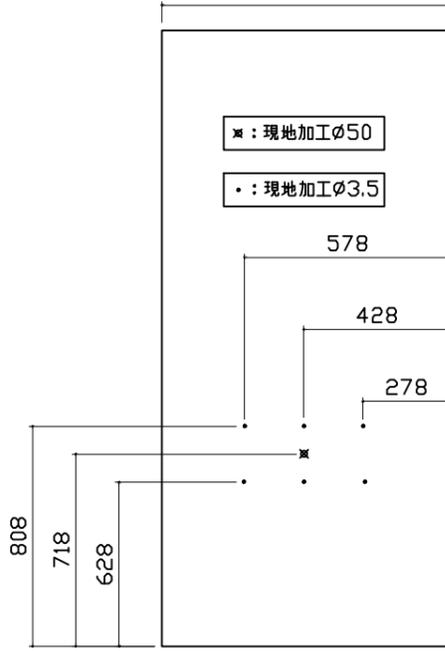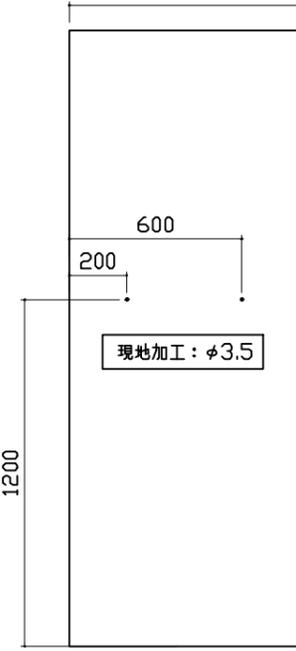パネル割図	ミラー	収納棚	
<p>パネル割図</p> <p>ハネK20C2B 0999 L<JTW</p> <p>ハネK20C1G 0999 R<JTW</p> <p>ハネK16A 0799 <YK</p> <p>ハネK16NW 0799 <YK</p> <p>ハネK16NW 0799 <YK</p> <p>BR勝手</p> <p>ハネK18AD 0999 <YK</p> <p>ハネK18B 0999 <YK</p> 	<p>ミラー</p> <p>ハネK20C2B 0999 L<JTW</p> <p>999</p> <p>509</p> <p>291</p> <p>1749</p> <p>780</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 	<p>収納棚</p> <p>ハネK20C2B 0999 L<JTW</p> <p>999</p> <p>200</p> <p>50</p> <p>860</p> <p>1200</p> <p>1540</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 	
<p>シャワーフックスライドバー</p>	<p>浴室テレビ</p>	<p>タオル掛け</p>	
<p>シャワーフックスライドバー</p> <p>ハネK20C1G 0999 R<JTW</p> <p>999</p> <p>43</p> <p>33</p> <p>33</p> <p>33</p> <p>754</p> <p>1774</p> <p>現地加工：φ3.5</p> 	<p>浴室テレビ</p> <p>ハネK20C1G 0999 R<JTW</p> <p>999</p> <p>※：現地加工φ50</p> <p>・：現地加工φ3.5</p> <p>578</p> <p>428</p> <p>278</p> <p>808</p> <p>718</p> <p>628</p> 	<p>タオル掛け</p> <p>ハネK16A 0799 <YK</p> <p>799</p> <p>600</p> <p>200</p> <p>1200</p> <p>現地加工：φ3.5</p> <p>■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。</p> 	
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 群馬-高崎SR SB4様邸</p> <p>現場番号： C2788285</p> <p>高崎営業所</p>	<p>GRANSPA グランSPA</p> <p>プラン番号： 7401A-2505-0198T</p> <p>担当営業：</p>	<p>穴開け指示図 1/1</p> <p>作成日： 2025年5月8日</p> <p>担当アドバイザー：</p>
