

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 群馬-高崎SR SB1 様

業者 様

商品名 PREDECENCIA プレデンシア

作成日 2025年5月29日
 プラン番号 7401A-2505-0204T
 現場番号 C2772236

タカラスタンダード株式会社
 ◆高崎営業所
 群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
 TEL 027-395-8001 / FAX 027-370-0007

◆高崎ショールーム
 TEL 027-395-8000 / FAX 027-363-1000

商品
 御見積金額 **¥2,061,000** (税込 ¥2,267,100)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥199,000** (税込 ¥218,900)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランベージュ
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	プレシャスホワイト
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	クォーツストーン
カウンター/下カバーカラー	ブランソルベ / ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ブランソルベ
エプロン材質/カラー	ステンレス / ベージュ
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	パールミルフィュー
パネルカラー(周辺)	ツイードベージュ
ガス種 / 周波数	LPG / 50Hz

◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		河合

◆ 備考

No.*

御名前 群馬-高崎SR SB1

様

現場番号	C2772236	プラン番号	7401A-2505-0204T	作成日	2025/5/29
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1620サイズ		1	1,306,000	1,306,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	3枚引戸<1400幅>(グレー)/樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+83,500	+83,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	洗い場	キーブクリーンフロア(プレミアムクラス・グランページュ)	1	+20,000	+20,000
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(プレシャスホワイト)	1		
8	浴槽追焚き穴	あり	1		
9	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)(ページュ)	1		
10	浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)	1		
11	ヘルシージェット	なし	1		
12	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
13	うるぽか湯	なし	1		
14	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
15	洗い場用水栓	プッシュ式水栓:樹脂製ホース(メタル調)SB280	1	+71,000	+71,000
16	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド(節水+手元止水)	1		
17	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
18	カウンター	クォーツストーンカウンター	1	+138,000	+138,000
19	カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター	1	+138,000	+138,000
20	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
21	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインプレミアム)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
23	天井	カラーフラット天井(ページュ)	1		
24	換気機器	浴室暖房乾燥機(200V)ホワイト	1	+89,000	+89,000
25	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付)	1	+70,000	+70,000
28	天井照明開口	工場開口	1		
29	ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応)	1	+31,000	+31,000
30	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
31	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-4,000	-4,000

御名前 群馬-高崎SR SB1 様

現場番号	C2772236	プラン番号	7401A-2505-0204T	作成日	2025/5/29
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	クリアタイプ クリア(2段)	1	-4,000	-4,000
33	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
34	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
35	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			35		¥2,061,000
商品総合計			35		¥2,061,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥199,000 (税込 ¥218,900)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

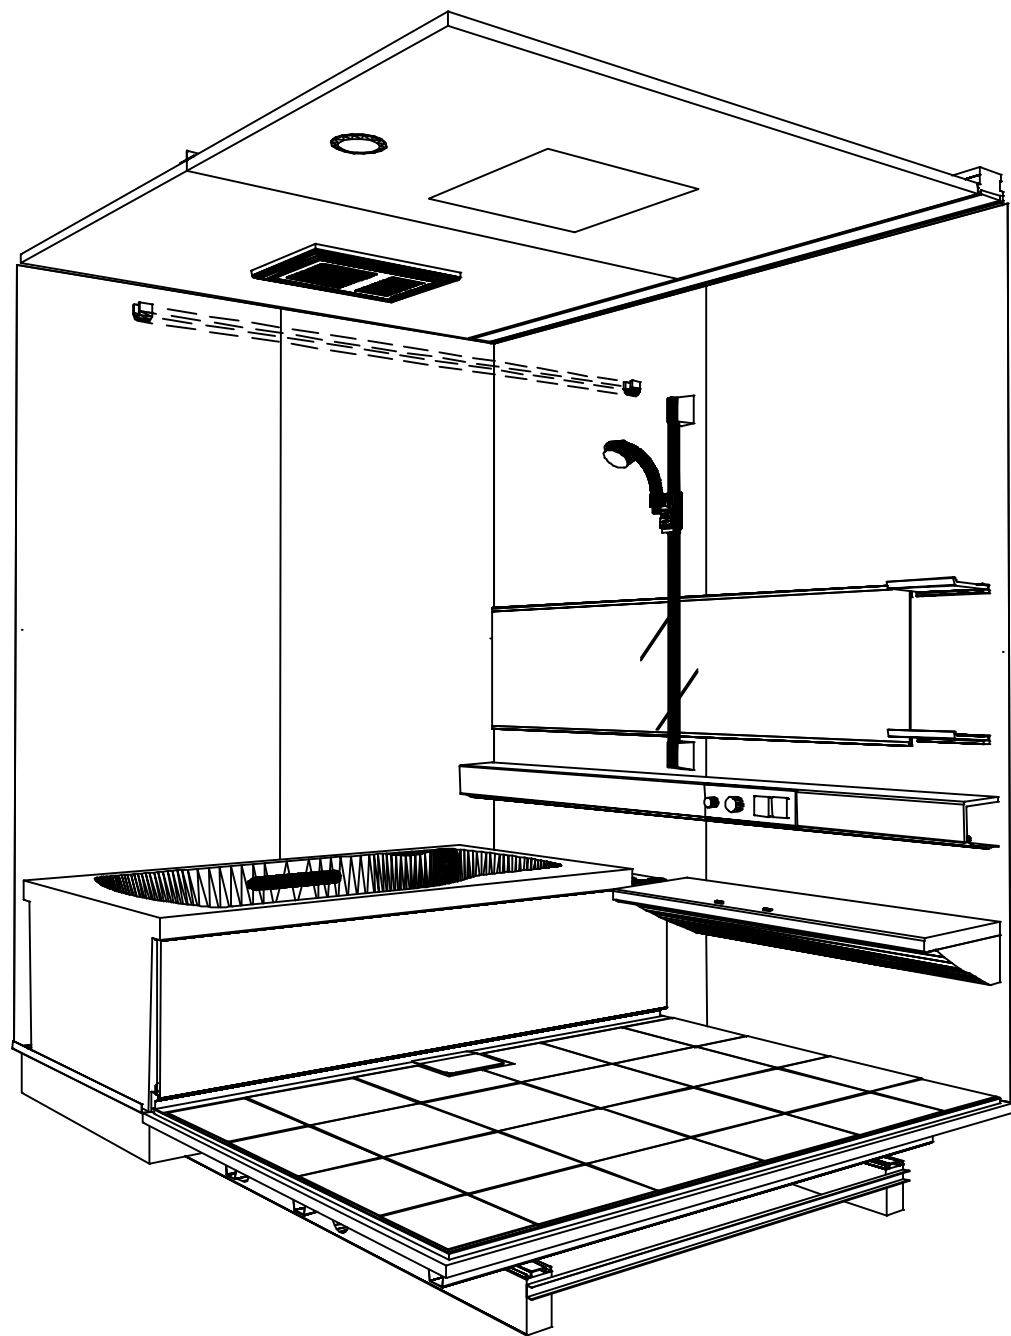

鳥瞰図

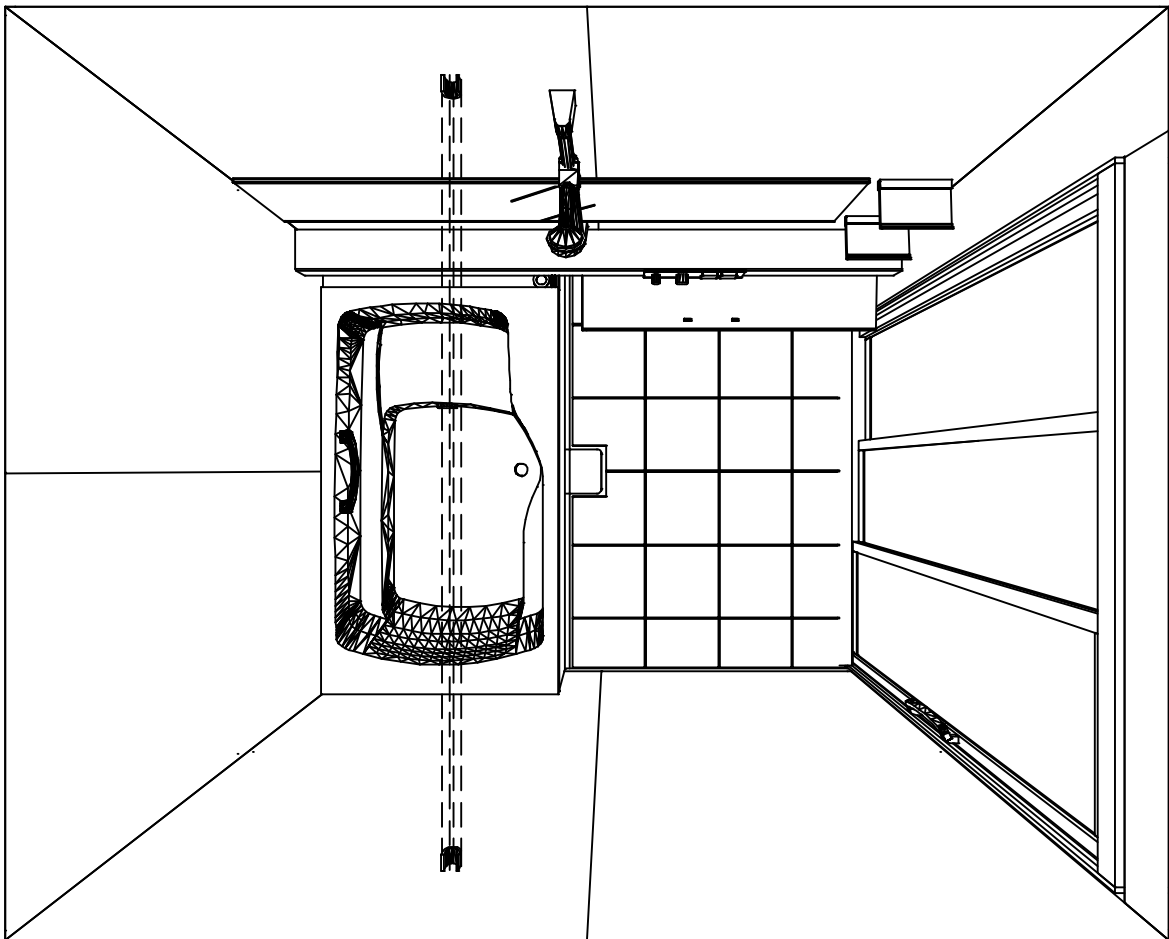

1620

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、200Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。


カウンター面

浴槽側面



洗場側面

カウンター対面

■留意事項
*印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

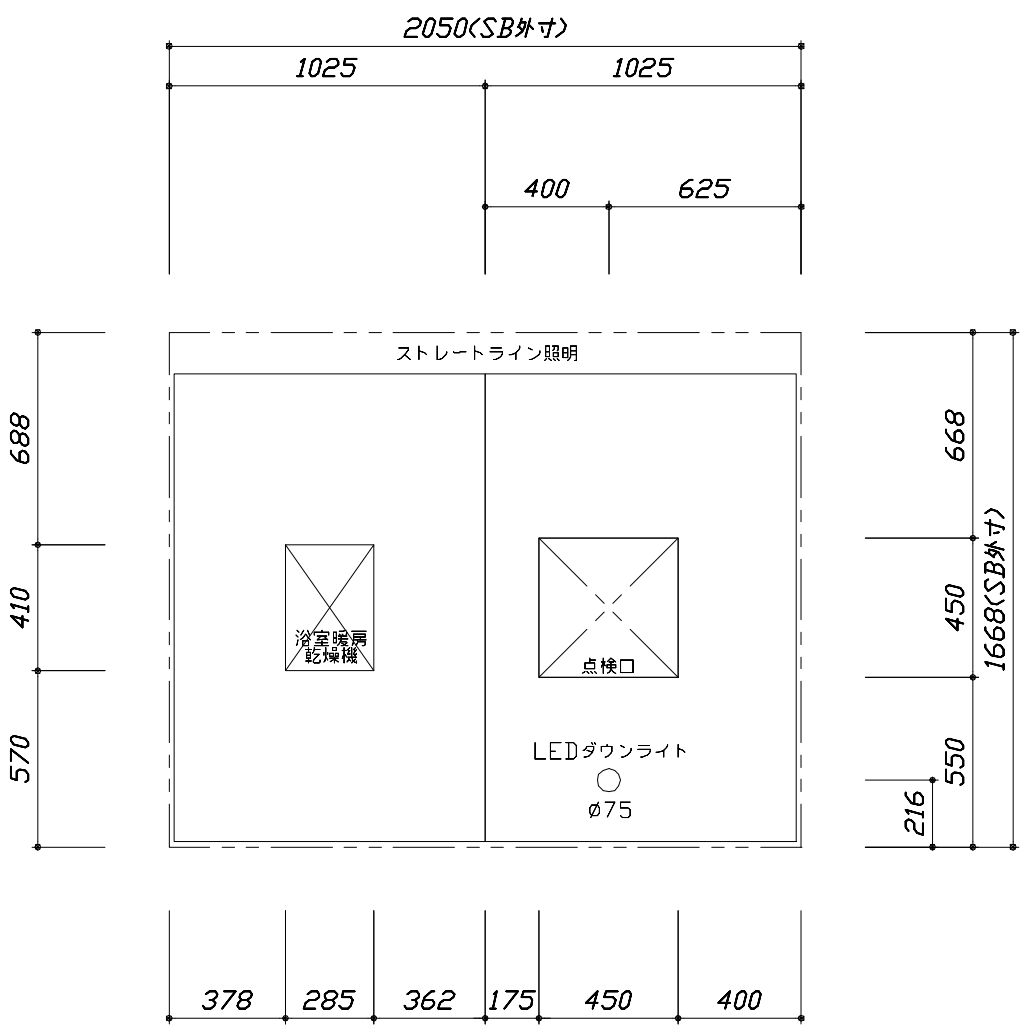




<天井伏図>

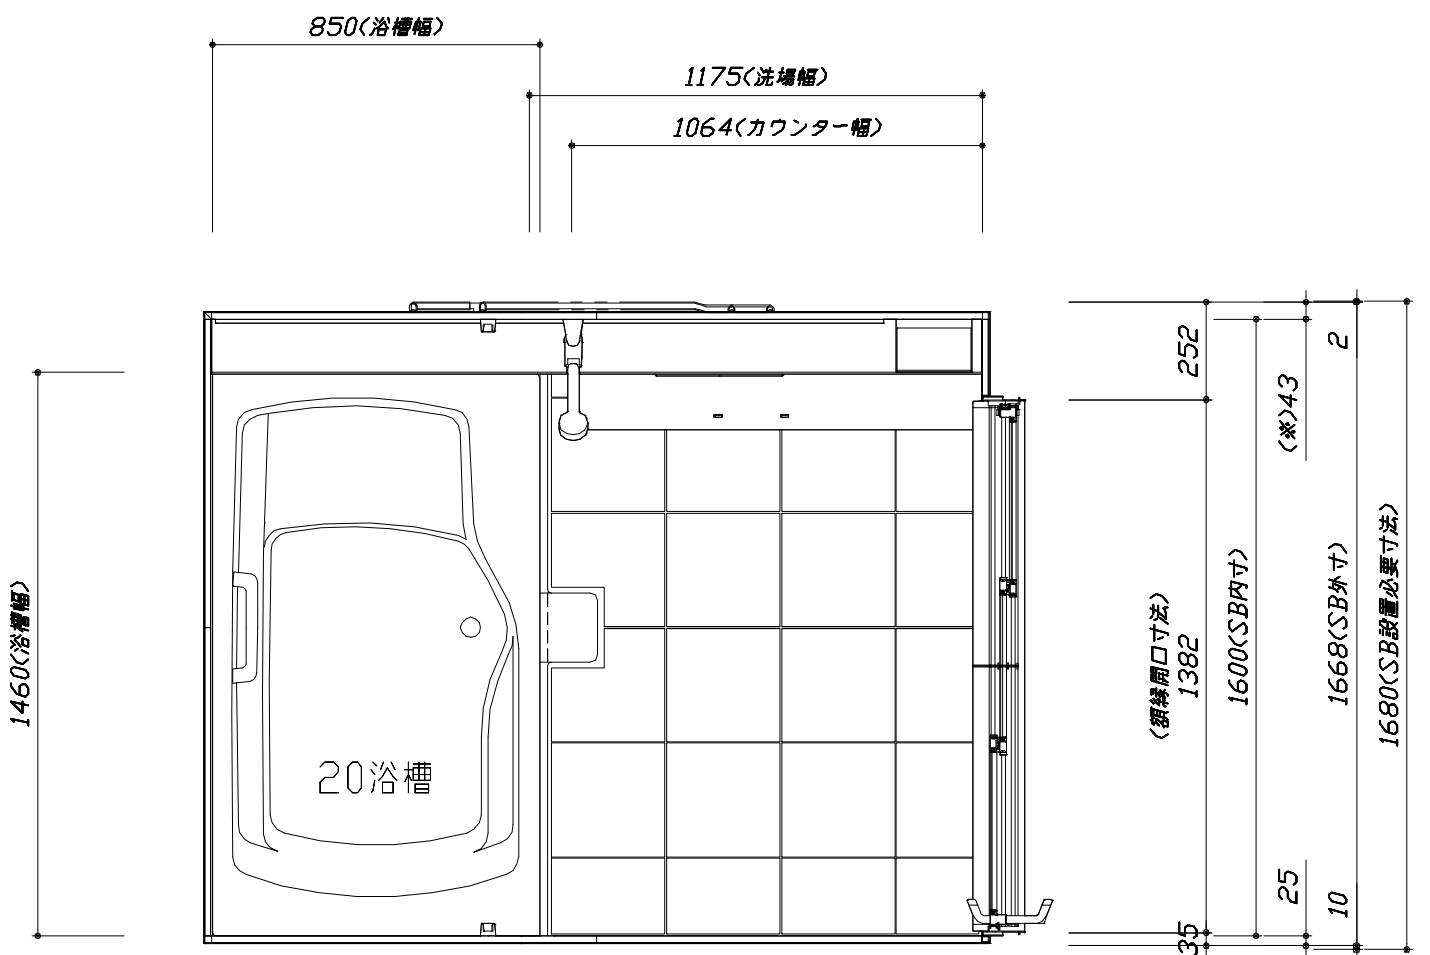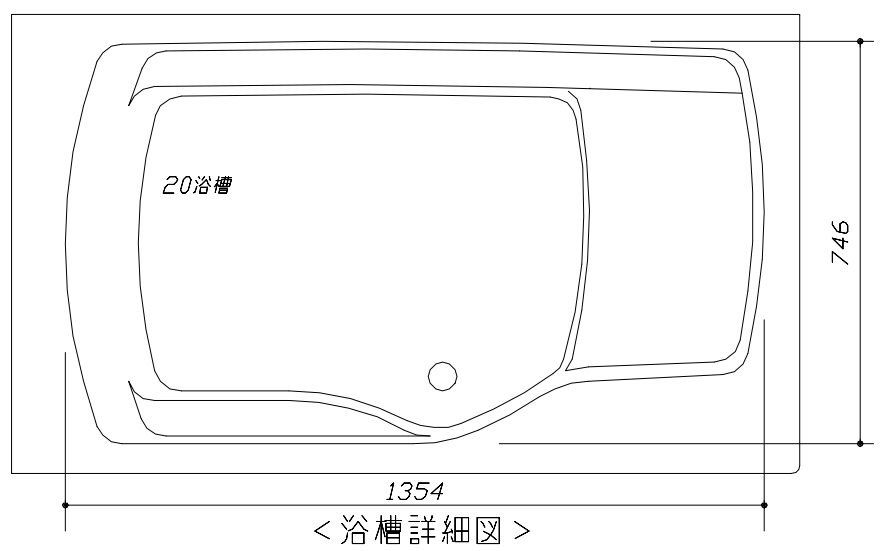

<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

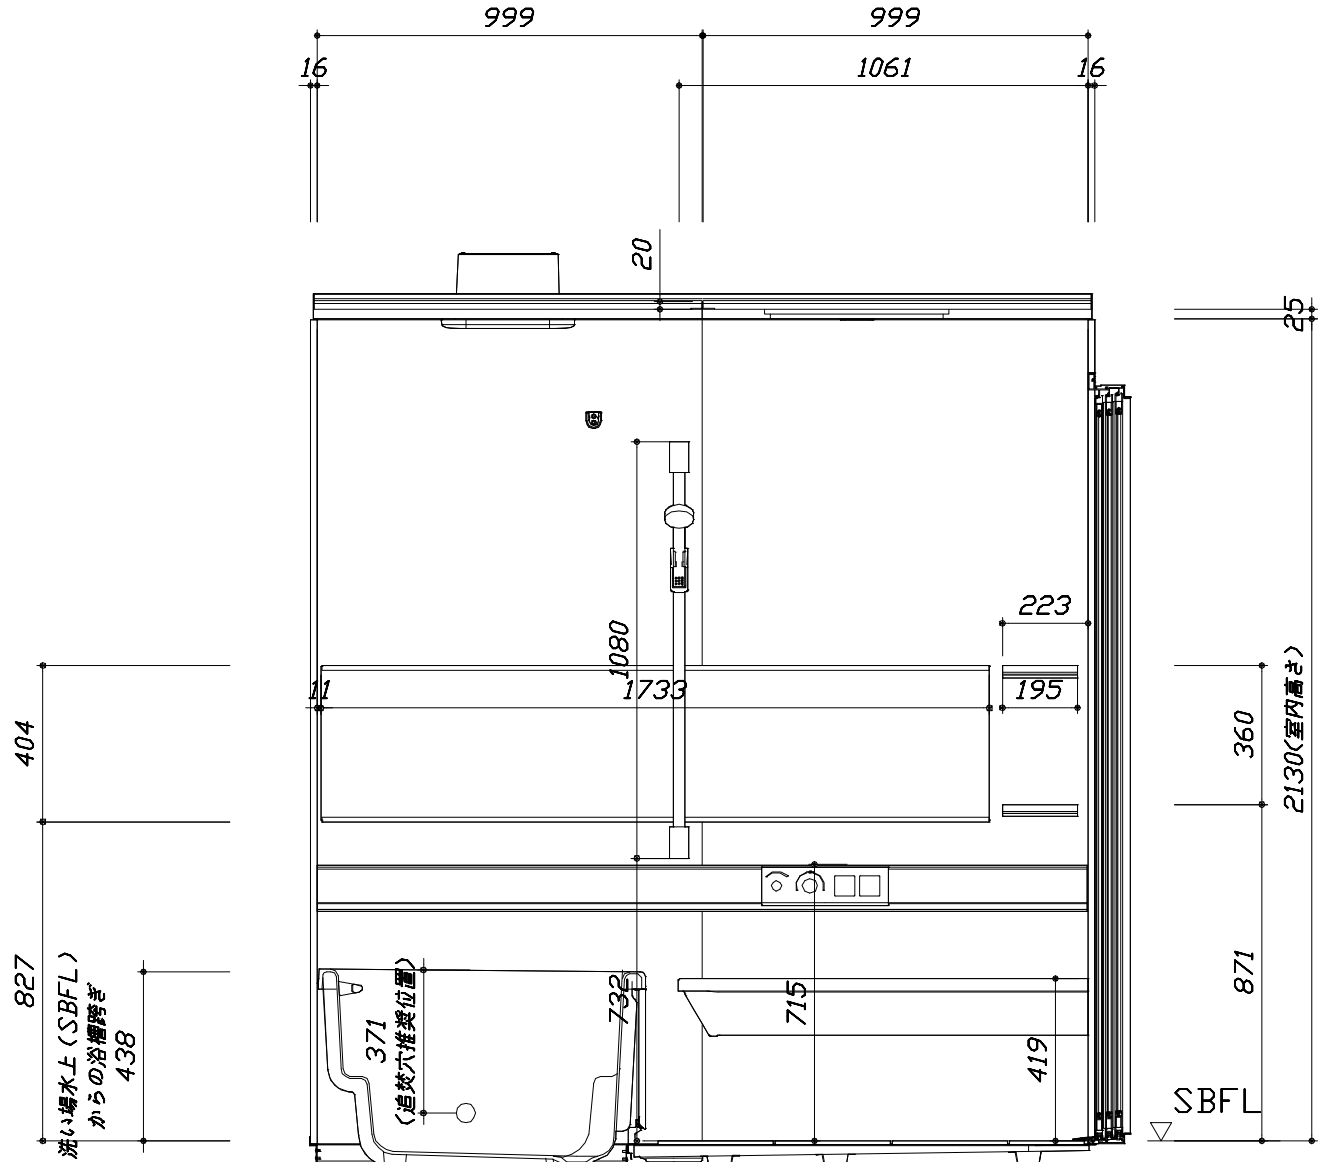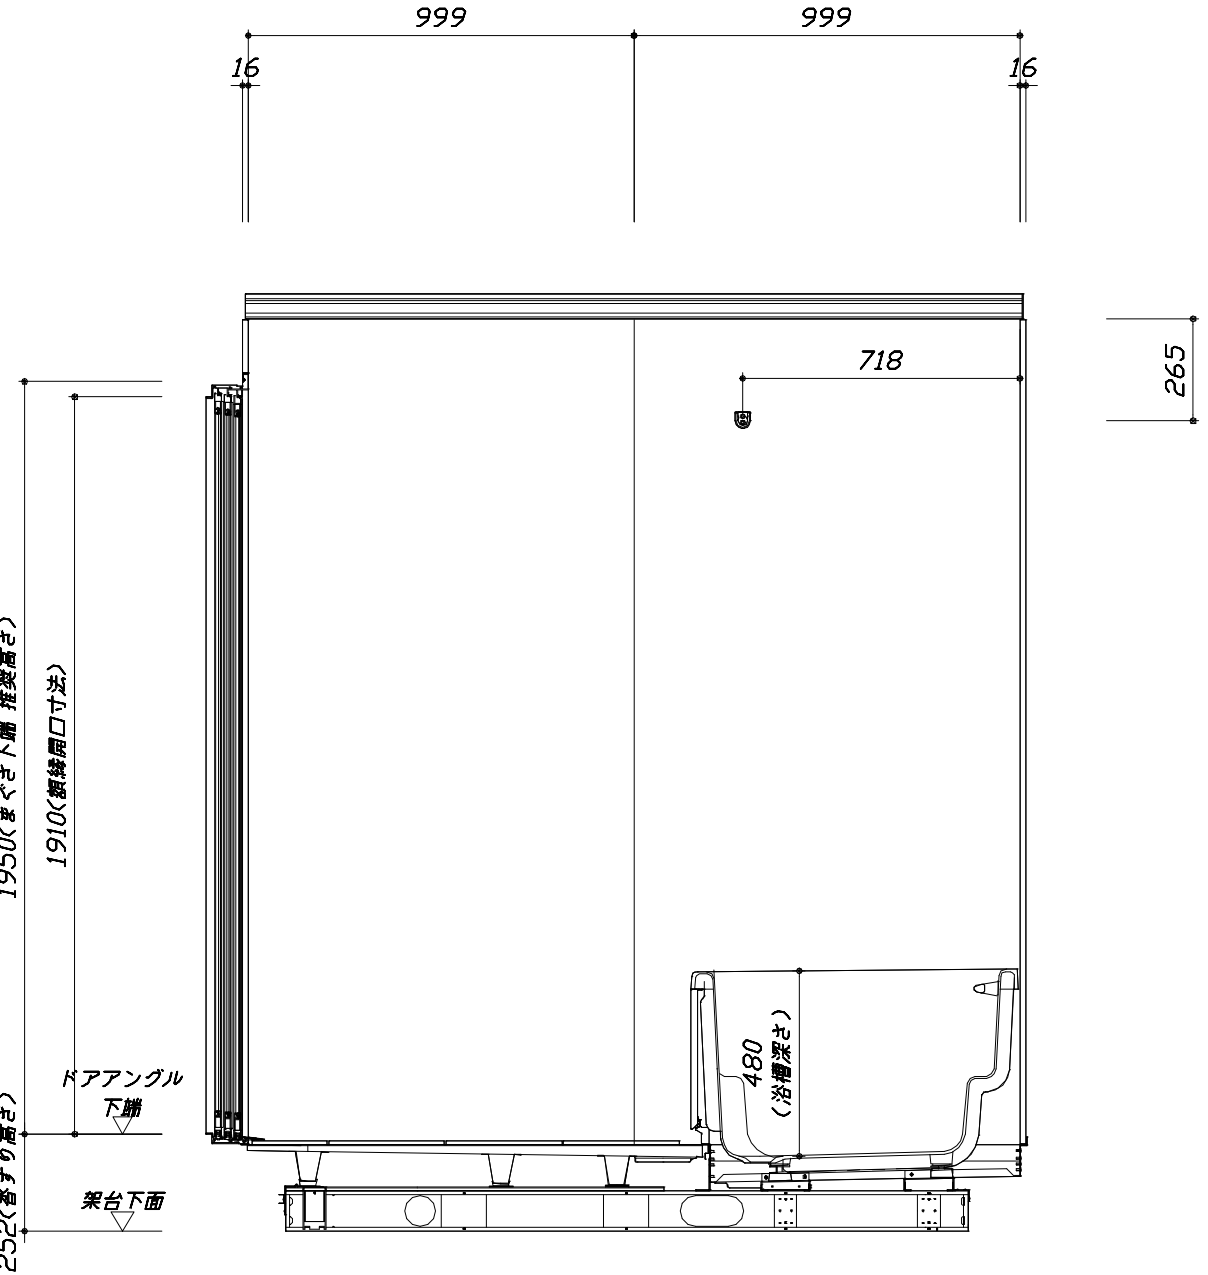


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

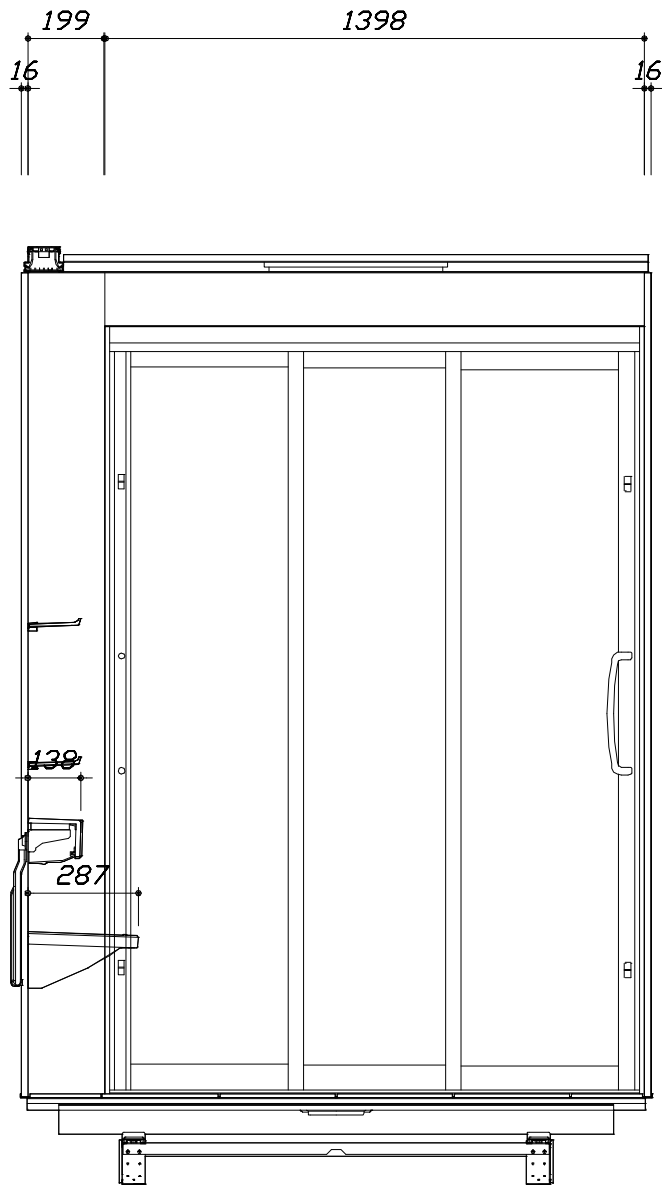

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

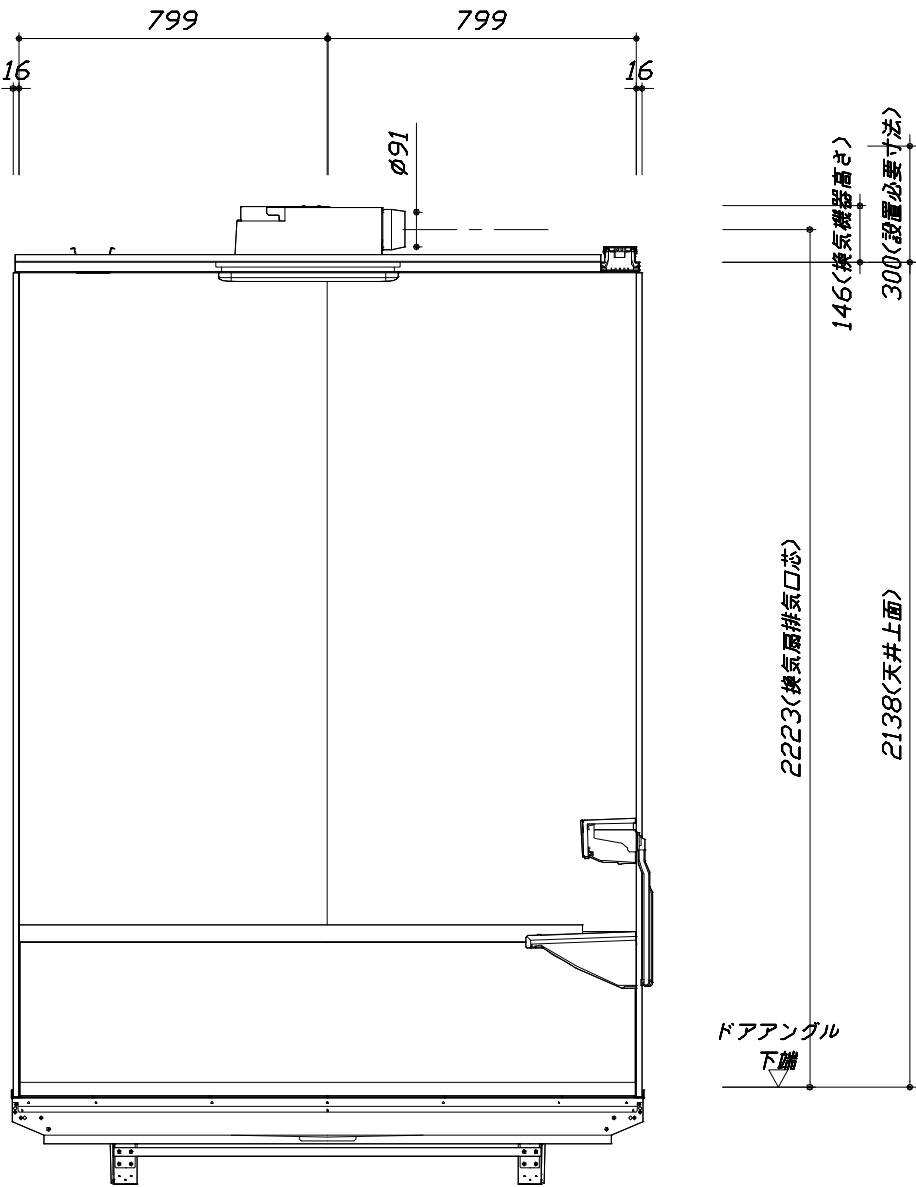

< 浴槽側面図 >

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	鋳物ホーロー 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付) グリップ付（305リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	クォーツストーンデュアルカウンター：クォーツストーン カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ3枚引戸(アルミ框/樹脂ガラス/ﾀﾅﾍﾞ型換気口)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：ＡＢＳ樹脂， 浴槽：ＡＳＡ樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	505kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ワイドクリアミラー(収納棚対応) くもり止め加工
収納棚	クリアタイプ：アクリル樹脂製（2段）
タオル掛け	－
洗場側水栓	プッシュ式・サーモスタット(SB280RABNS(H))（樹脂ホース：メタル調）
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（スライドバー-T1020S MH）
照明	ストレーライン照明（LED 23.7W調光・調色機能付）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(200V・最大消費電力2230W) (ﾀﾞｲｱﾐｰﾀﾞ 外径φ98)（常時換気対応品）ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WP：プレシヤスホワイト
カウンター	H：ブランソルベ
パネル(カウンター面)	JDN：パールミルフィーユ
パネル(周辺・3面)	JDT：ツイードベージュ
水栓上部カウンター	－
浴槽エプロン	D：ベージュ
洗場	PD：グランベージュ
ドア / 天井	G：グレー / D：ベージュ
収納棚	クリアタイプ(クリア)
タオル掛け	－
ランドリーセット	ホワイト

Takara standard タカラストانダード株式会社	現場名称： 群馬－高崎SR SB1様邸	PREDENCIA プレデンシア	仕様表	
	現場番号： C2772236	プラン番号： 7401A-2505-0204T	作成日： 2025年5月29日	
	高崎営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分			参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』								
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事				建設工事外		作業内容	
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備		シ ス テ ム バ ス 設 置
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○					浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事	
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○				建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事	
		管	給排水配管事前工事				○			浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事	
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○		浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工	
			給湯機器専用配管事前工事				○		□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事	
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事	
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置						□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置	
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査			
設置後工事	1 2 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○			建築壁の躯体加工作業	
			排気ダクトの敷設工事				○			浴室換気機器のダクト敷設工事	
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○			建築側ダクトと換気機器の接続、検査	
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事	
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○		建築の外装仕上げ工事	
	4 5 6	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査	
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査	
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□	機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）	
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○		○				床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事	
浴室用電源配線、接続工事							○		浴室機器の事後電気工事		
浴室天井裏の電源、スイッチ工事							○		浴室全体の電気器具、配線接続工事		

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

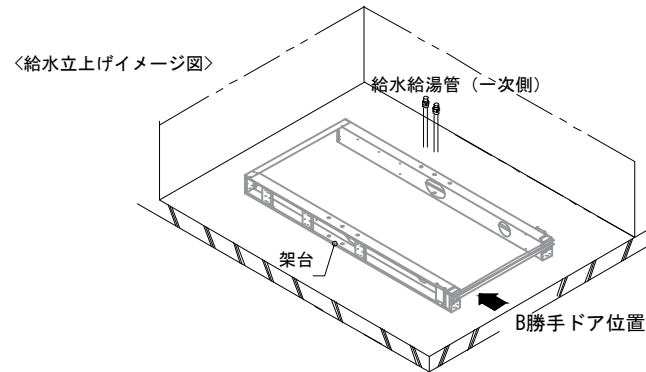

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



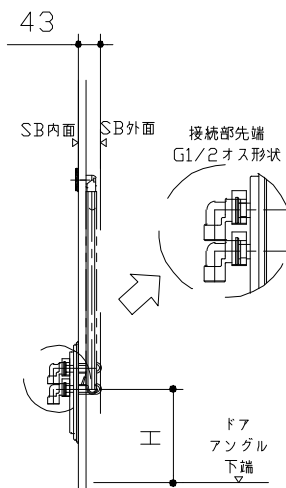
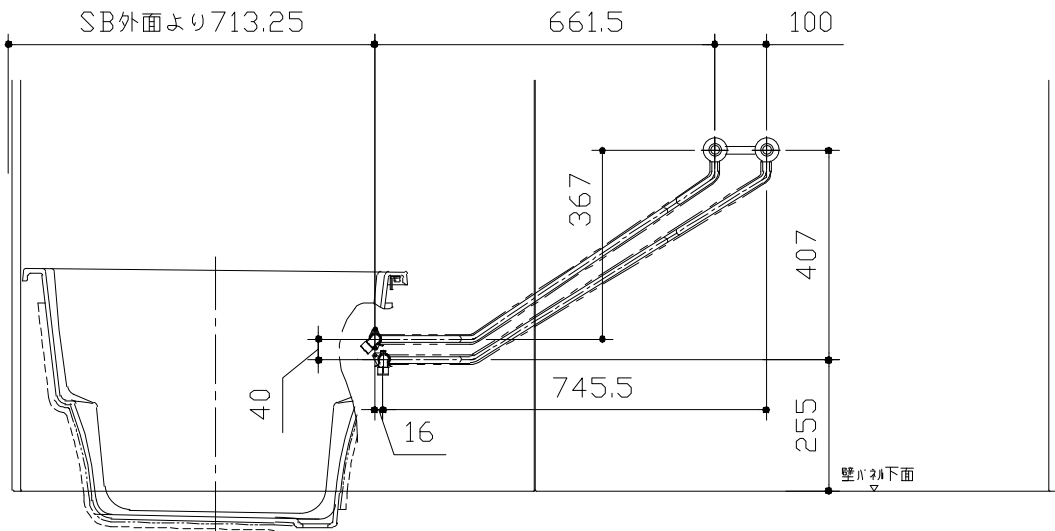


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

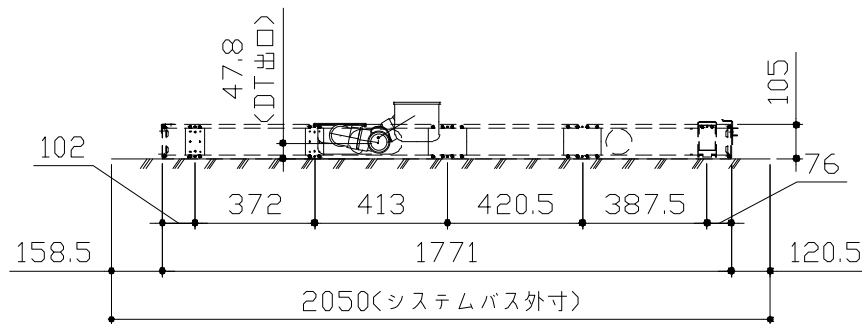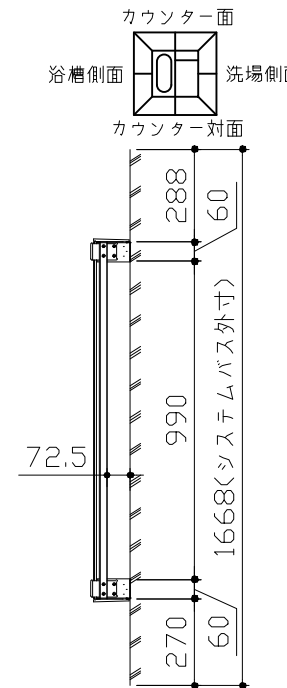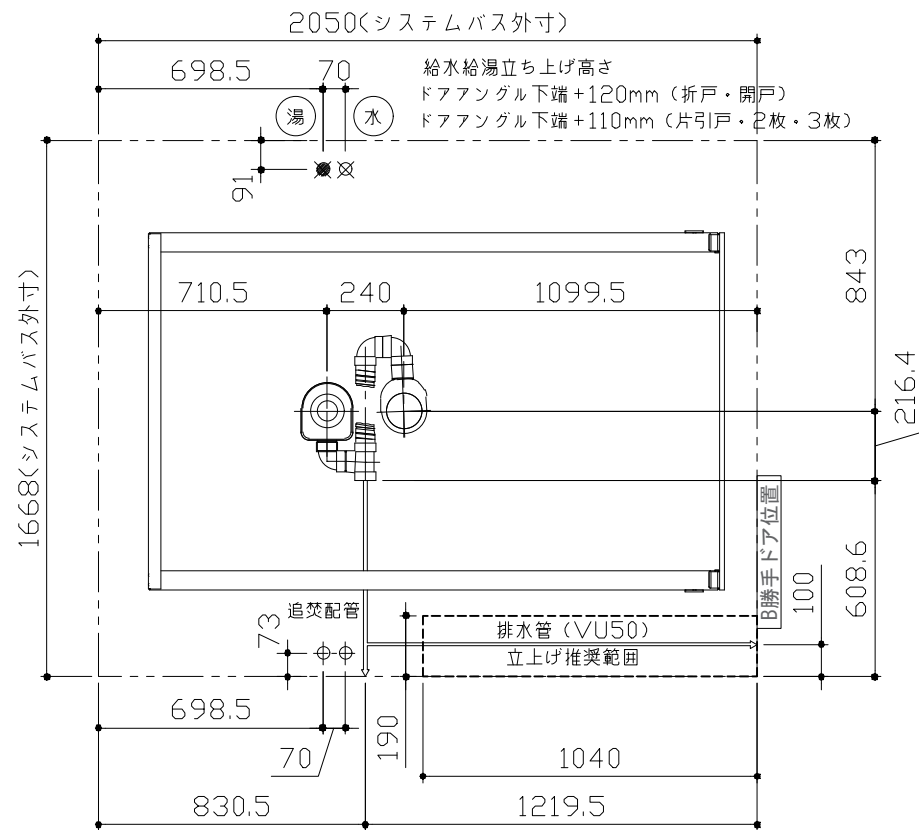

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞



■必ずご確認ください

(1) 図面の見方


- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

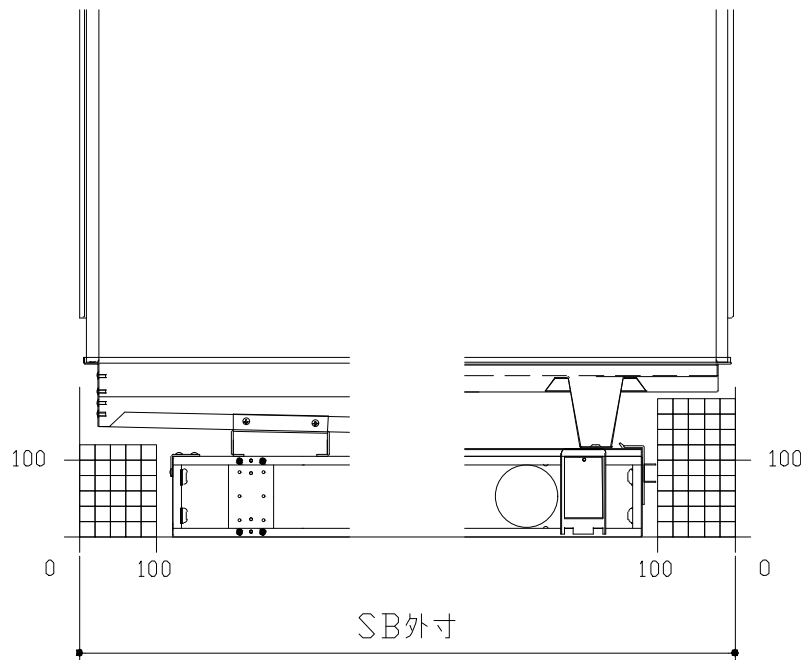


A矢視

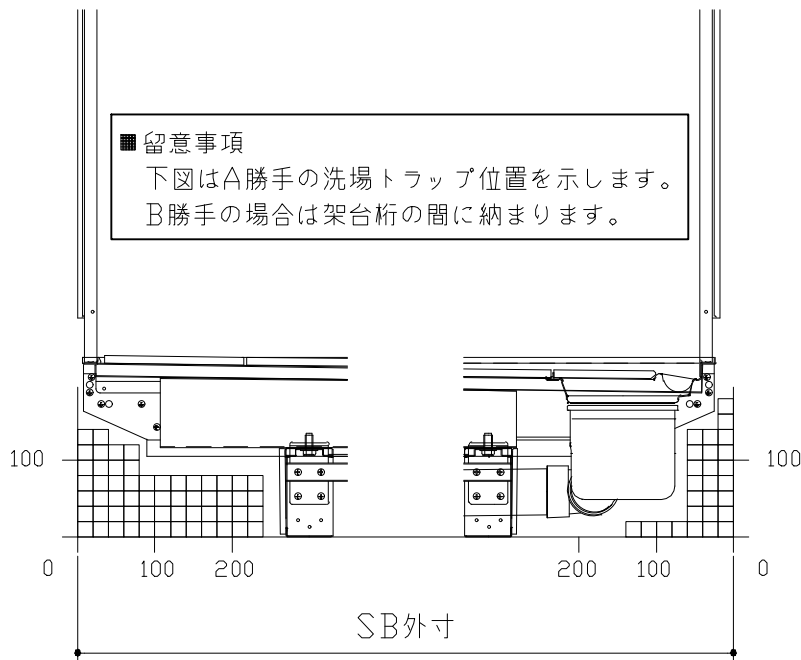


B矢視

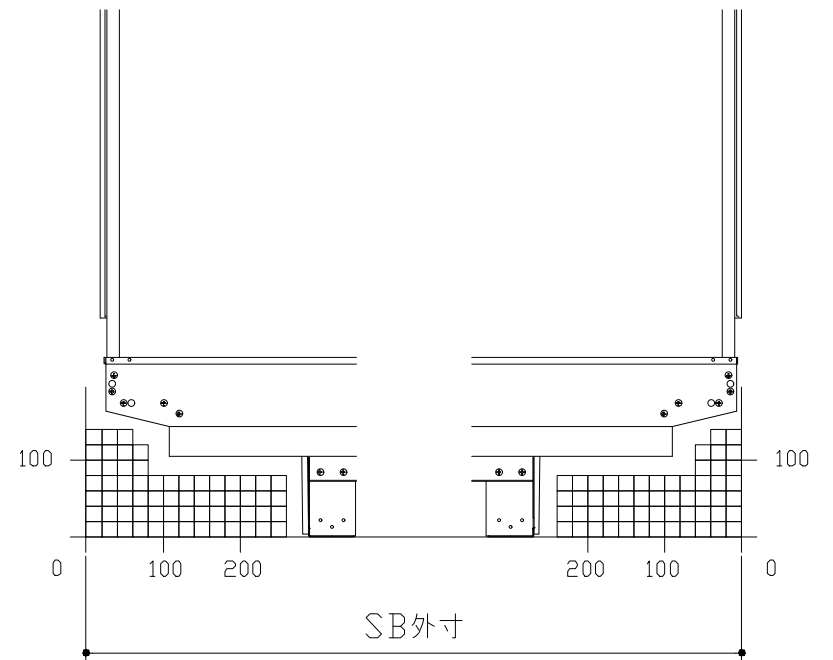


C矢視

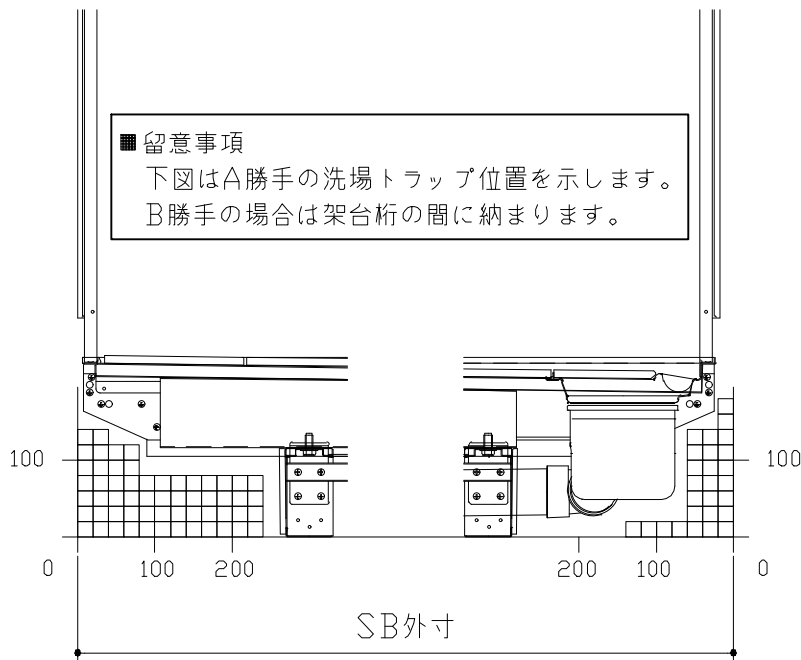

D矢視


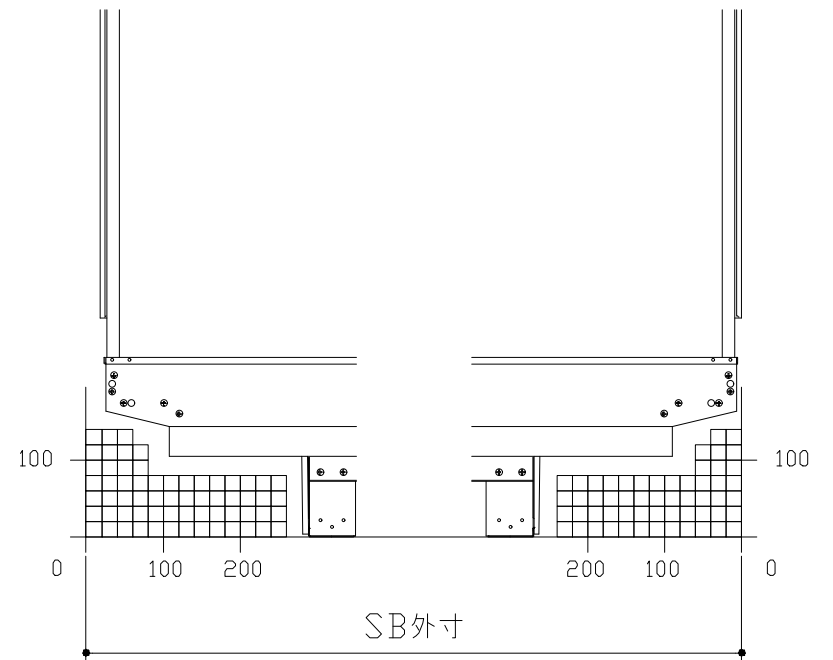



E矢視






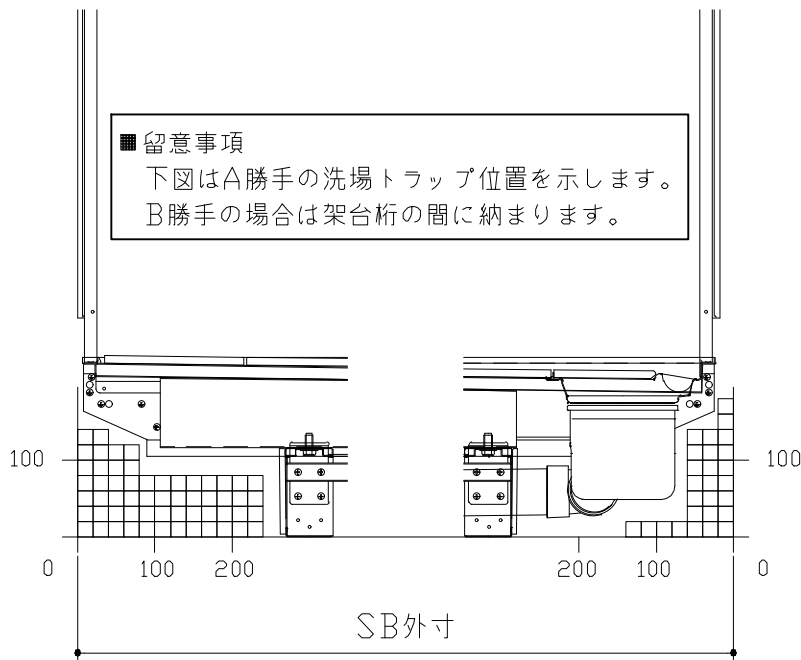







F矢視

キープクリーンドア：3枚引戸・タテ型換気口

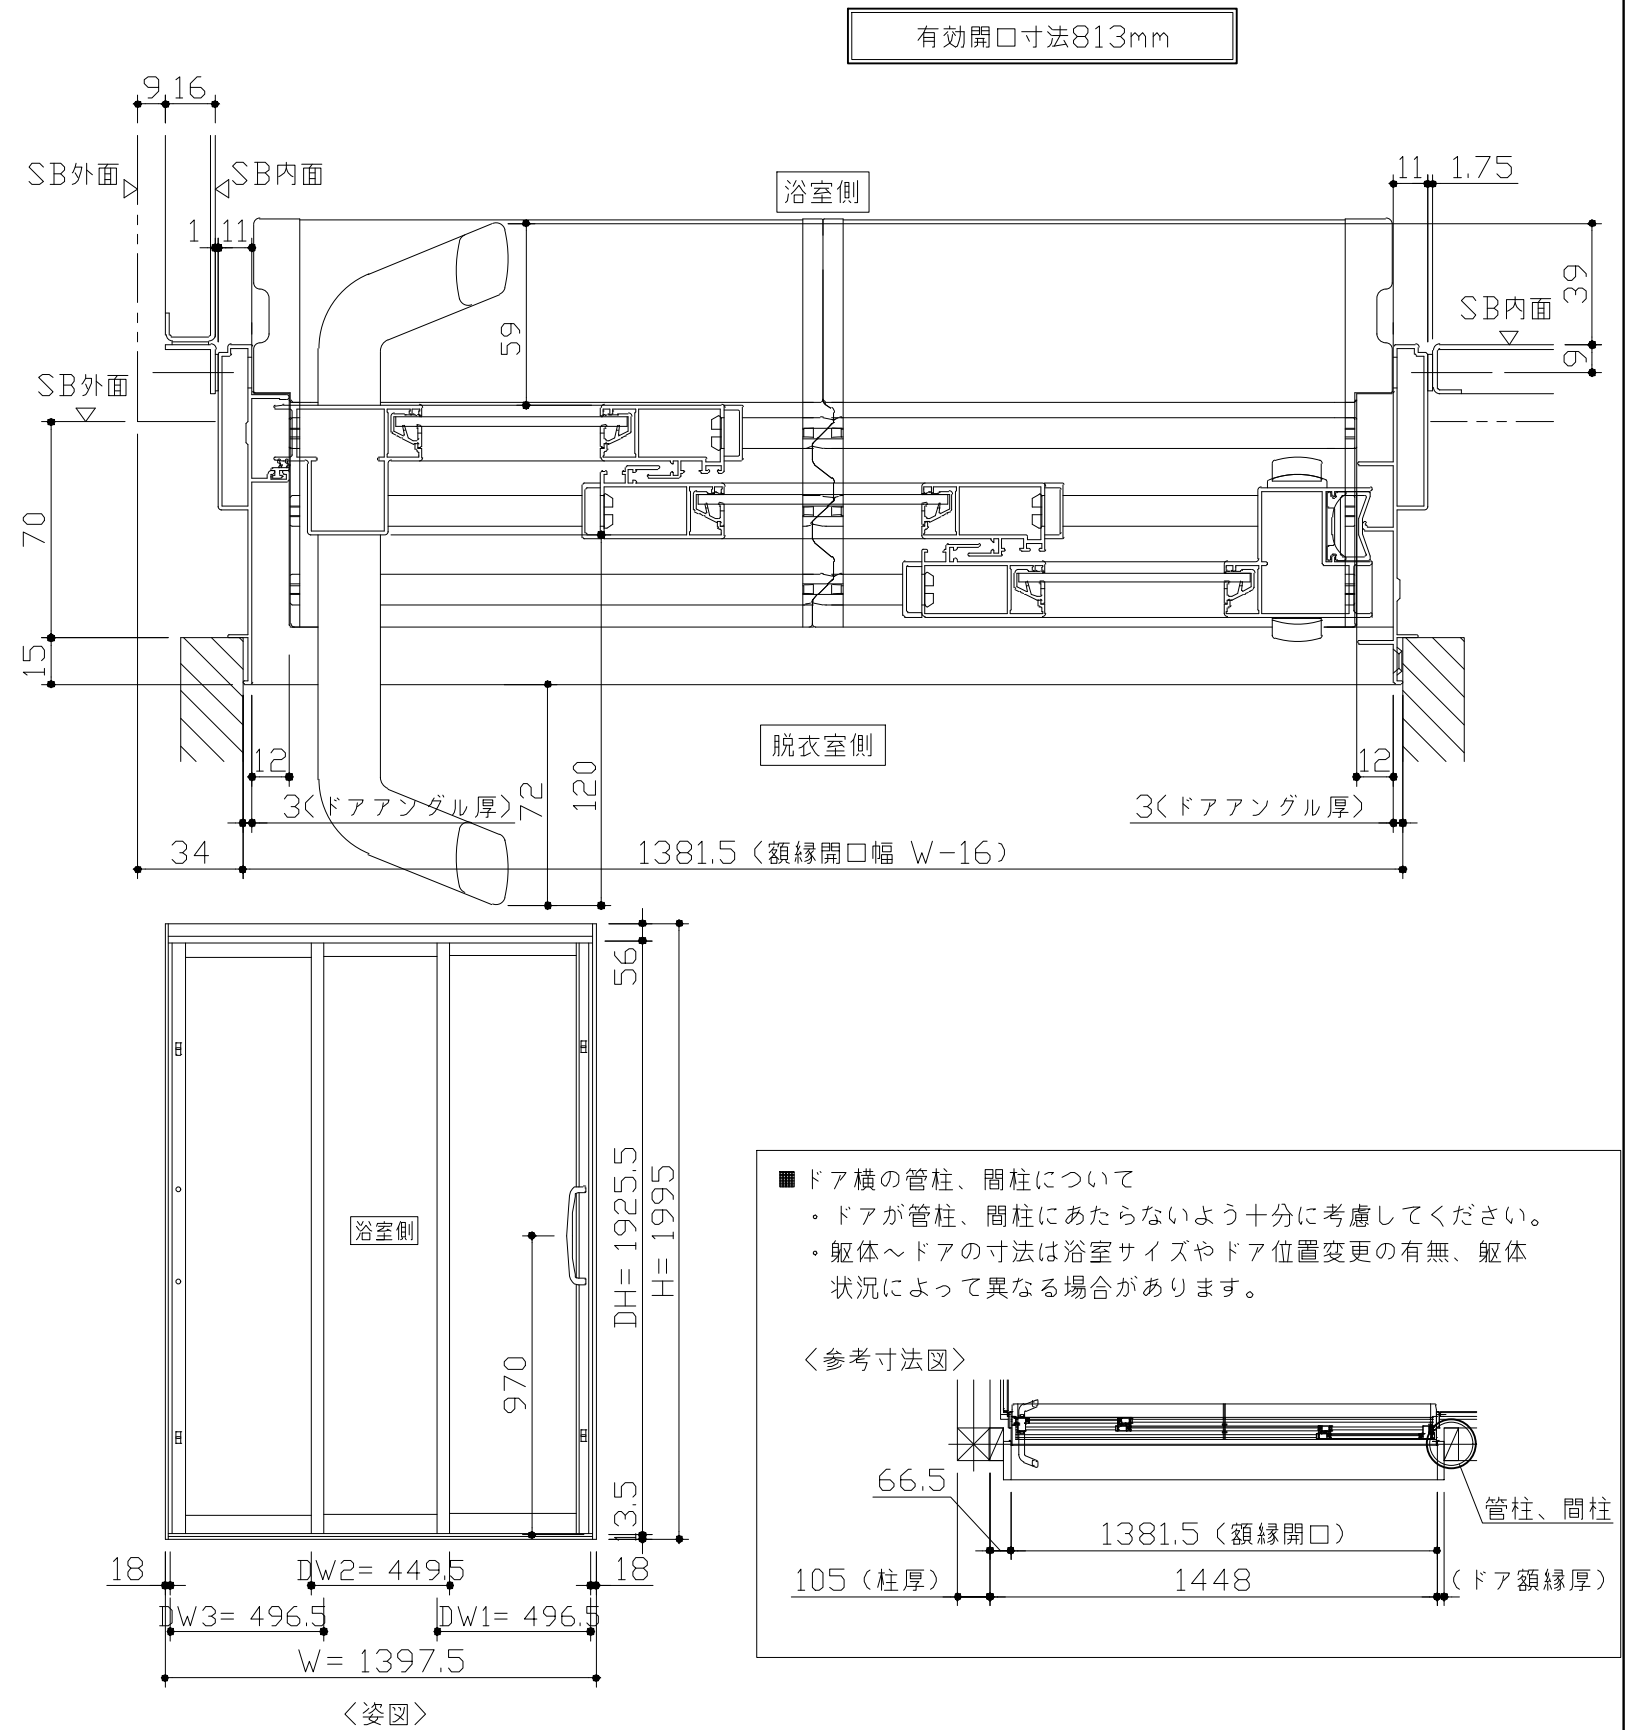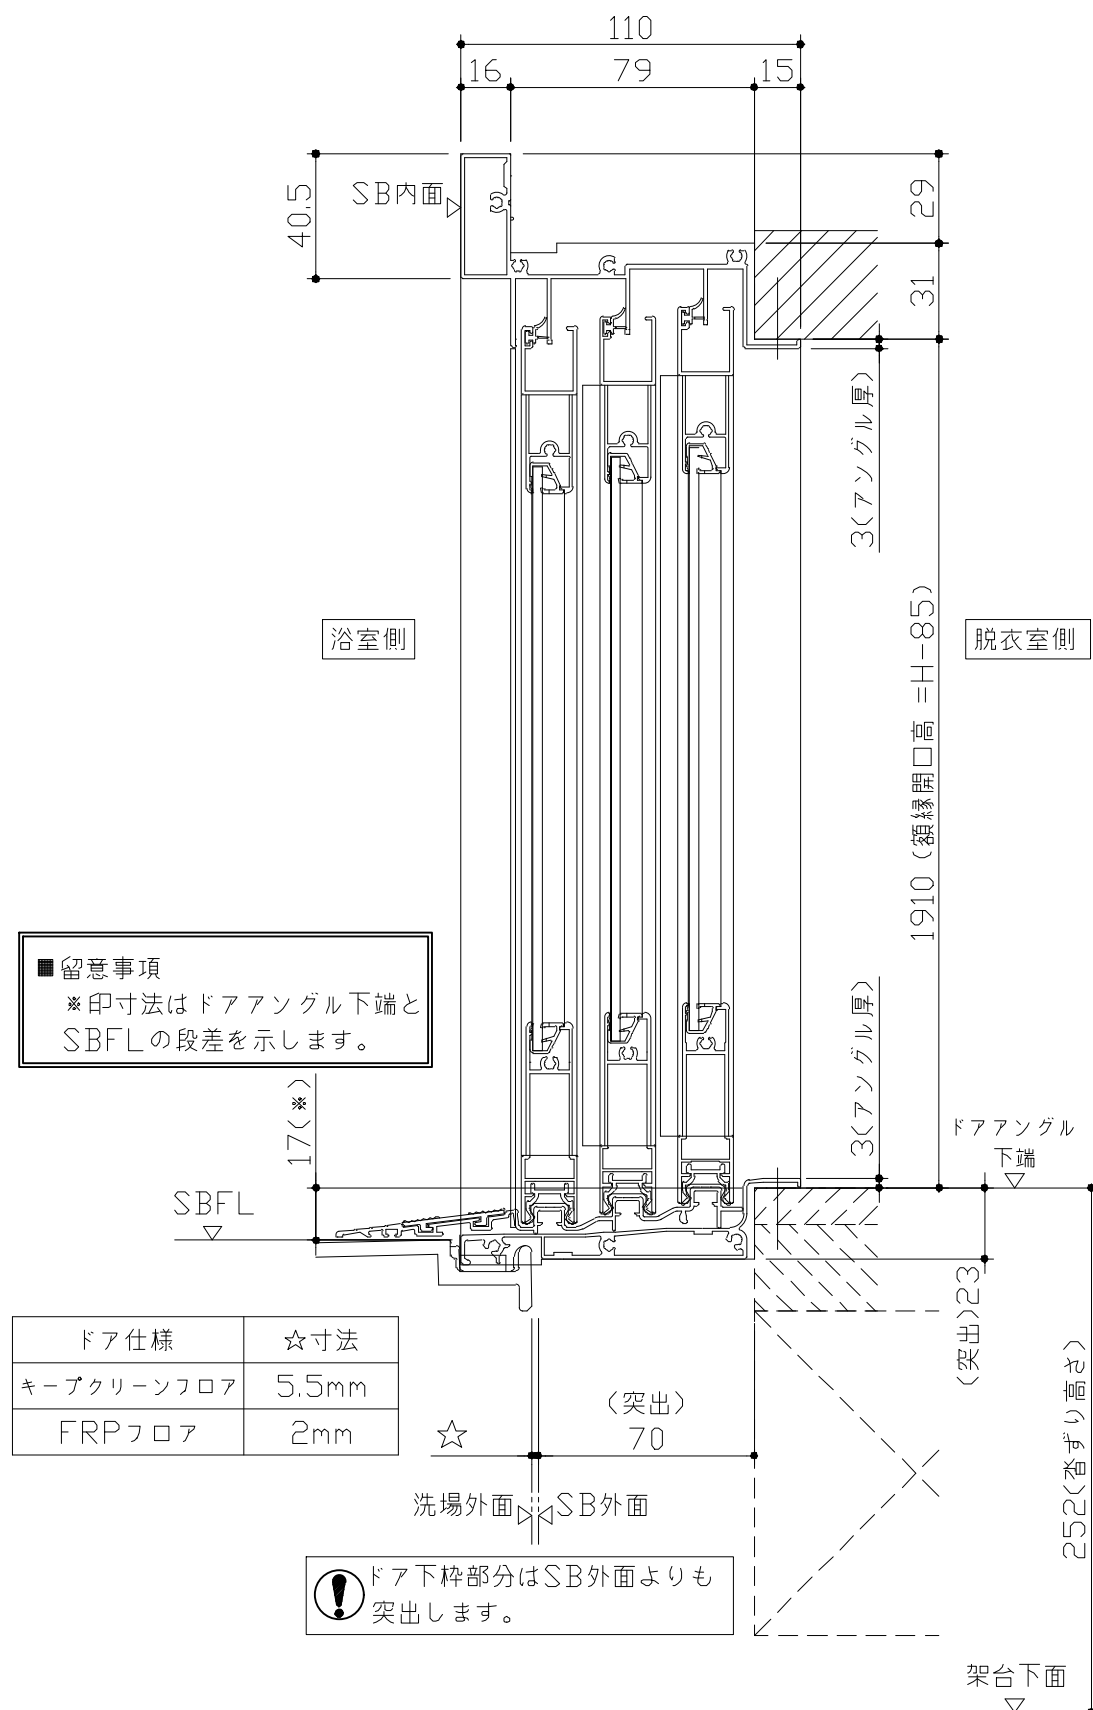



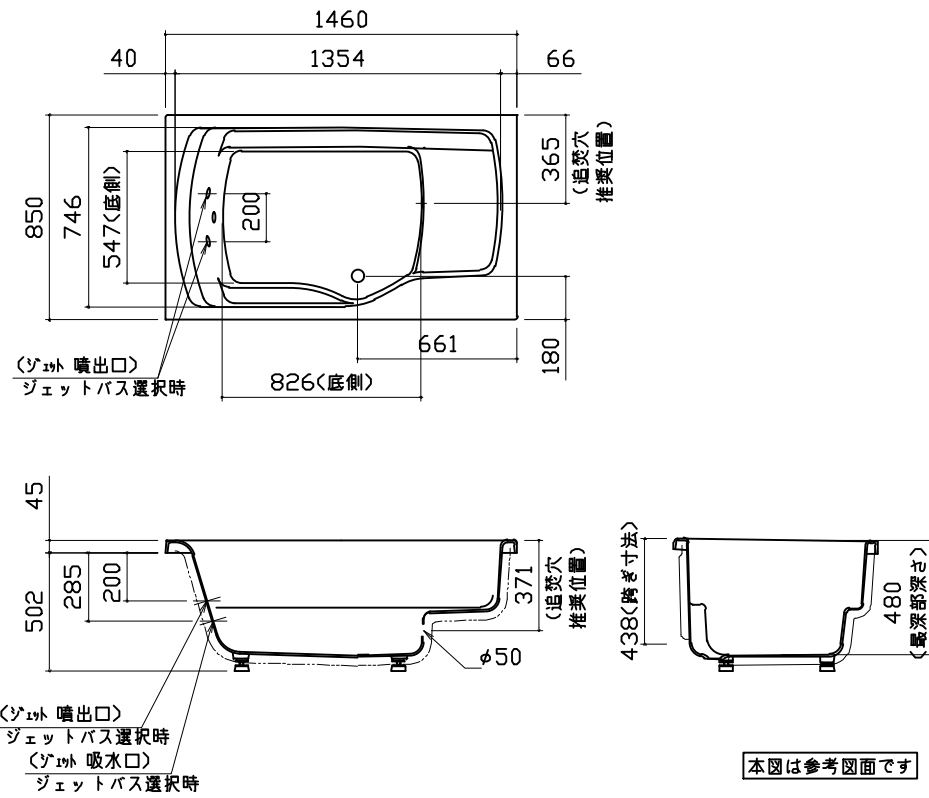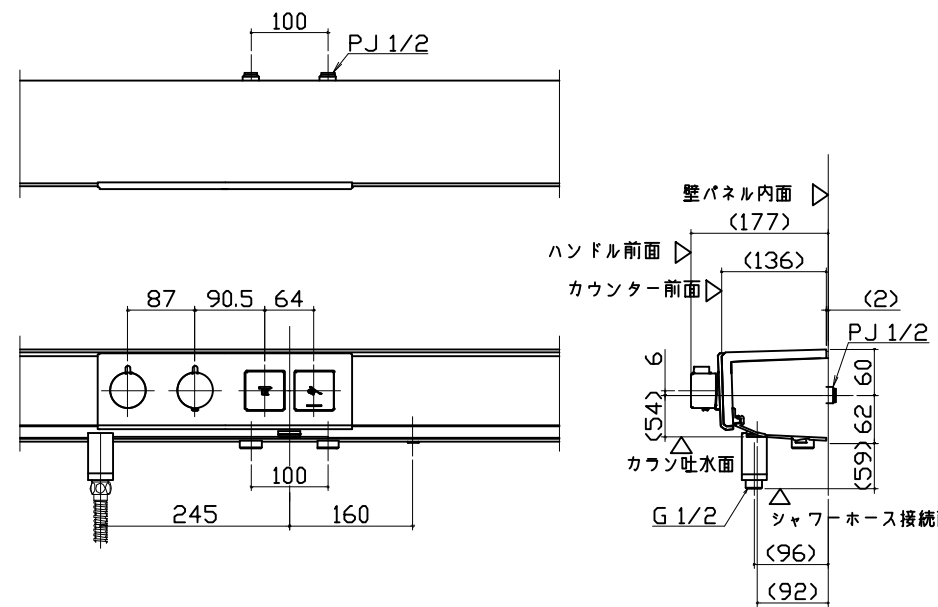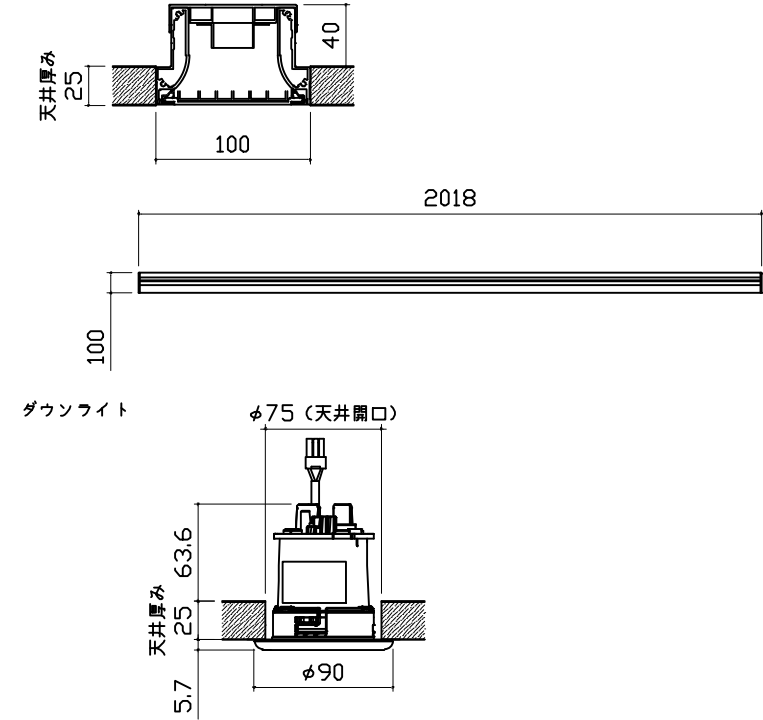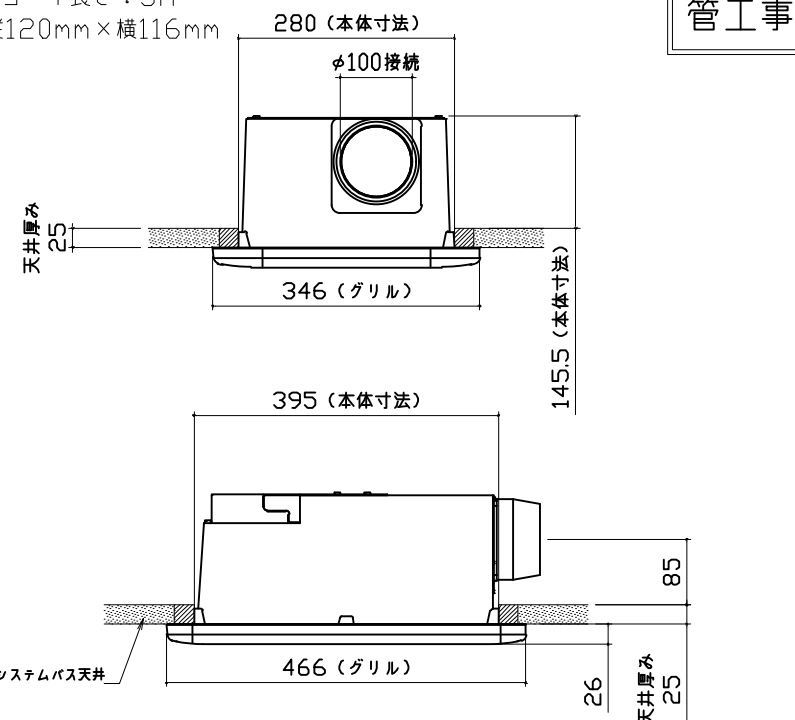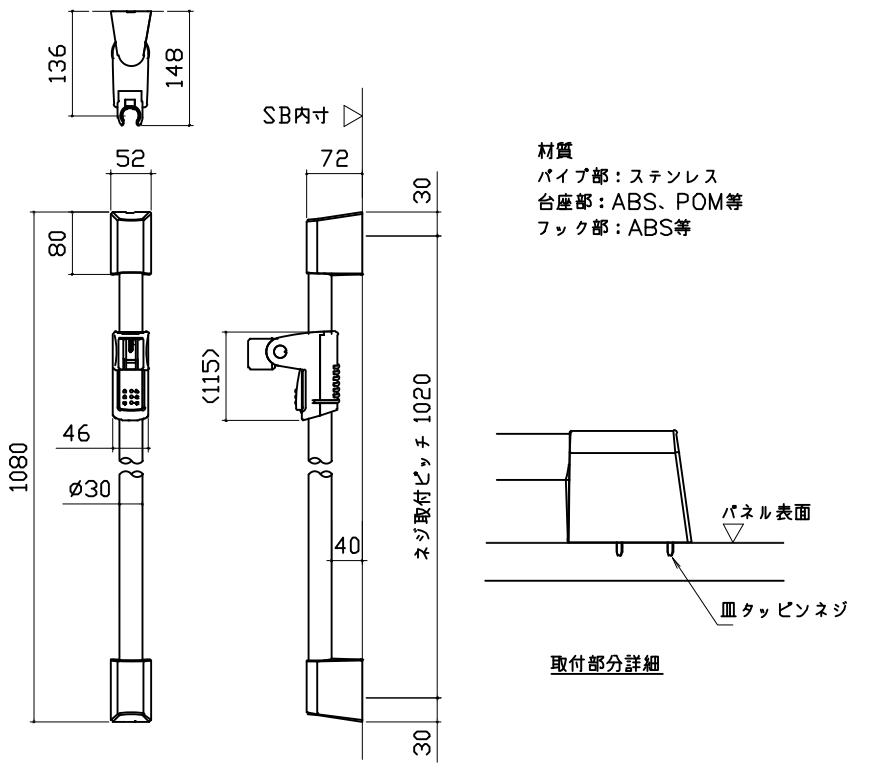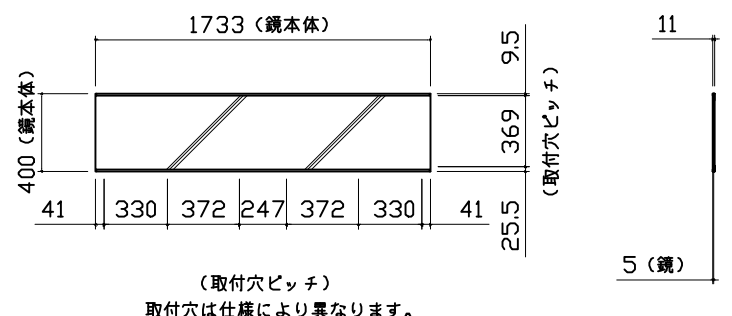浴槽 	洗い場用水栓 	照明 ストレーツライン照明 LED 23.7W (ダウンライト1灯含む) 	
換気機器 リモコンコード長さ: 5m 外形: 縦120mm×横116mm 	シャワーフックスライドバー  材質 パイプ部: ステンレス 台座部: ABS、POM等 フック部: ABS等	ミラー 枠: SUS304 t0.8 ミラー: 表面防曇コートあり (ワイドクリアミラー) 表面防曇コートなし (ワイドミラー)  (取付穴ピッチ) 取付穴は仕様により異なります。	
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称: 群馬-高崎SR SB1様邸 現場番号: C2772236 高崎営業所	PREDENCIA プレデンスシア プラン番号: 7401A-2505-0204T 担当営業:	部材詳細図 1/2 作成日: 2025年5月29日 担当アドバイザー:

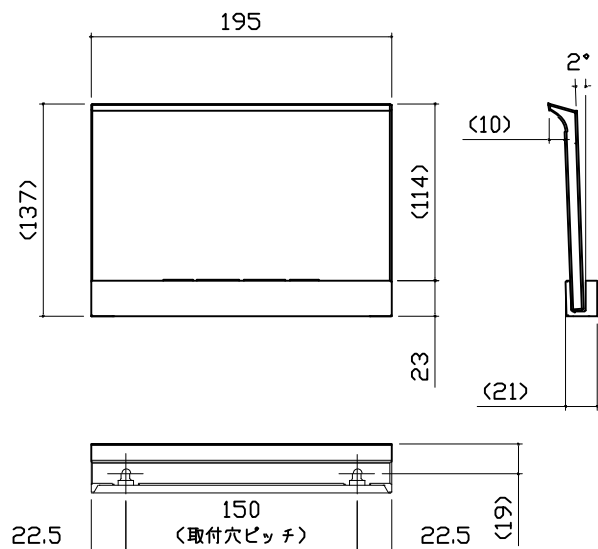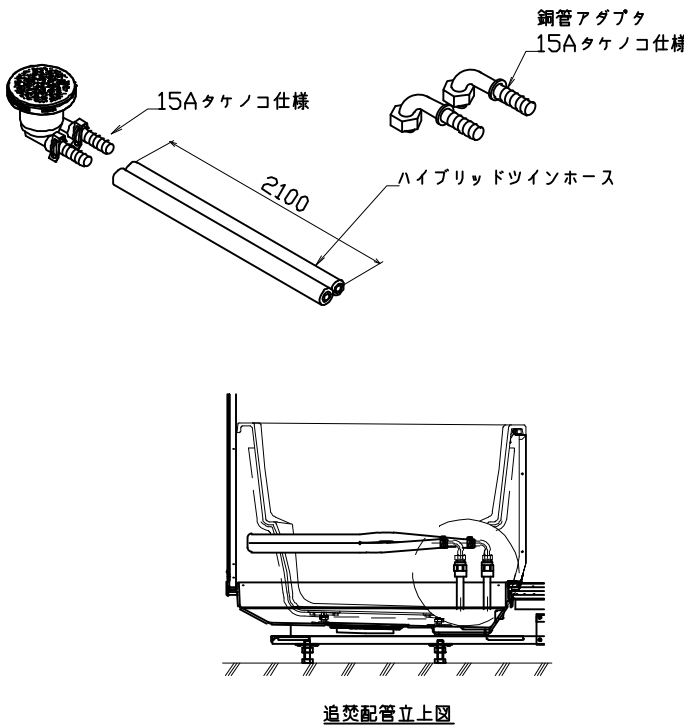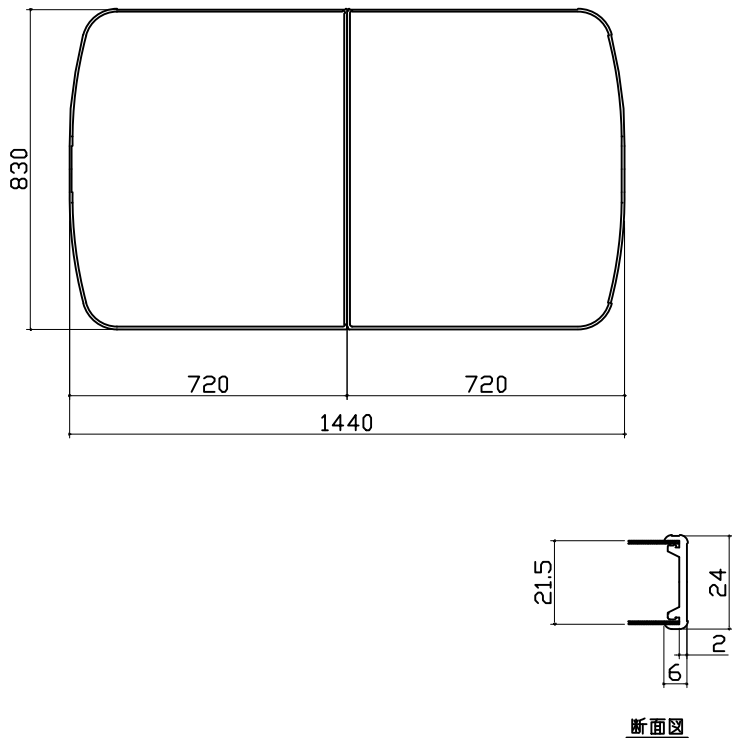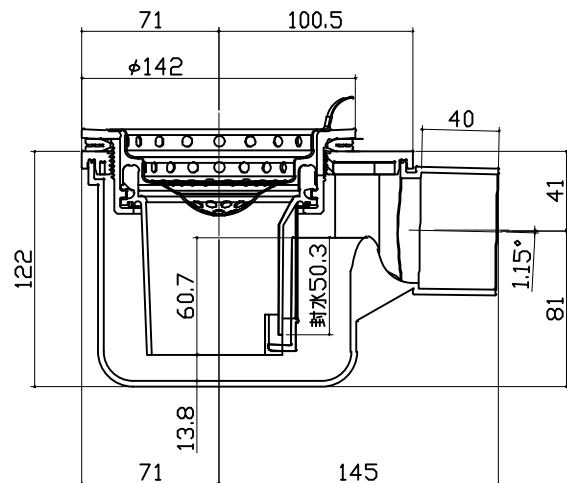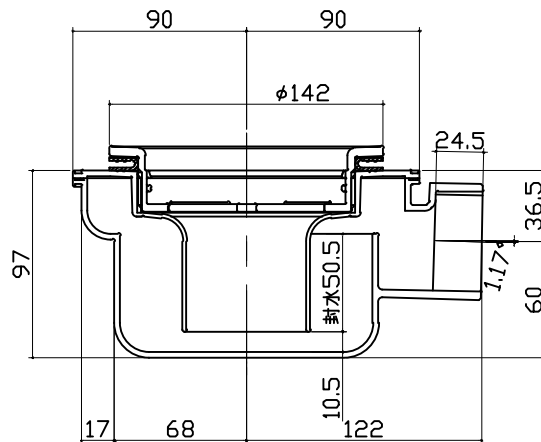収納棚		循環金具・フロアダプタ関連		風呂蓋 7079MDH-20WSK	
本体：PMMA 					
洗い場側排水トラップ		浴槽側排水トラップ			
					
Takara standard タカスタンダード株式会社		現場名称： 群馬-高崎SR SB1様邸 現場番号： C2772236 高崎営業所		PRE DENC I A プレデンシア プラン番号： 7401A-2505-0204T 担当営業：	
				部材詳細図 2/2 作成日： 2025年5月29日 担当アドバイザー：	

パネル割図		ミラー		収納棚	
ハ㇔K20C2D 0999 R<JDN ハ㇔K20C1D 0999 L<JDN ハ㇔K18FD 0199 <JDT ハ㇔K16NW 0799 <JDT ハ㇔K16NW 0799 <JDT ハ㇔K18AD 0999 <JDT ハ㇔K18B 0999 <JDT BL勝手		ハ㇔K20C2D 0999 R<JDN ハ㇔K20C1D 0999 L<JDN 947 617 245 702 372 現地加工：φ3.5 860 1229		ハ㇔K20C2D 0999 R<JDN 999 1220 860 200 50 現地加工：φ3.5	
シャフーフックスライドバー		ランドリーパイプ			
ハ㇔K20C1D 0999 L<JDN 999 33 33 43 1774 33 754 現地加工：φ3.5		ハ㇔K20C1D 0999 L<JDN 999 718 250 266 現地加工：φ3.5 ハ㇔K18AD 0999 <JDT 999 718 266 250 現地加工：φ3.5			

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬－高崎SR SB1様邸	PRE D E N C I A プレデンシア	穴開け指示図	1/1
	現場番号： C2772236	プラン番号： 7401A-2505-0204T	作成日： 2025年5月29日	
	高崎営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	
