

システムバス 御見積書

御名前 米子-鳥取SR SB1 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

作成日 2024年7月30日
プラン番号 2905B-2405-0117T
現場番号 C4456218

タカラスタンダード株式会社
◆鳥取営業所
鳥取県鳥取市湖山町東3丁目3番
TEL 0857-50-1355 / FAX 0857-32-1250

◆鳥取ショールーム
TEL 0857-50-1224 / FAX 0857-32-1255

商品
御見積金額 ￥1,657,500 (税込 ￥1,823,250)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥183,000 (税込 ￥201,300)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1620(BL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー / ブラック
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー(周辺)	パールホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 60Hz

◆ 御確認事項

- ☆御見積りの商品は受注生産の為、納期は約3週間程度いただきます。
- ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等接続工事は含まれておりません。
- ☆ご発注後のキャンセル・変更は応じかねますので、ご確認宜しくお願い申し上げます。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 米子-鳥取SR SB1

様

現場番号	C4456218	プラン番号	2905B-2405-0117T	作成日	2024/7/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1620サイズ		1	848,000	848,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ブラック)ノ強化ガラス(スモーク)(19サイズ)	1	+91,500	+91,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドアオプション部材	ドア外タオル掛け(開き戸専用)/ブラケット:クロムメッキ	1	+9,000	+9,000
6	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
7	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
8	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
9	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(クリスタルパールホワイト)	1		
10	浴槽追焚き穴	あり	1		
11	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
12	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
13	ヘルシージェット	なし	1		
14	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレー	1	+199,000	+199,000
15	うるぽか湯	なし	1		
16	オートウォッシュ	なし	1		
17	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
18	浴槽パン	あり	1		
19	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+99,000	+99,000
20	洗い場用水栓	エコシャワー(節水+手元止水+3Way):KVK FTB230KE	1	+13,000	+13,000
21	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
22	カウンター	人造大理石カウンター	1		
23	シャワーフックスライドバー	<手すりタイプ>(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
24	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(調光機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 米子-鳥取SR SB1 様

現場番号	C4456218	プラン番号	2905B-2405-0117T	作成日	2024/7/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ラグジュアリーミラー(全幅タイプ)	1	+139,000	+139,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	風呂フタフック	風呂フタフック(固定式)(ホホワイト)	1	+4,000	+4,000
37	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
38	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
39	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			39		¥1,657,500
商品総合計			39		¥1,657,500

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥183,000 (税込 ¥201,300)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

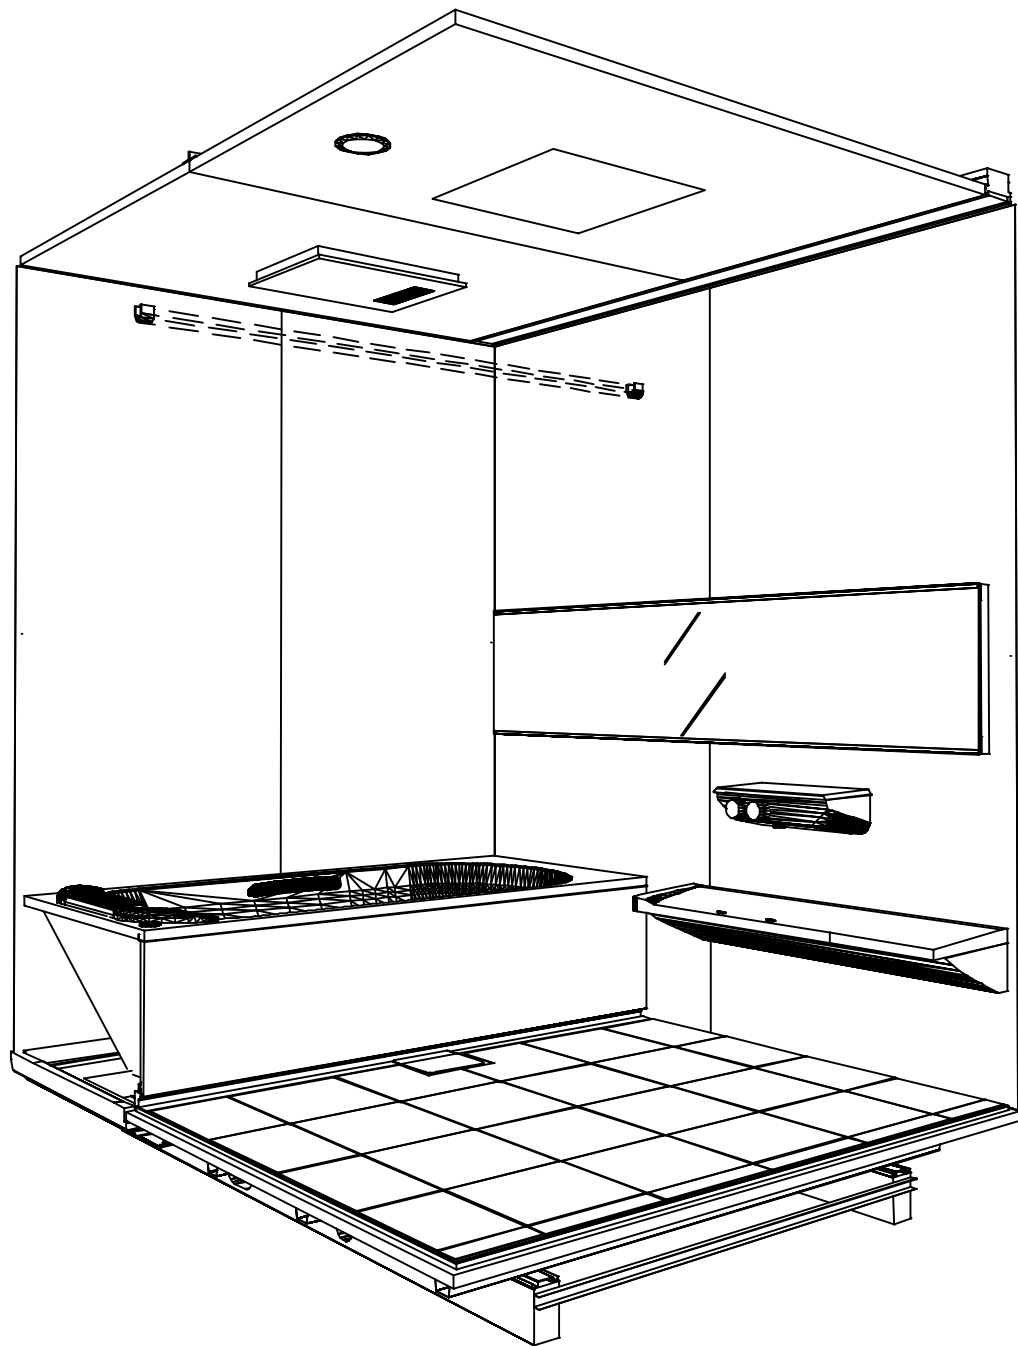

鳥瞰図

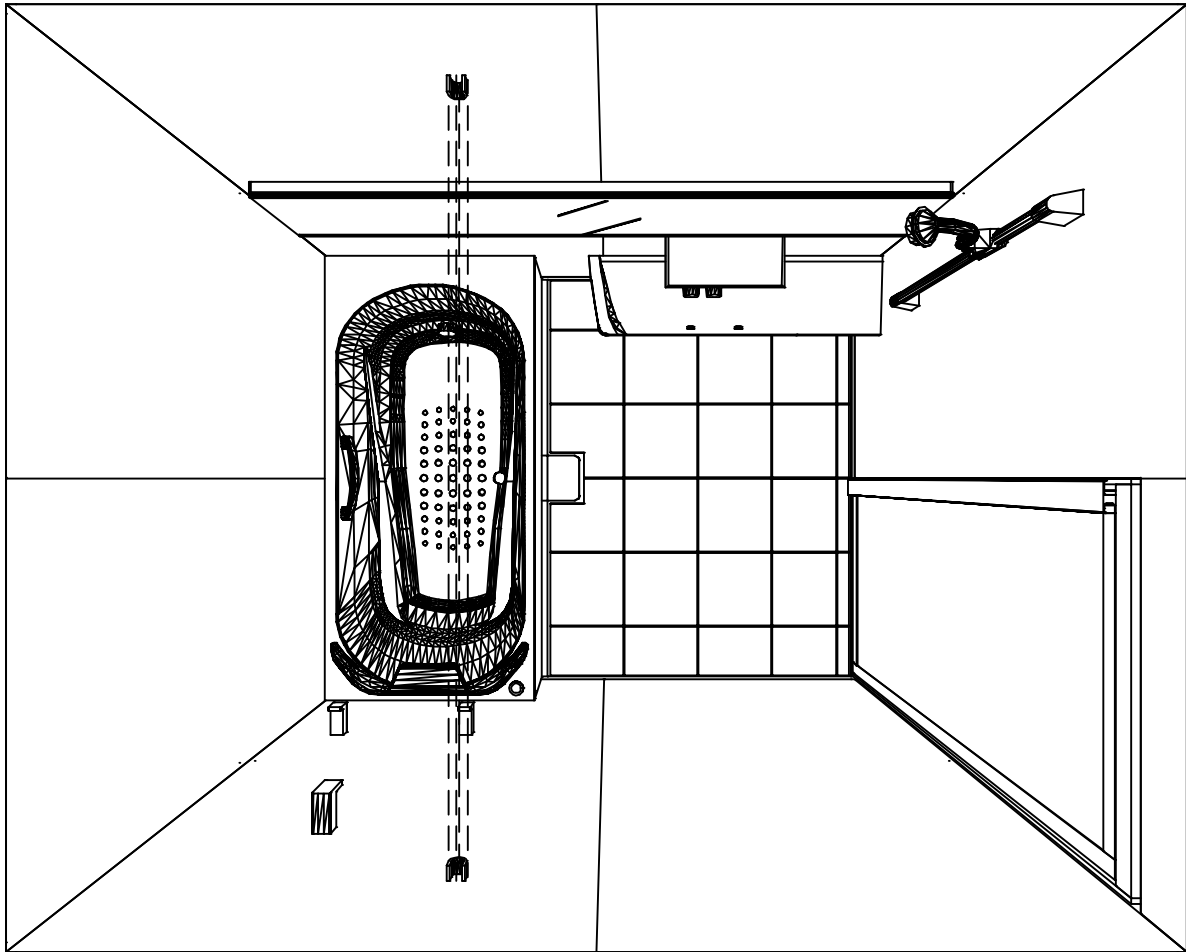

1620

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

現場名称： 米子-鳥取SR SB1様邸	GRANSPA グランspa	姿図	
現場番号： C4456218	プラン番号： 2905B-2405-0117T	作成日： 2024年7月30日	
鳥取営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

カウンター面


浴槽側面

洗場側面


カウンター対面

■ 留意事項


* 印寸法は給水給湯管の突出寸法18mmを含みます。

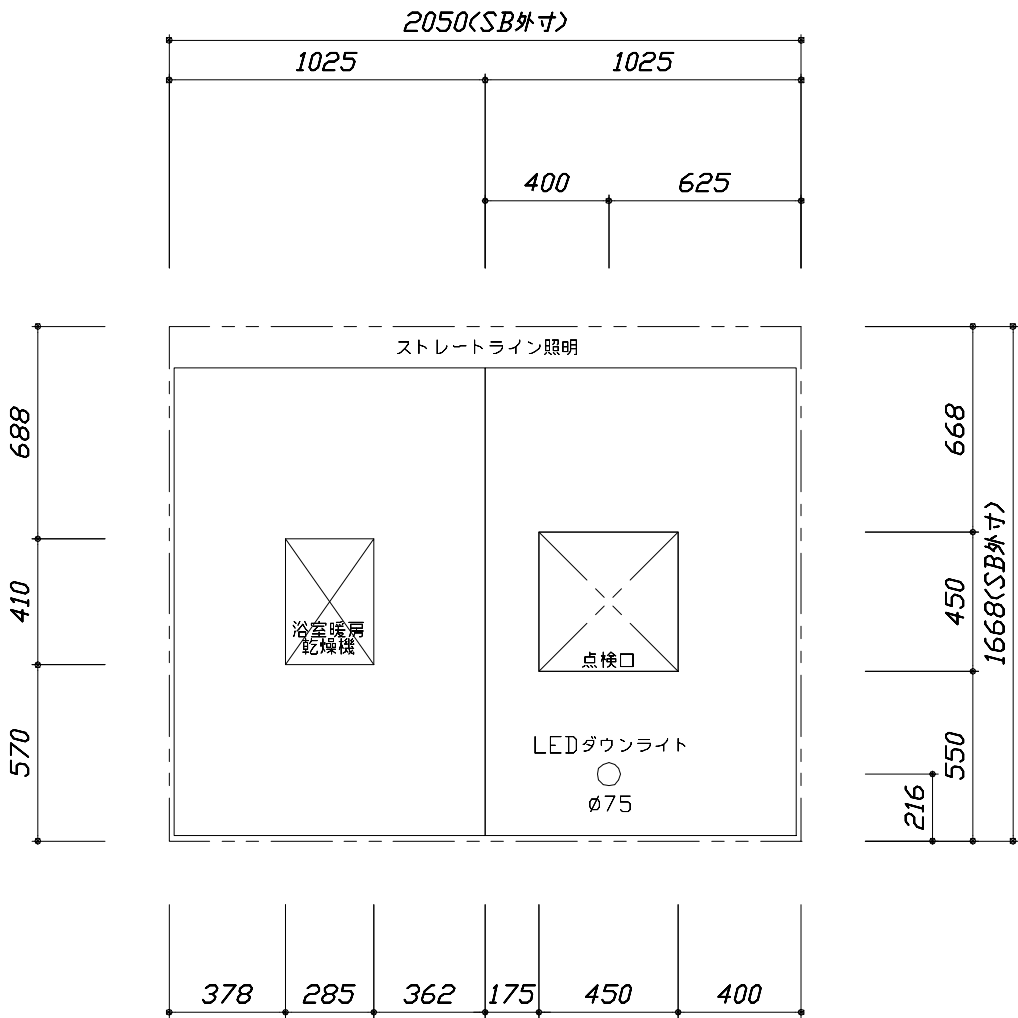

< 天井伏図 >

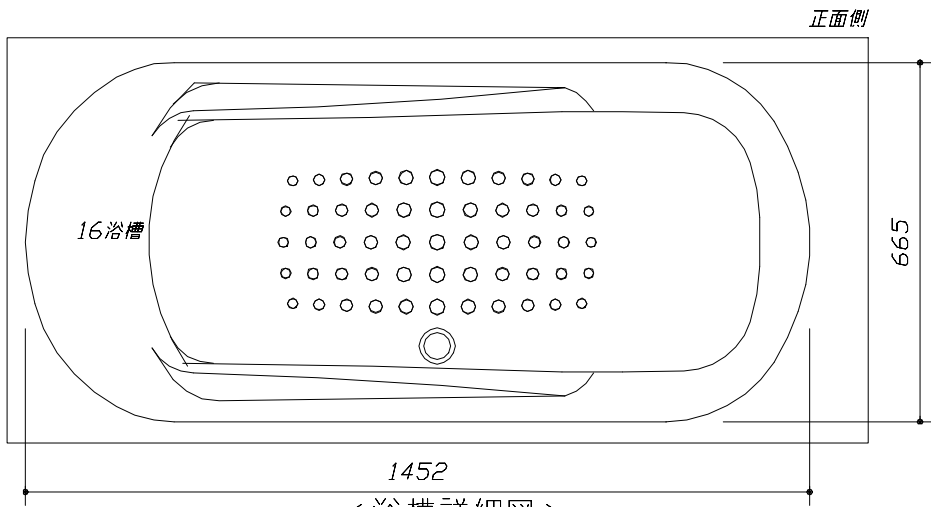



< 浴槽詳細図 >

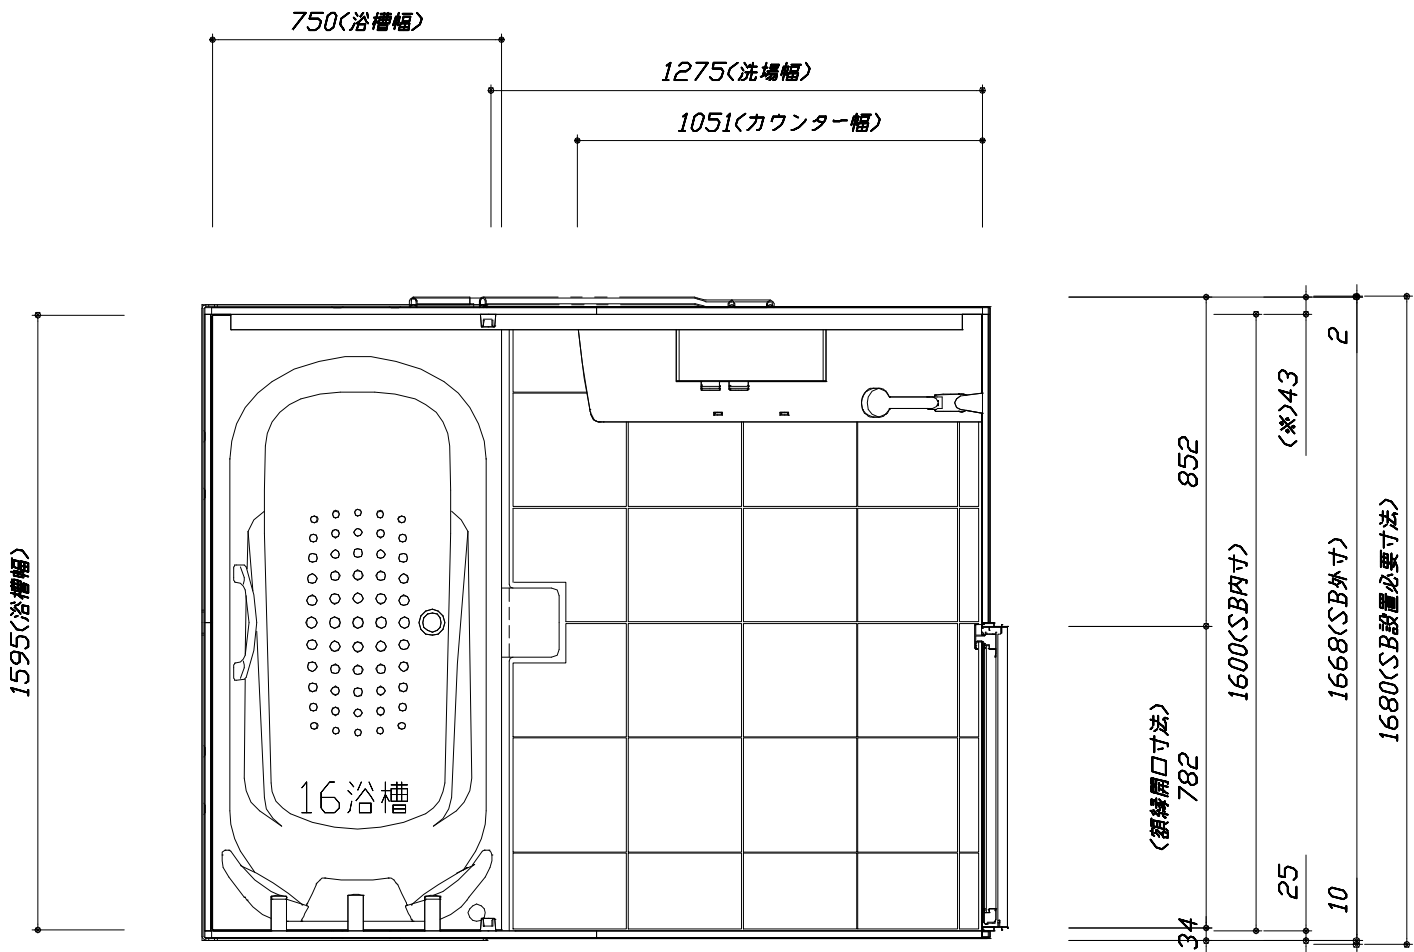

< 平面図 >

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

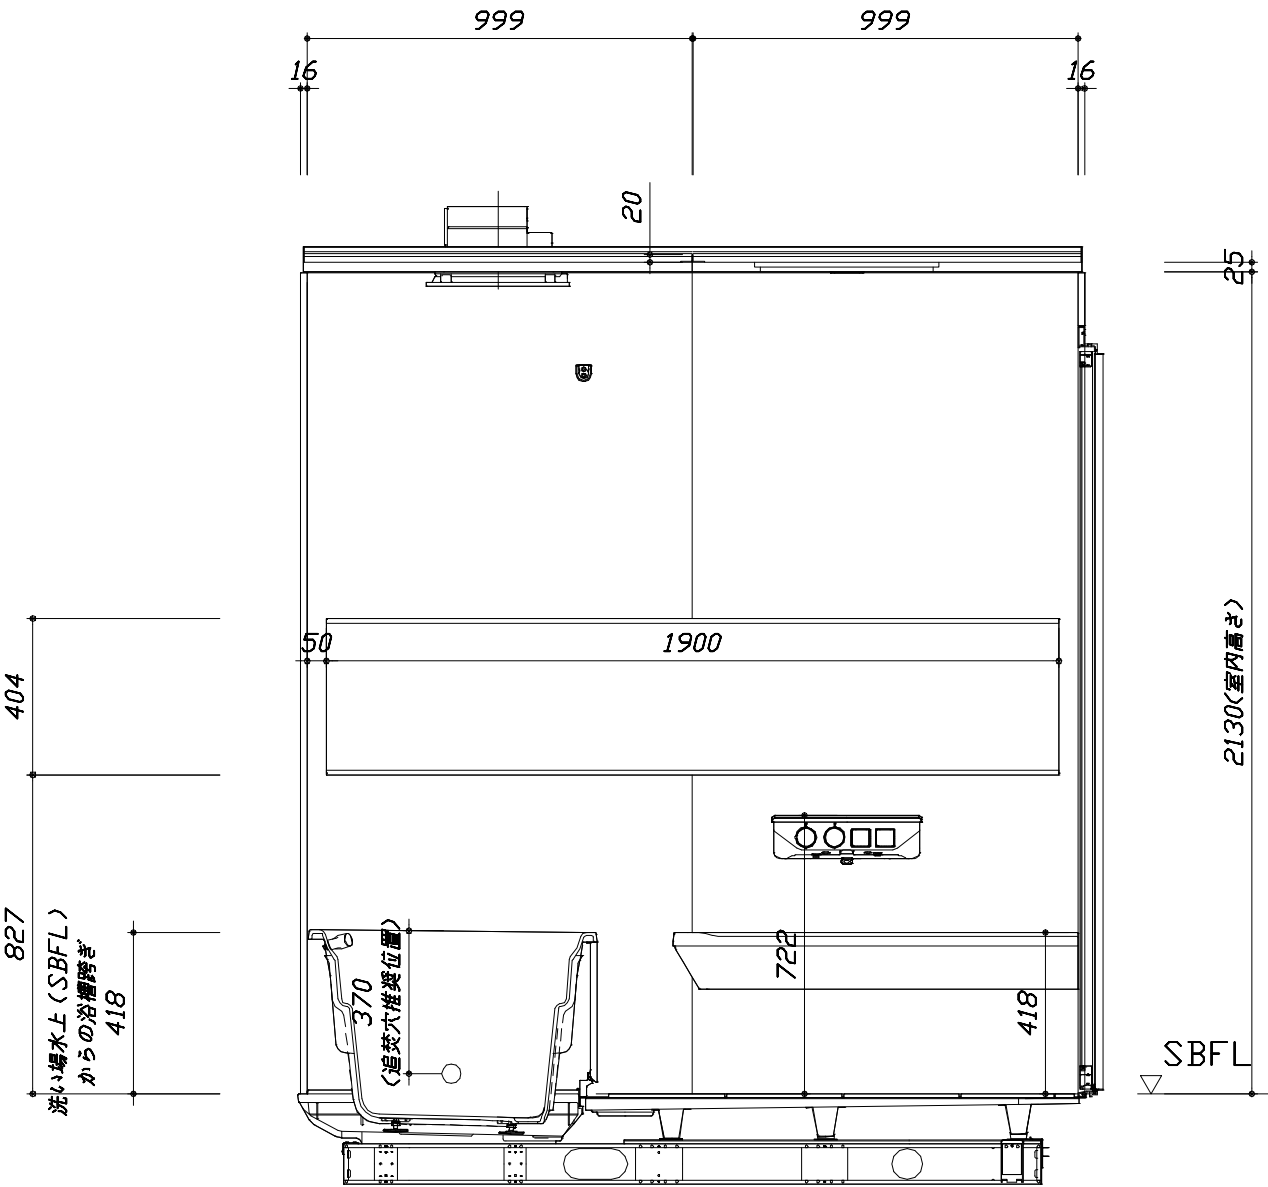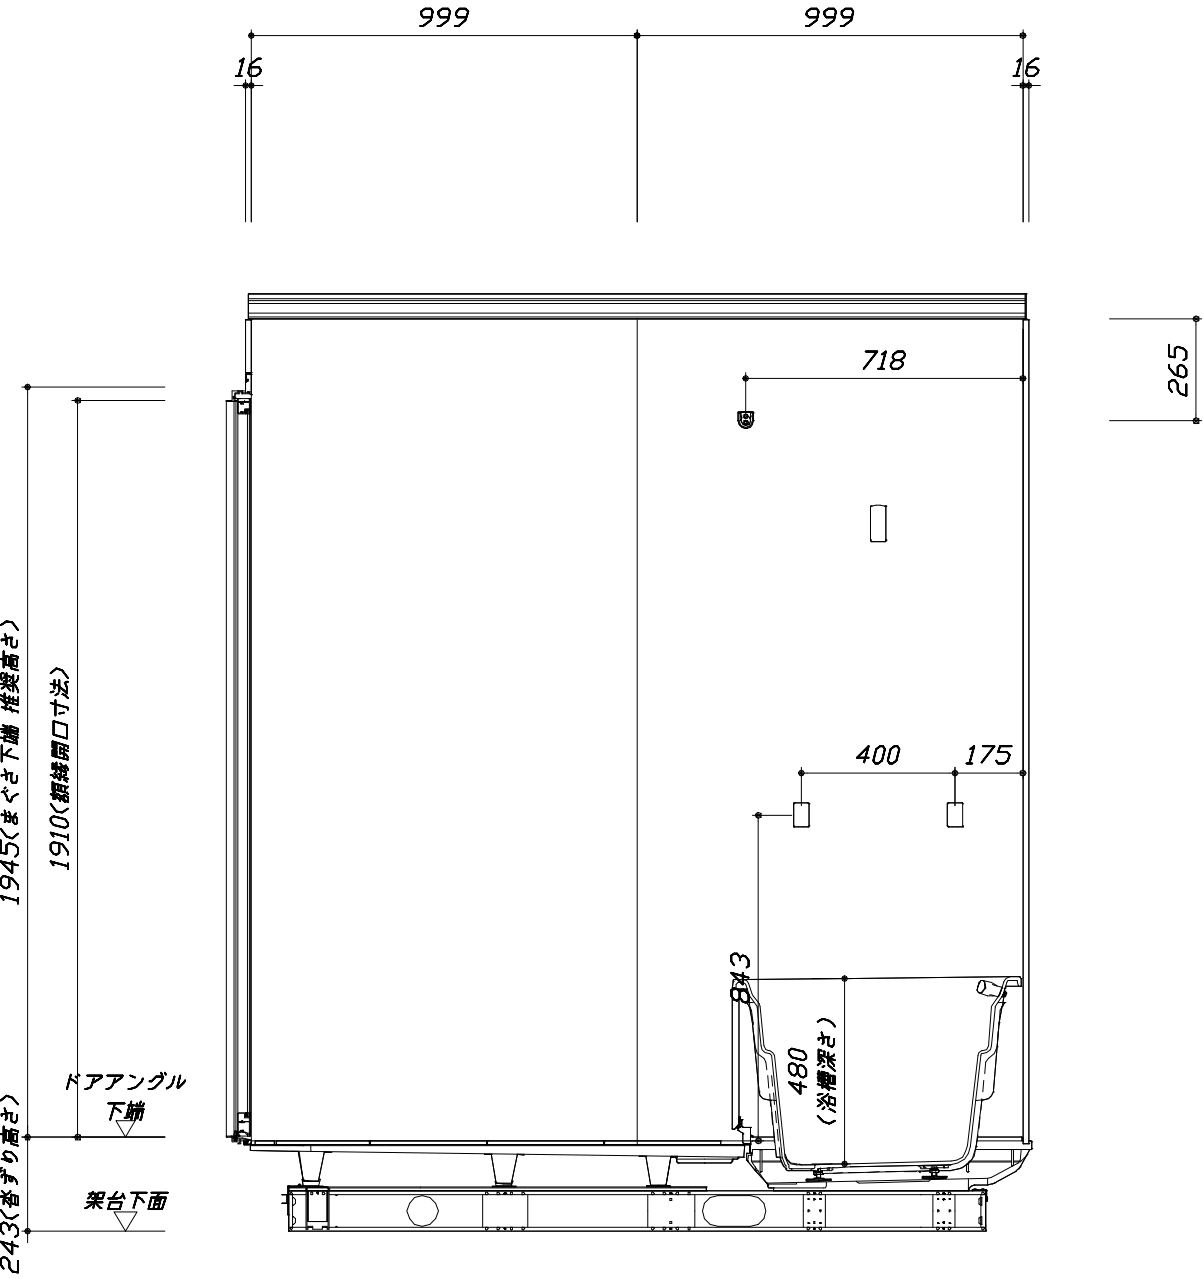


■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

<カウンター対面図>

<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
- ・外寸は突出部を含みます。

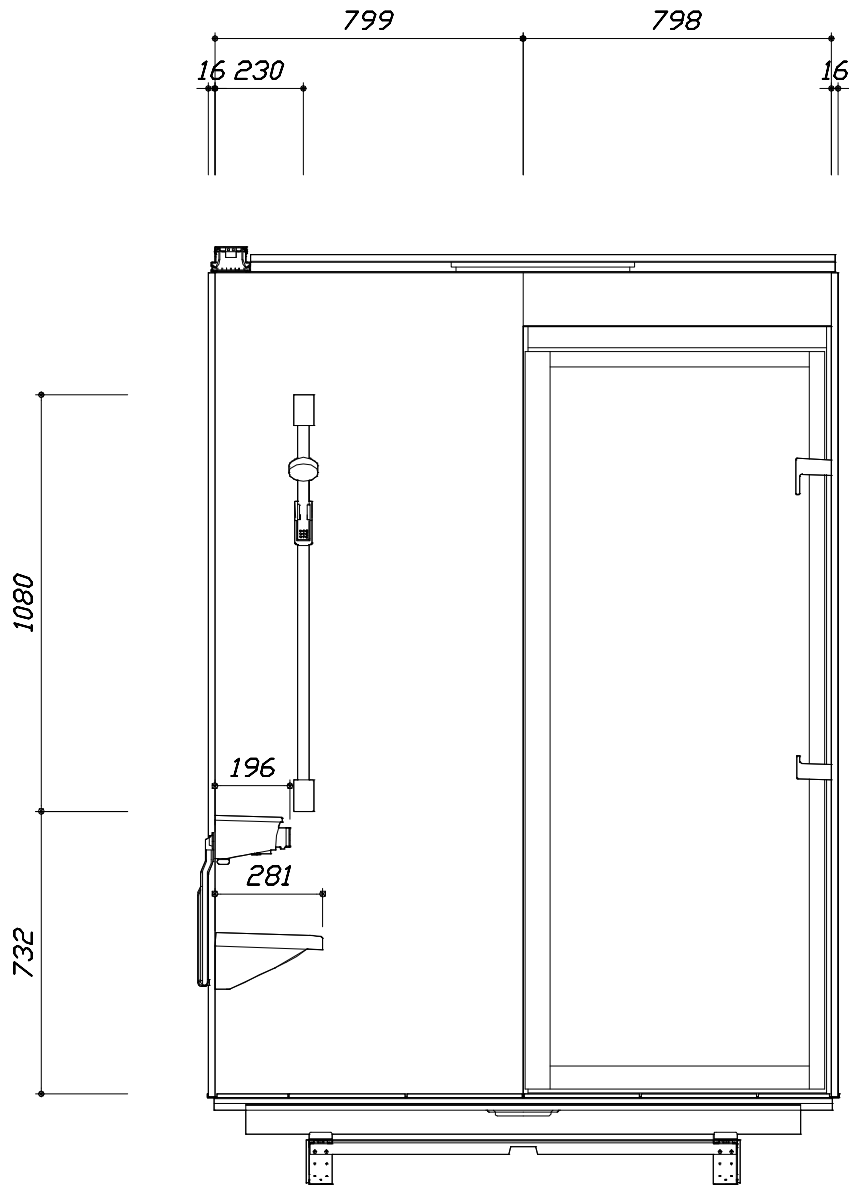

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

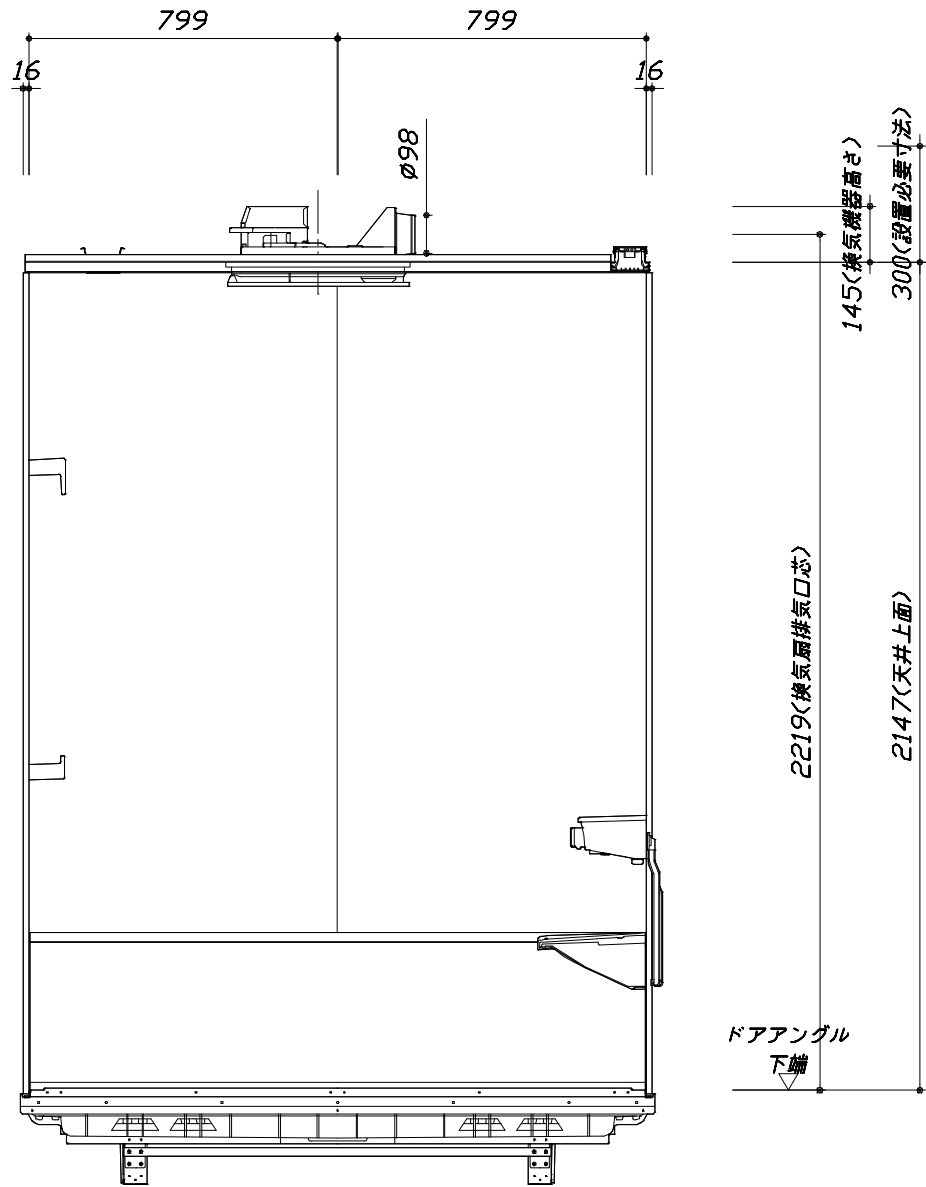

< 浴槽側面図 >

現場名称： 米子-鳥取SR SB1様邸	GRANSPA グランspa	施工図3	縮 尺： 1:20
現場番号： C4456218	プラン番号： 2905B-2405-0117T	作成日： 2024年7月30日	
鳥取営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽 グリップ付（305リットル）追い焚き穴：あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	化粧サンドイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ開き戸(アルミ框/飛散防止フィルム付強化ガラス/ﾀﾅﾍﾞ型換気口/ドア外タイル掛け付)
窓 1	－
窓 2	－
窓枠 1	－
窓枠 2	－
排水トラップ	洗い場：A B S 樹脂, 浴槽：A S A 樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50
製品重量	365kg

アクセサリ仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー くもり止め加工（13W）
収納棚	－
タオル掛け	－
洗場側水栓	サーモスタット(KVK FTB230KE) (樹脂ホース：ﾒﾀﾙ調)
浴槽側水栓	－
兼用水栓	－
フック/スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ-T1020S MH）
照明	ストレーライン照明（LED 23.7W調光機能付）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V・最大消費電力1250W) (ﾀﾞｲｱﾂ径 ϕ98)（常時換気対応品）ブラック
フロフタ	保温風呂フタ (PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管 (10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	－
ハンドバー②	－
ハンドバー③	－
ハンドバー④	－
ハンドバー⑤	－
ハンドバー⑥	－
ハンドバー⑦	－

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
ﾊﾟﾅｰﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
ﾊﾟﾅｰﾙ(周辺・3面)	VW：パールホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	PW：グランホワイト
ドア / 天井	B：ブラック / B：チャコールブラック
収納棚	－
タオル掛け	－
ﾗﾝﾄﾞﾘｰセット	ホワイト

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
システムバス 本体取付・設置		建設工事 外区分	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トフップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トフップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3 4 5 6 1 3	管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
			浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
		管	ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
		電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

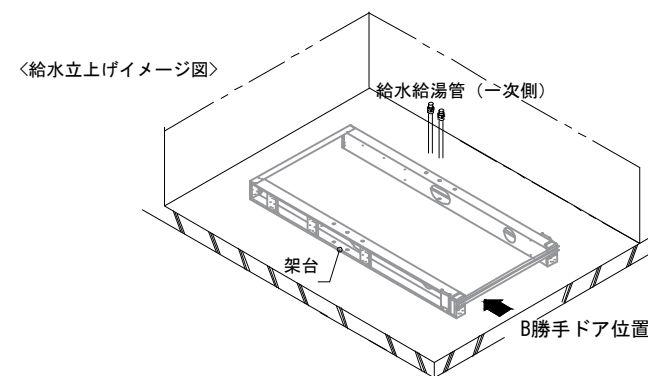

■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より265mm下がりで打設してください。



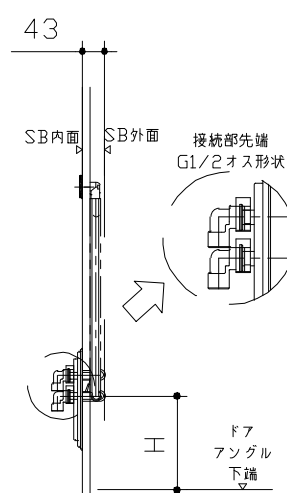
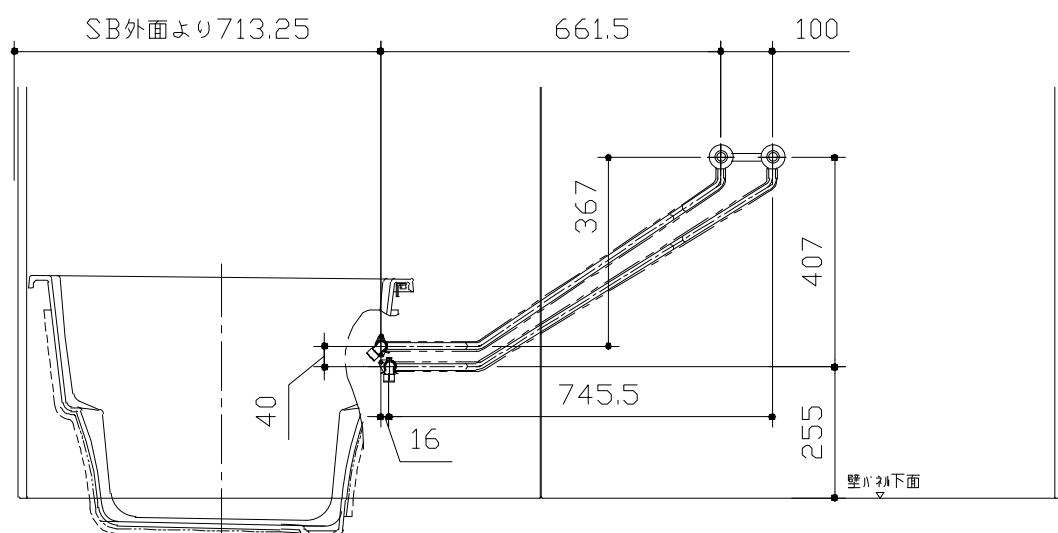


ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	230

＜給水給湯管取合詳細図＞

■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置

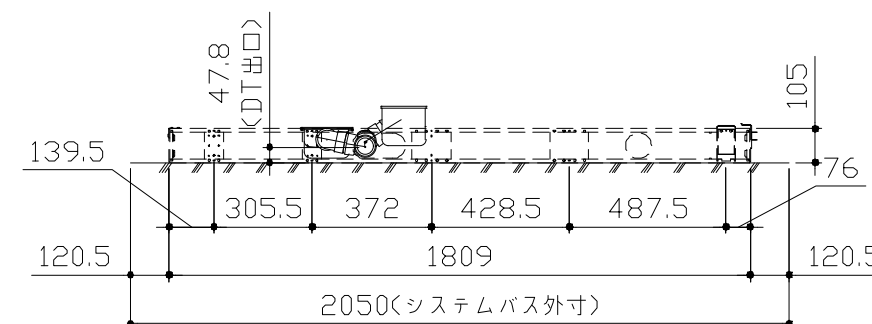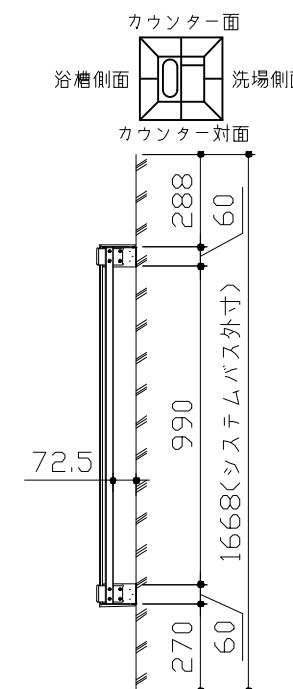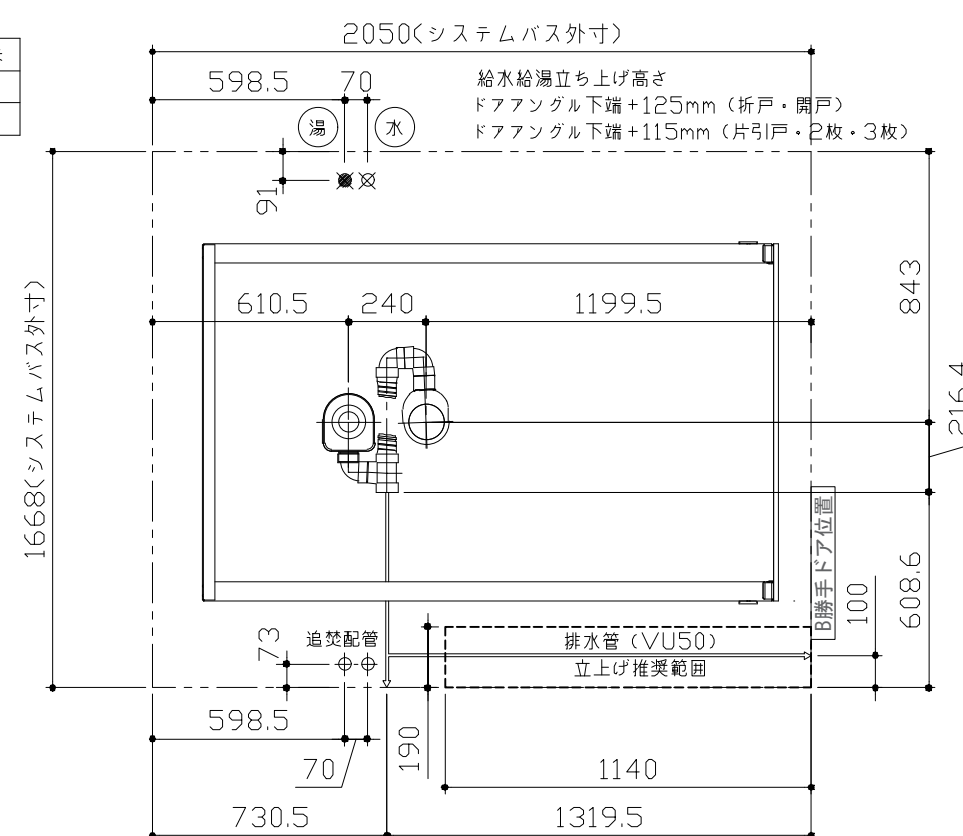

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞


■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

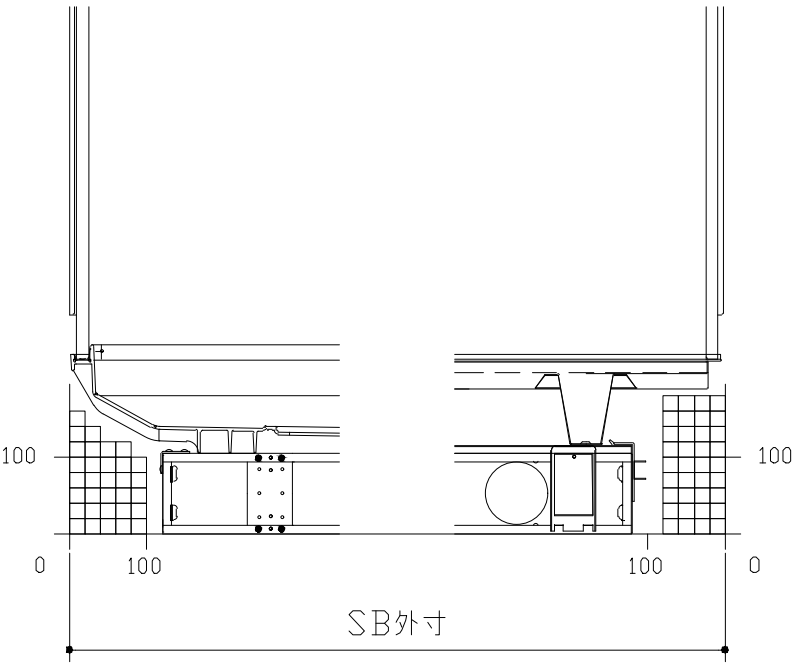


A矢視

B矢視

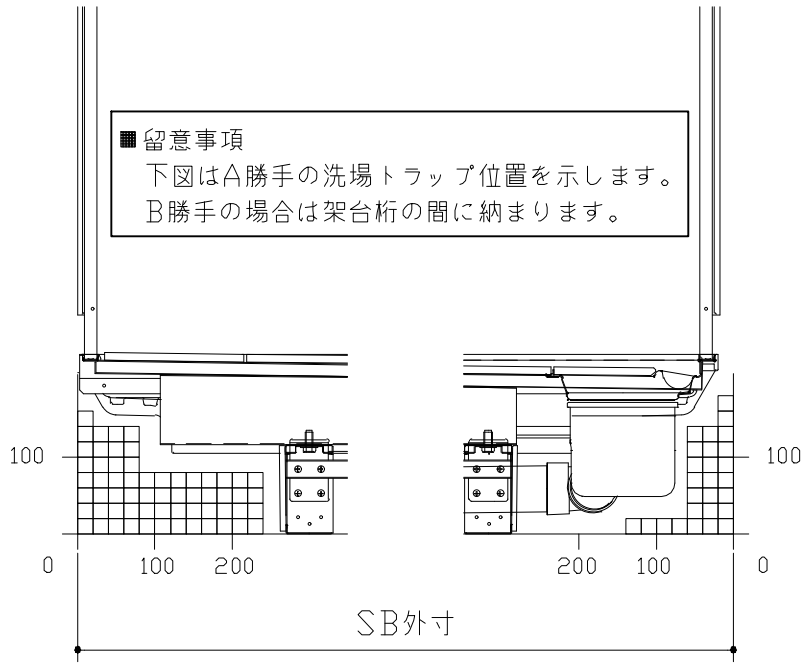

C矢視



D矢視

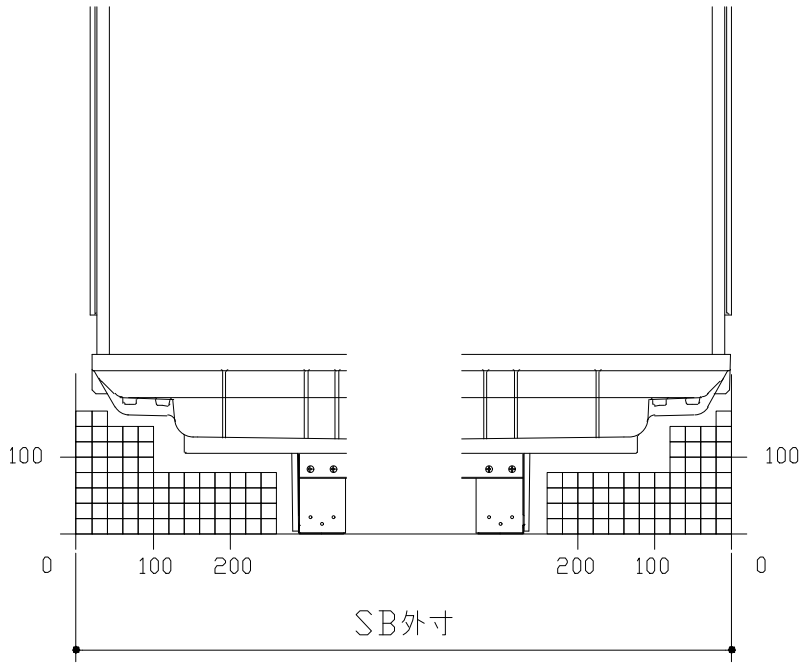


E矢視

F矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

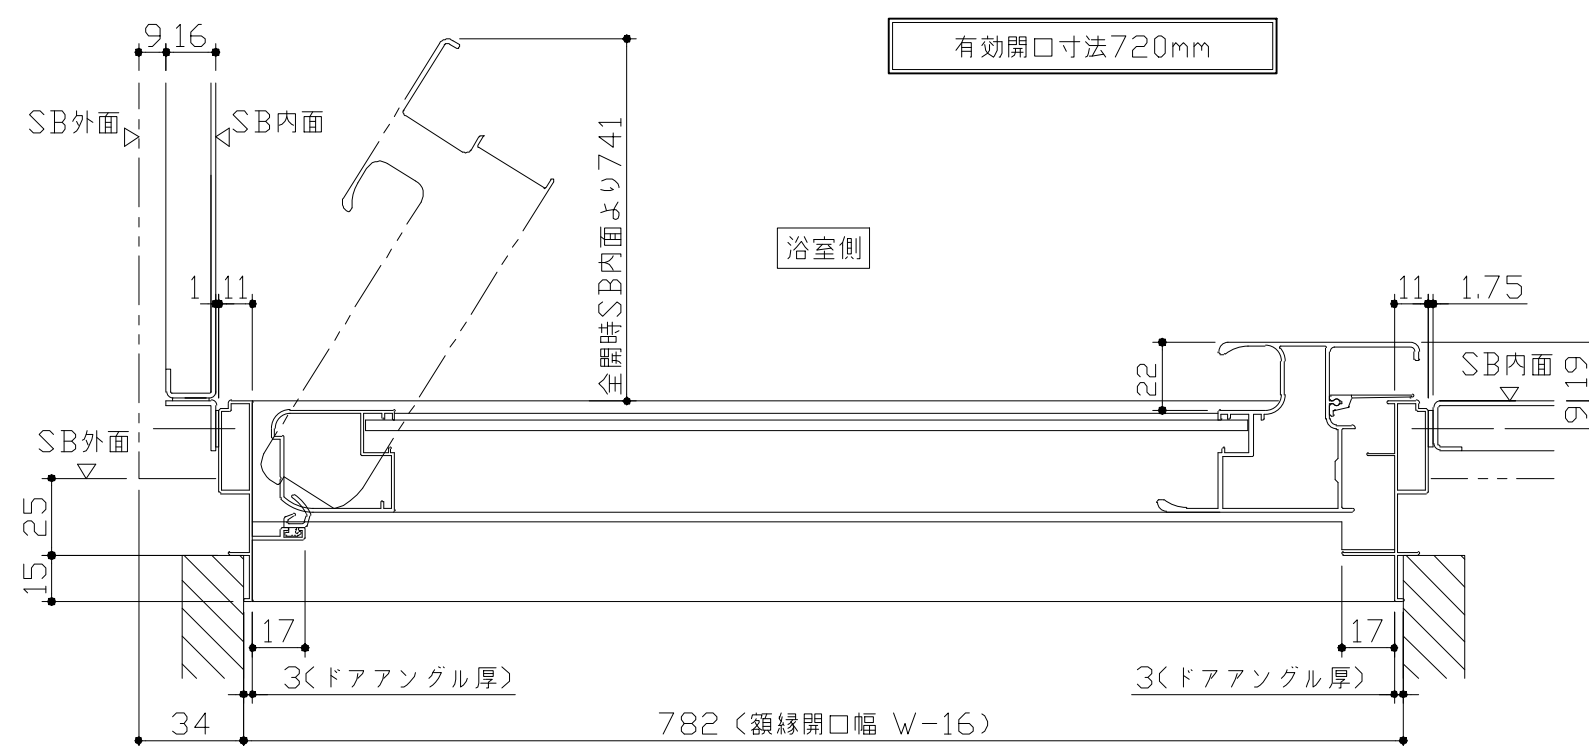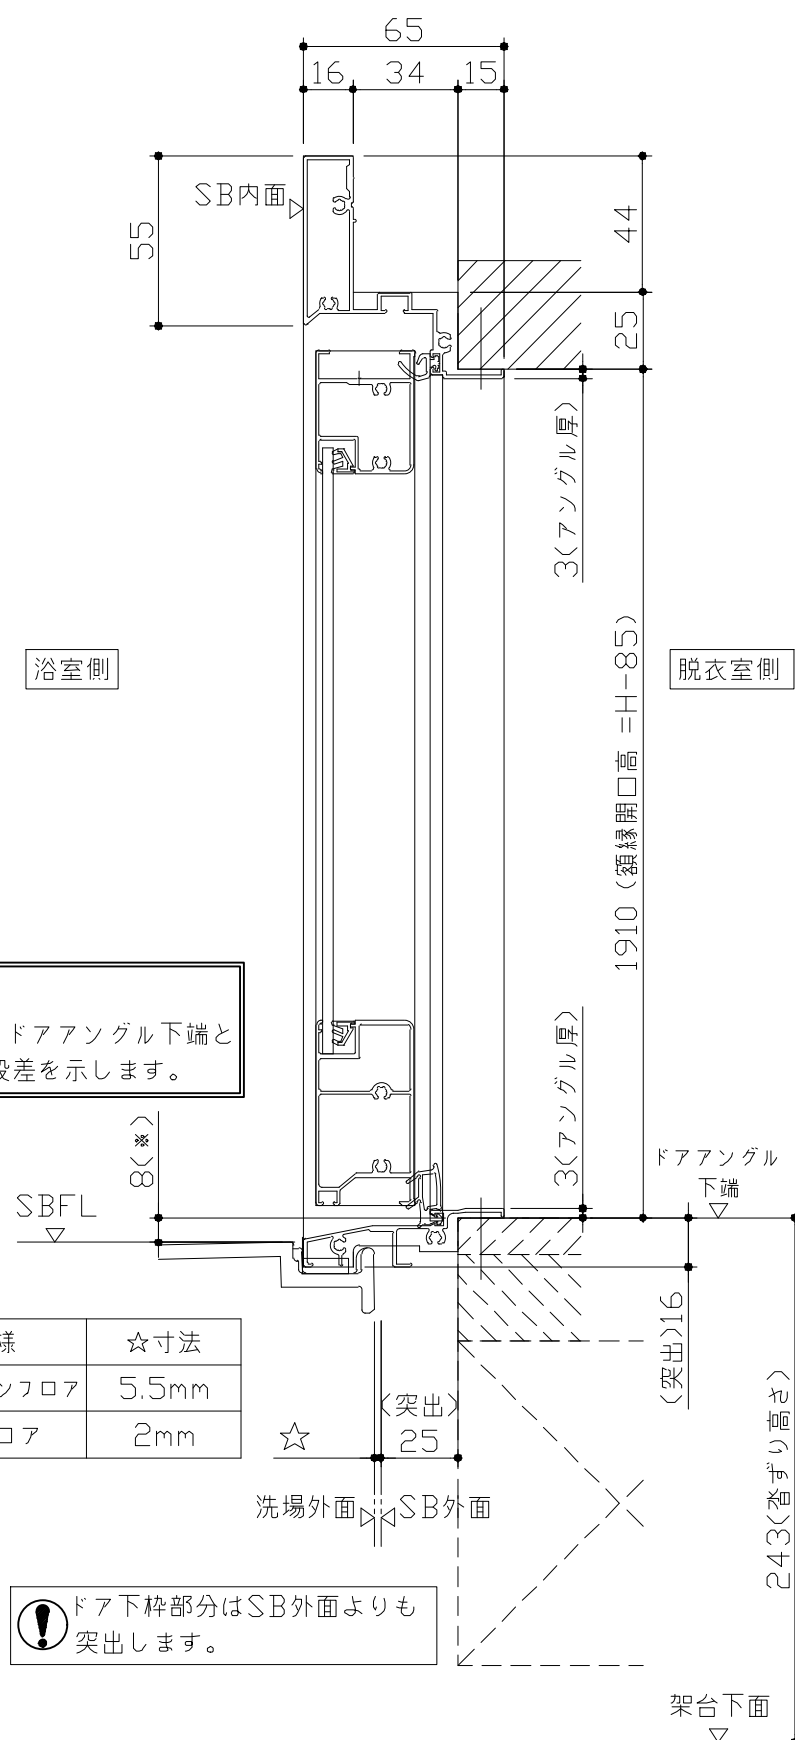



ドア開き角度65°以上でタオル掛けと
干渉の恐れがあります。

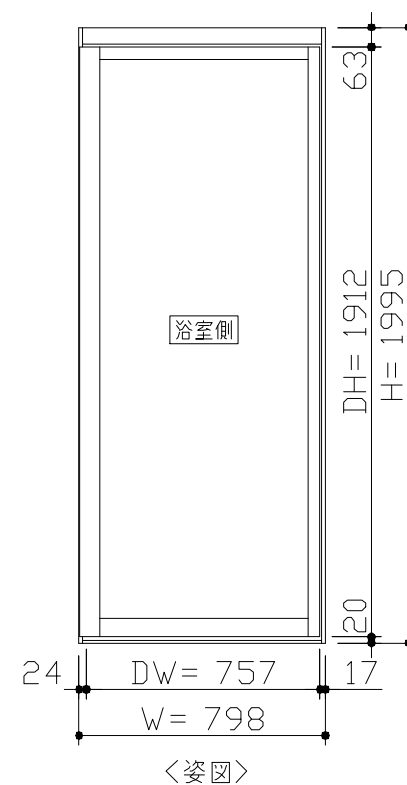


- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉




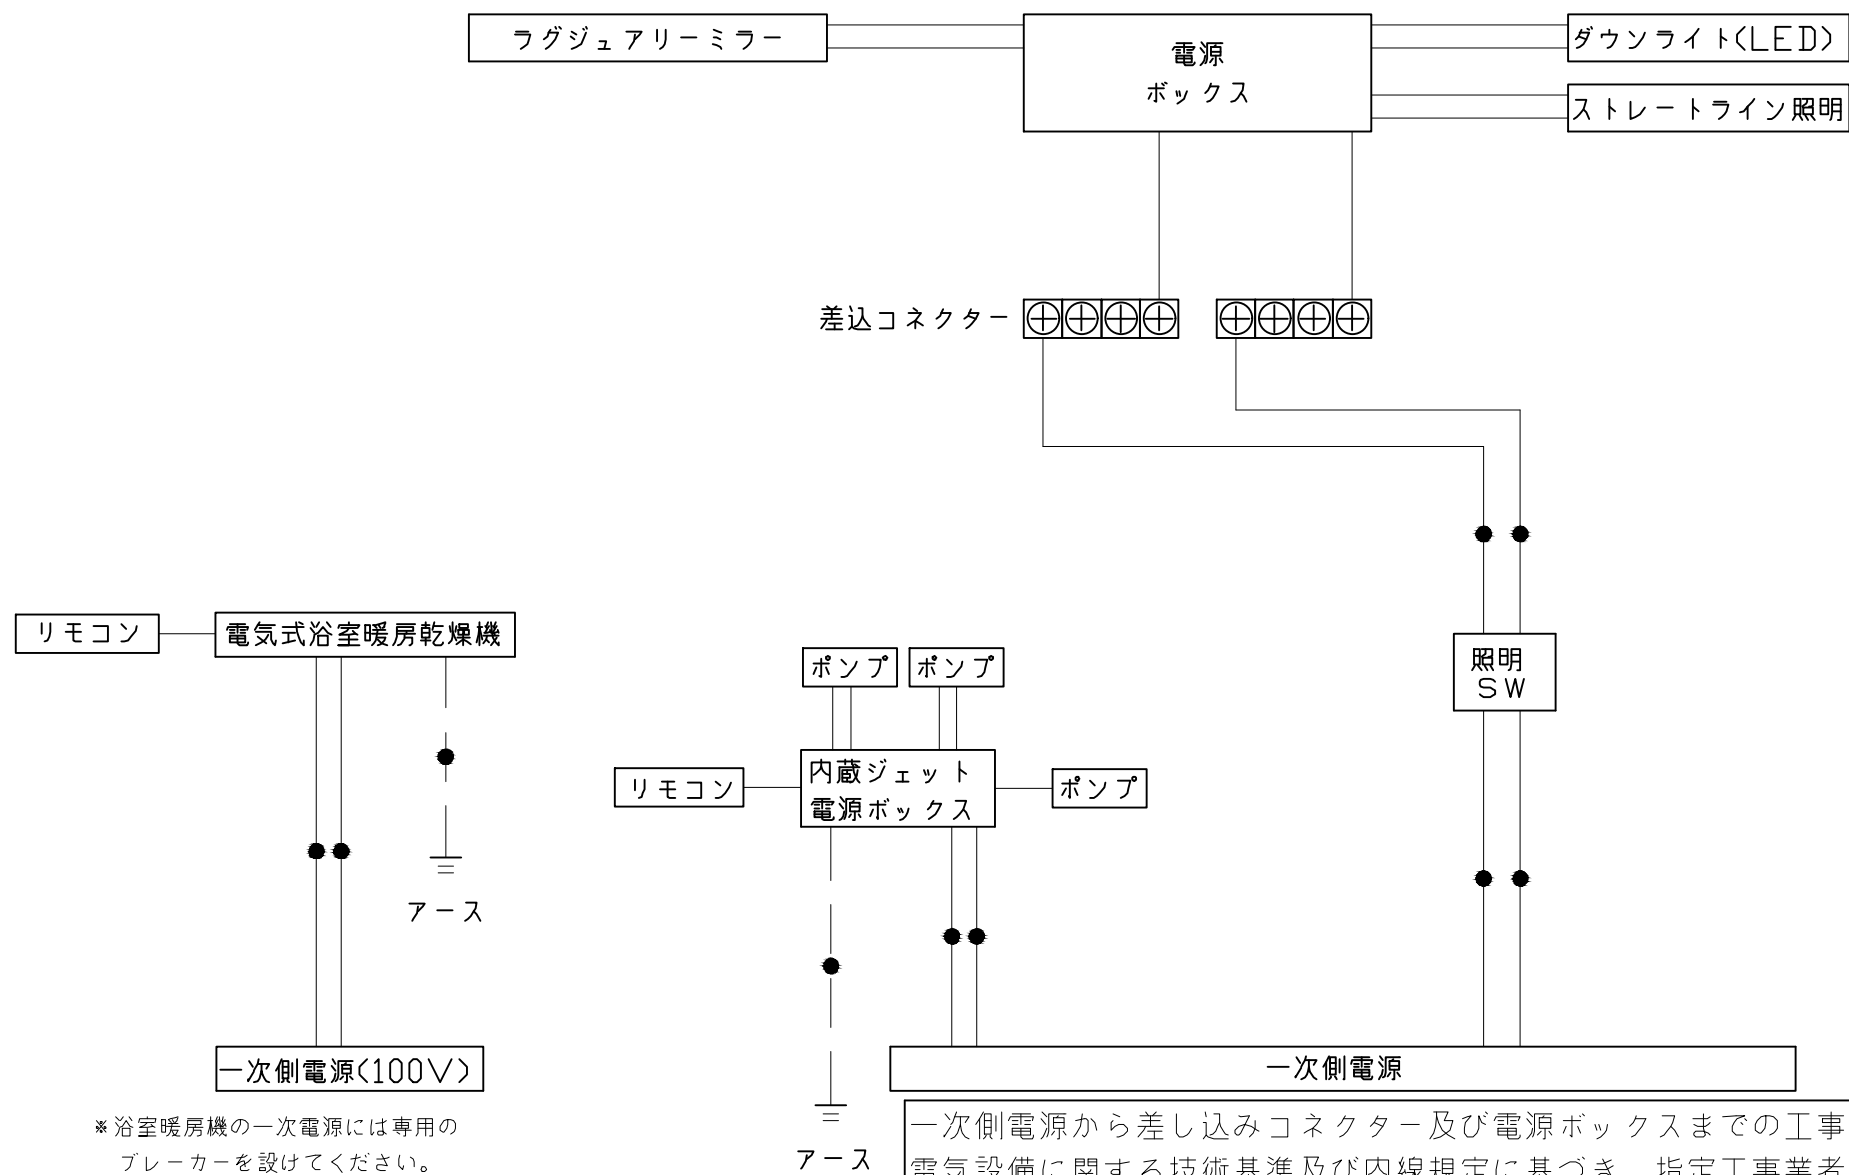

浴槽

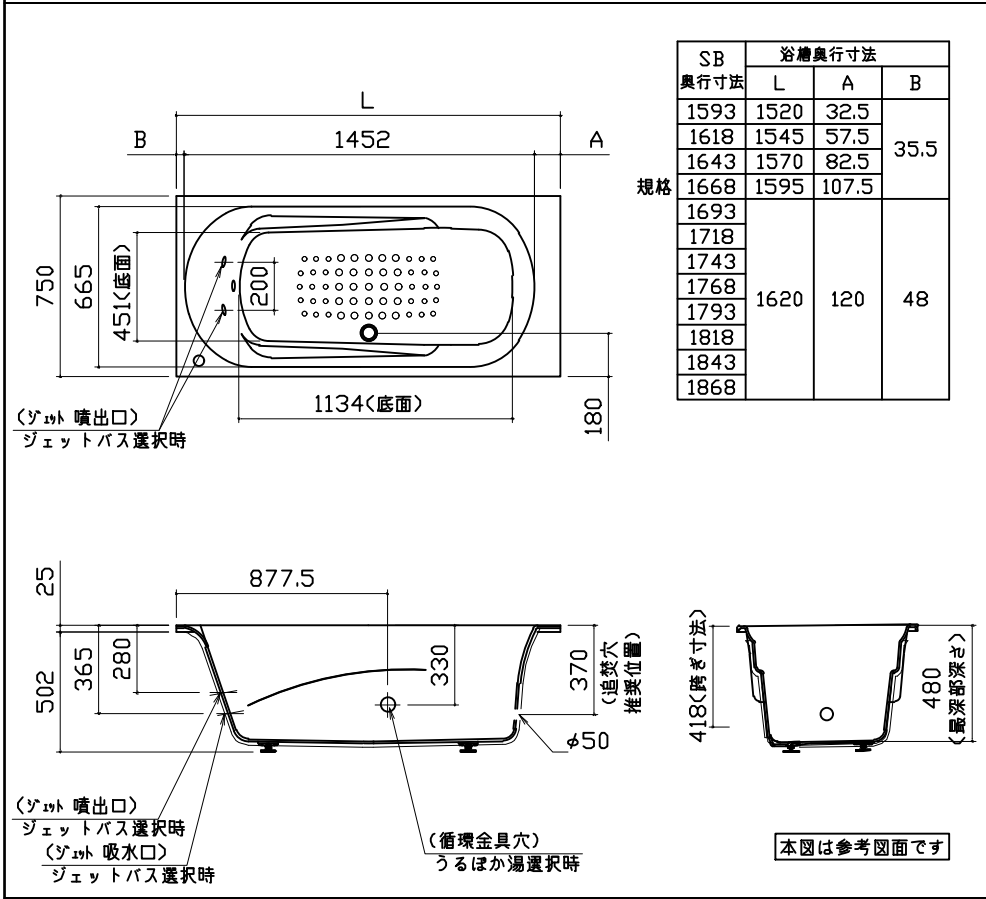

洗い場用水栓

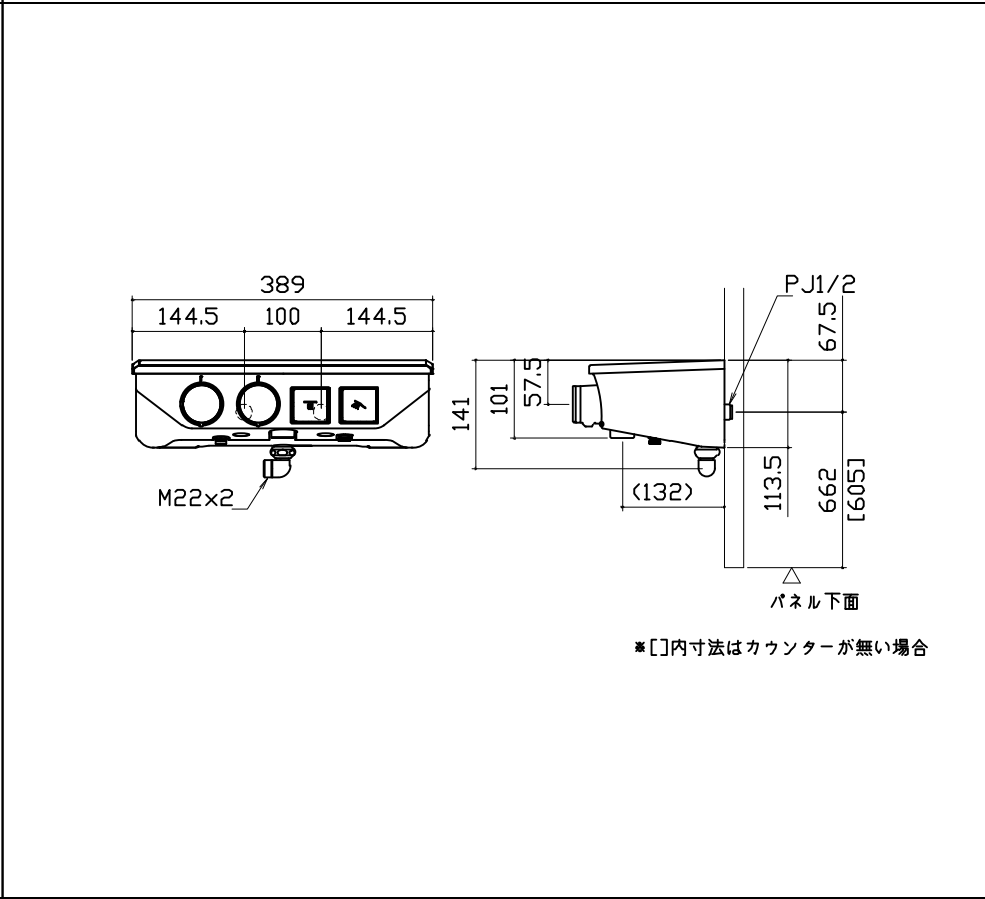

照明

ストレーツライン照明
LED 23.7W (ダウンライト1灯含む)

天井厚み 25 40 100

2018

100

ダウンライト

φ75 (天井開口)

63.6 25 5.7 φ90

天井厚み

換氣機器

リモコンコード長さ：5m
外形：縦120mm×横116mm


管工事

The diagram illustrates the dimensions of the remote control receiver unit in two views:

- Front View (Top):** Shows a square base with a width of 372 (grille) and a height of 280 (body dimension). The central circular opening has a diameter of $\phi 100$ (connection). The unit is mounted on a base with a thickness of 25 (ceiling thickness).
- Side View (Bottom):** Shows the unit's profile with a total width of 472 (grille) and a height of 145 (body dimension). The base thickness is 38, and the ceiling thickness is 25. A side panel is shown with a height of 72 (exhaust).

システムバス天井

シャーフックスライドバー







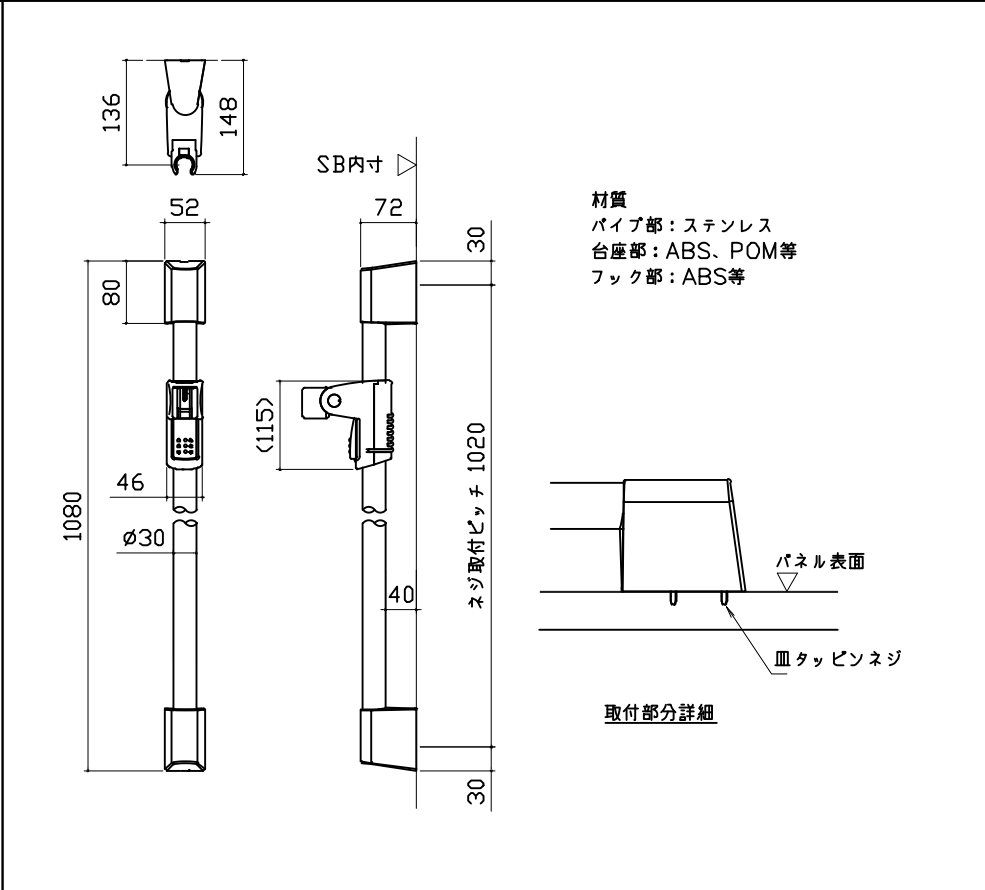


ミラー


枠：SUS304 t0.8、PMMA
 ミラー：表面防曇コートあり
 LED：13W

The technical drawing shows the dimensions of the mirror unit. The front view (top) has a total width of 1900 mm (鏡本体) and a total height of 400 mm (鏡本体). The mounting bracket height is 14.5 mm. The side view (right) shows a total depth of 41 mm and a mirror glass thickness of 5 mm (鏡). The mounting bracket depth is 30.5 mm. The front view also shows the mounting bracket width of 79 mm on both sides and the mirror glass width of 570 mm. The distance between the mounting holes is 601.5 mm.


(取付穴ビッチ)
 (鏡本体)
 (鏡)
 (取付穴ビッチ)

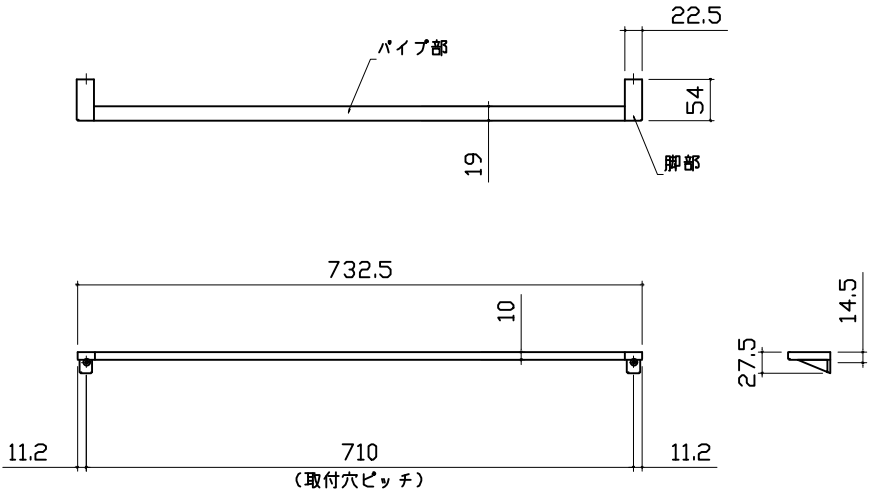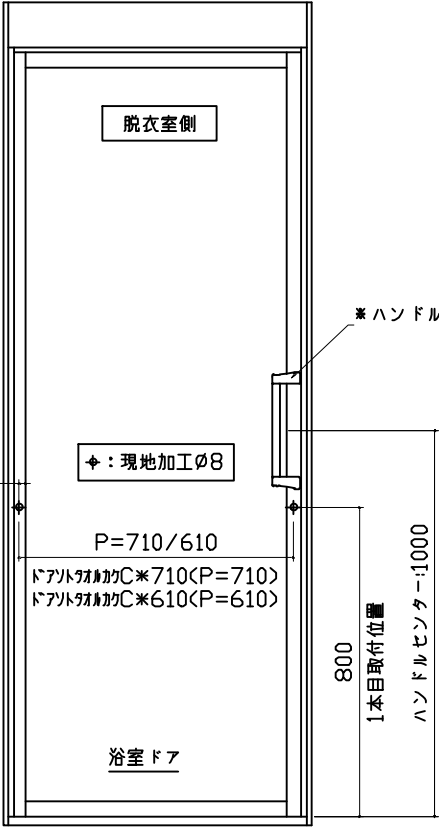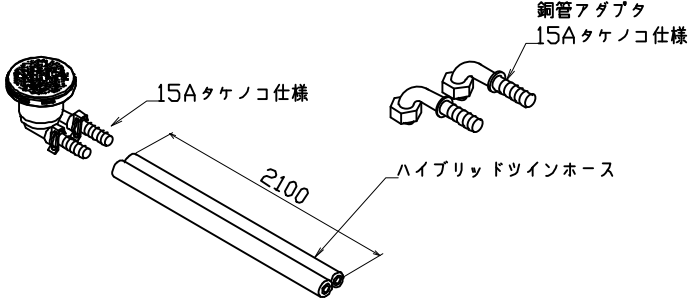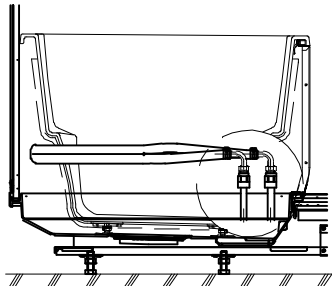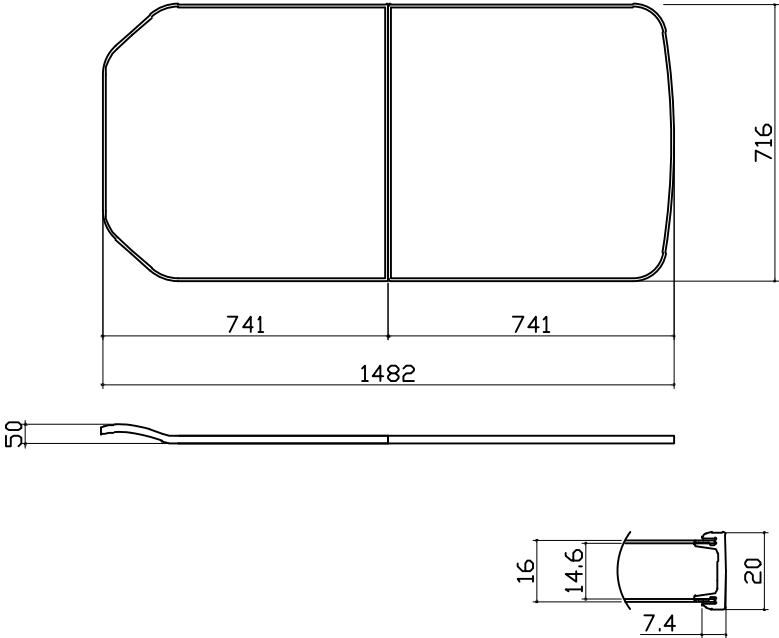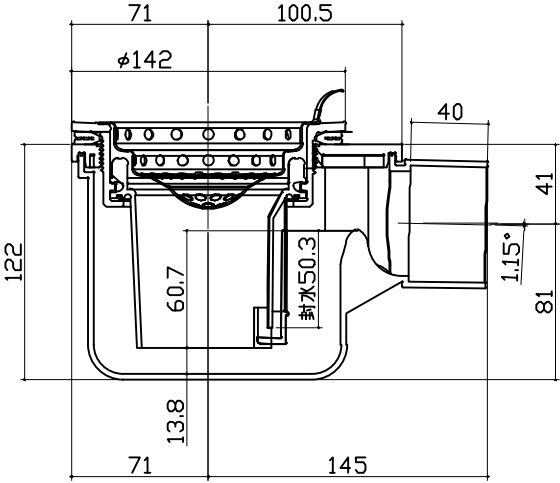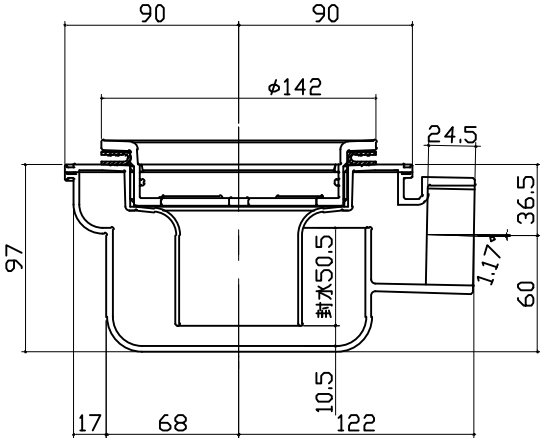ドア外タオル掛け	ドア外タオル掛け 設置位置	循環金具・フロアダプタ関連		
パイプ部材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ） 脚部材質：亜鉛ダイキャスト（クロムメッキ仕上げ）  パイプ部 脚部 22.5 19 54 732.5 10 11.2 710 (取付穴ピッチ) 27.5 14.5	 脱衣室側 ※ハンドル ✦：現地加工φ8 P=710/610 ドア外側からC※710(P=710) ドア外側からC※610(P=610) 浴室ドア 800 1本目取付位置 ハンドルセンター:1000 ※ドア端によりハンドルが無い仕様があります。 ドア吊元枠内側より 15(ハンドル無仕様の場合) 13.5(ハンドル有仕様の場合)	 銅管アダプタ 15Aタケノコ仕様 15Aタケノコ仕様 2100 ハイブリッドツインホース  追焚配管立上図		
風呂蓋 フロアMDVH-16KT	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ		
 716 741 741 1482 50 断面図 16 14.6 7.4 20	 71 100.5 φ142 40 41 1.15° 81 122 60.7 排水50.3 71 138 145	 90 90 φ142 24.5 36.5 1.17° 60 97 17 68 10.5 122 排水50.5		
Takara standard タカスタンダード株式会社	現場名称： 米子-鳥取SR SB1様邸 現場番号： C4456218 鳥取営業所	GRANSPA グランspa プラン番号： 2905B-2405-0117T 担当営業：	部材詳細図 2/3 作成日： 2024年7月30日 担当アドバイザー：	

肩包み湯①

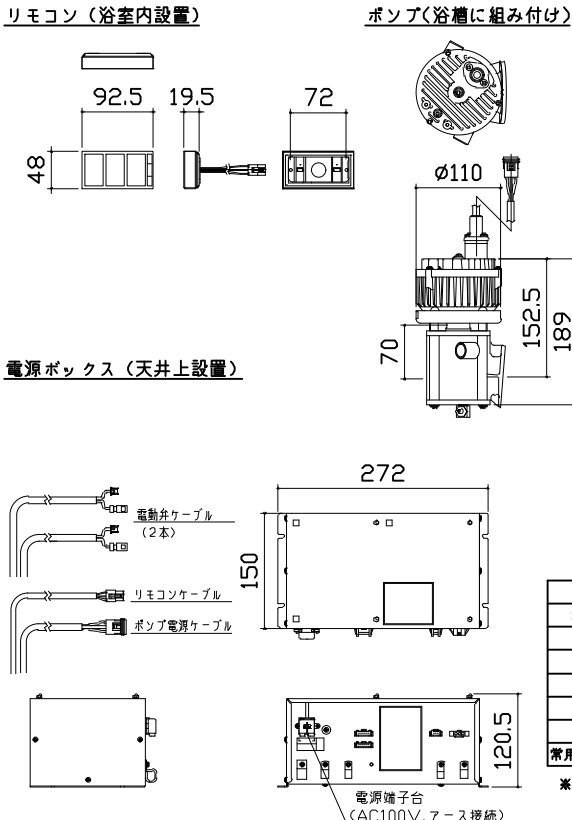

肩包み湯②

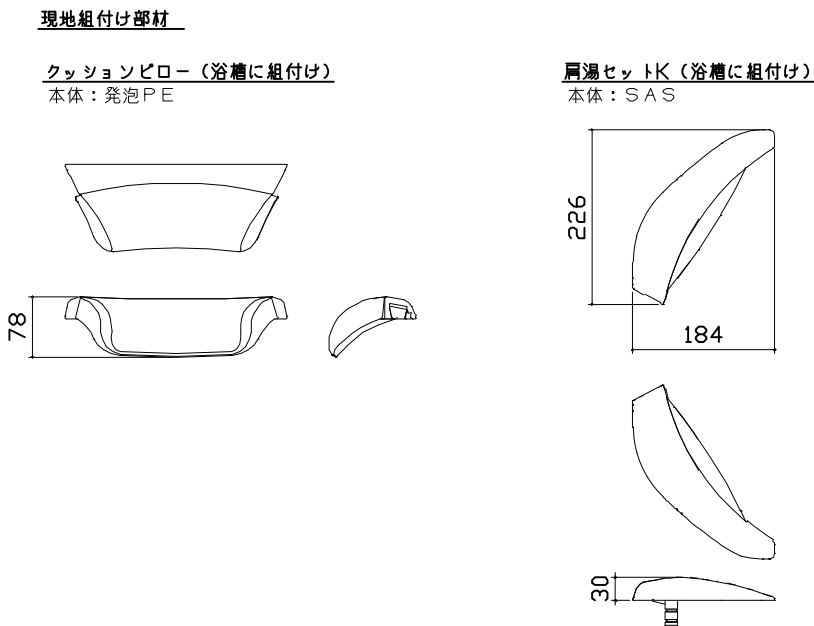

肩包み湯③

