

システムバス 御見積書

御名前 仙台-米沢SR SB6 様

業者 様

商品名 GRANSPA グランspa

商品
御見積金額 ￥720,100 (税込 ￥792,110)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥120,500 (税込 ￥132,550)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	1616(AL勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーブラック
浴槽形状	ラウンド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	ー
カウンター/下カバーカラー	ー
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	コンクリートグレー
パネルカラー(周辺)	ホワイト
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

作成日 2024年4月30日
プラン番号 1319F-2404-0180T
現場番号 C3384831

タカラスタンダード株式会社
◆米沢ショールーム
山形県米沢市窪田町窪田字大豆田1341-15

TEL 0238-27-0262 / FAX 0238-36-0122

◆山形営業所
TEL 023-616-5571 / FAX 023-681-6175

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
米沢SR	米沢SR	米沢SR

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 仙台-米沢SR SB6

様

現場番号	C3384831	プラン番号	1319F-2404-0180T	作成日	2024/4/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸<800幅>(ホワイ)ノ樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キーブクリーンフロア(ハイクラス・カームグレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キーブクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)(シュガーブラック)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	ガス温水式床暖房	なし	1		
19	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂ホース(シルバー)KF9032SJM1 水栓上部カウンター(チャコールグレー)	1	+3,000	+3,000
20	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド:KF9032SJM1	1		
21	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
22	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-47,000	-47,000
23	シャワーフック	シャワーフックKJ	1	+2,000	+2,000
24	シャワーフックスライドバー	なし	1	-5,000	-5,000
25	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1		
26	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
27	天井	高光沢フラット天井	1		
28	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-3,000	-3,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 仙台-米沢SR SB6 様

現場番号	C3384831	プラン番号	1319F-2404-0180T	作成日	2024/4/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	マグネットショートミラー	1	-3,000	-3,000
33	風呂フタ	風呂フタなし	1	-15,500	-15,500
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
35	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
36	収納棚	収納棚なし	1		
37	どこでもラック	シャンプーフック(チャコールグレー)	2	+2,100	+4,200
38	どこでもラック	小物置きM(チャコールグレー)	1	+1,900	+1,900
39	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
40	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
41	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
42	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			43		¥720,100

商品総合計	43	¥720,100
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥120,500 (税込 ¥132,550)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース

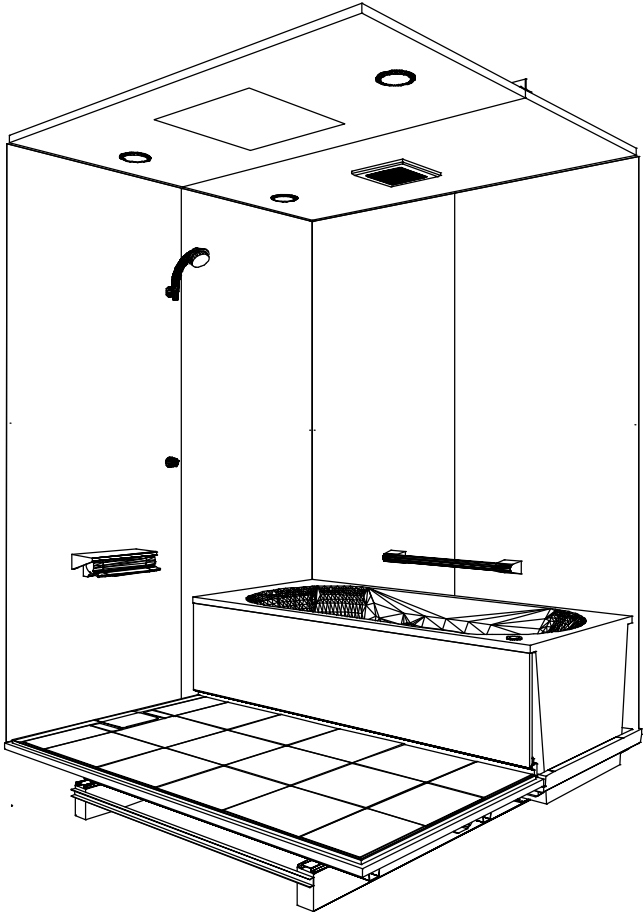

鳥瞰図



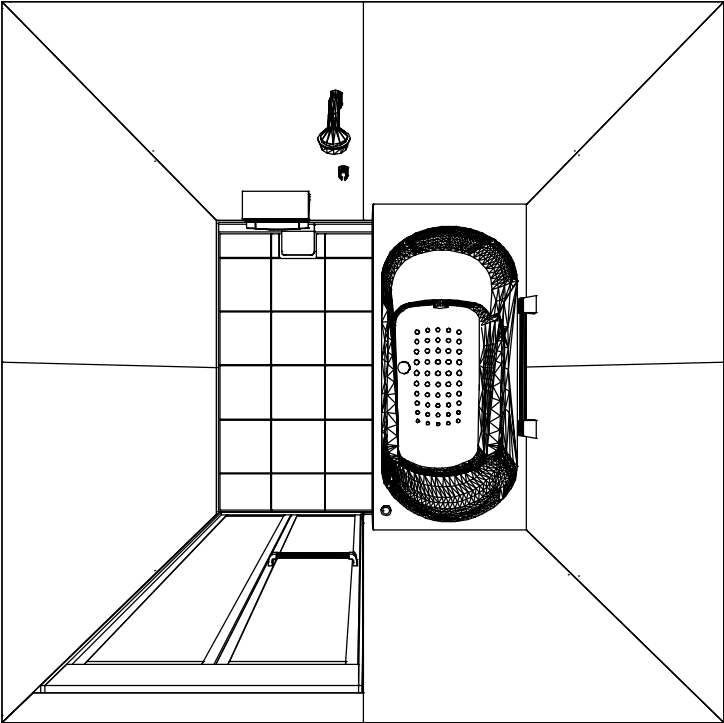


1616

高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。



現場名称： 仙台-米沢SR SB6様邸	GRANSPA グランスバ	姿図
現場番号： C3384831	プラン番号： 1319F-2404-0180T	作成日： 2024年4月30日
米沢ショールーム	担当営業： 米沢SR	担当アドバイザー： 米沢SR



< 平面図 >


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間が架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認願います。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行き・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

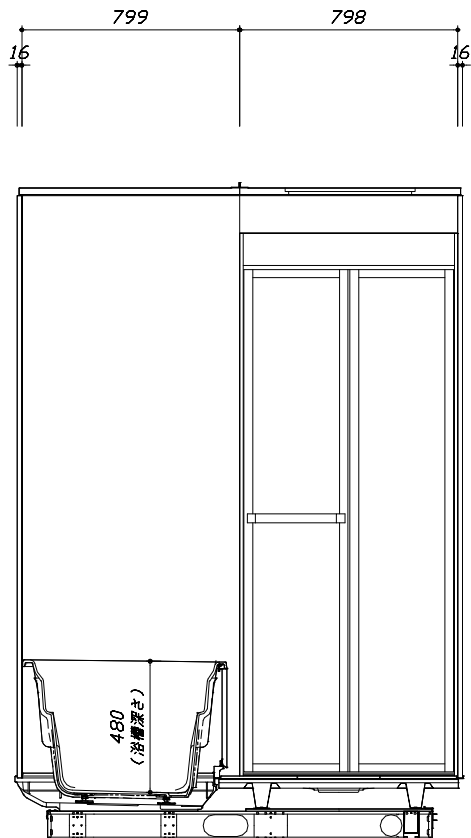

<カウンター対面図>

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

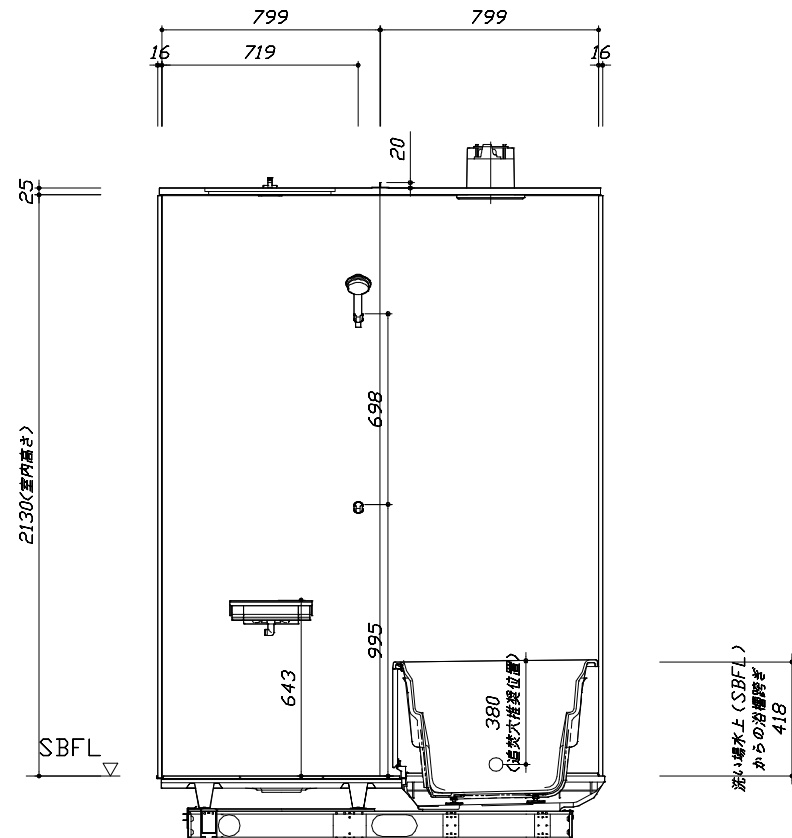

<カウンター面図>

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 仙台-米沢SR SB6様邸
現場番号： C3384831
米沢ショールーム



GRANSPA グランspa
プラン番号： 1319F-2404-0180T
担当営業： 米沢SR

施工図2 縮尺： 1:20
作成日： 2024年4月30日
担当アドバイザー： 米沢SR


縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いいたします。

- ・土間：架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。

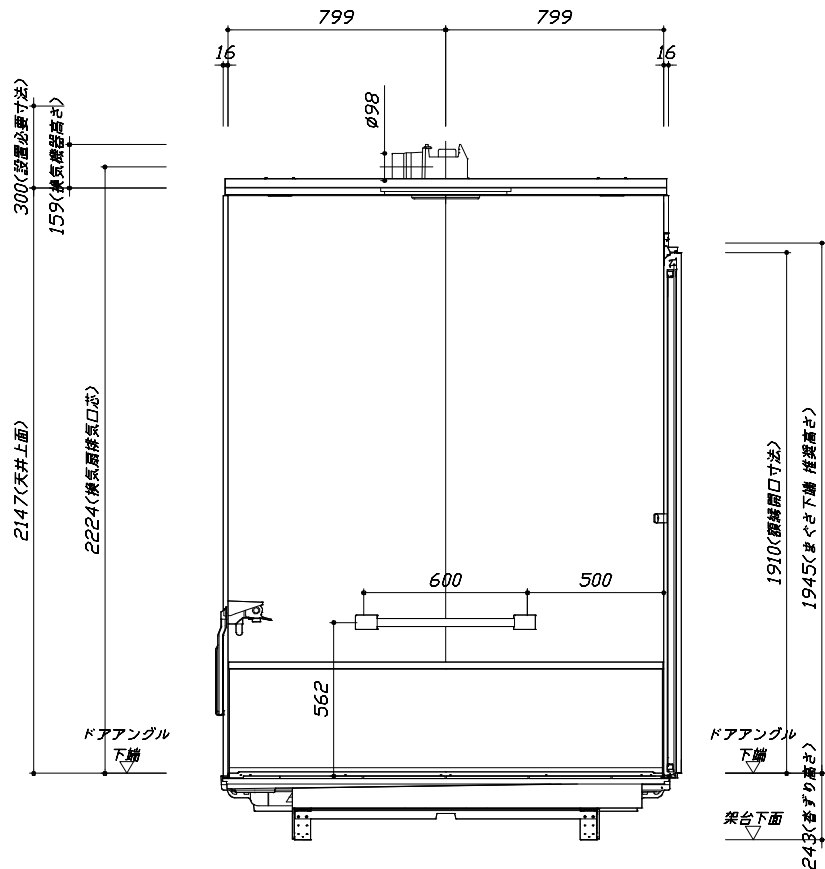

< 浴槽側面図 >

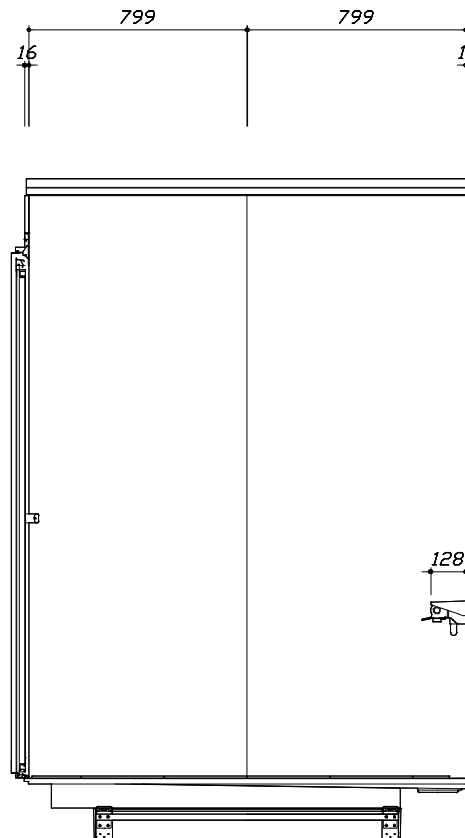

< 洗場側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)

Takara standard
タカラストانダード株式会社

現場名称： 仙台-米沢SR SB6様邸
現場番号： C3384831
米沢ショールーム


GRANSPA グランspa
プラン番号： 1319F-2404-0180T
担当営業： 米沢SR

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2024年4月30日
担当アドバイザー： 米沢SR

縮尺：A3サイズ等倍

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

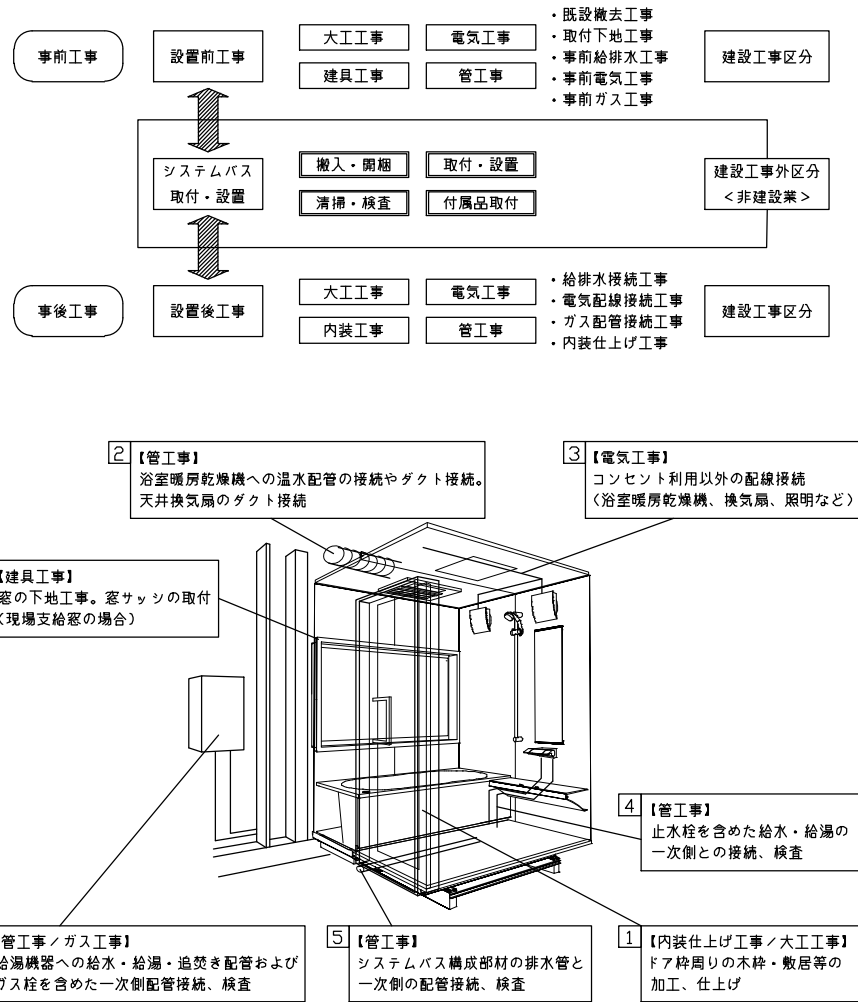


■システムバス 工事区分		参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』									
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事					建設工事外		作業内容
				大工 工事	と び 土 工 事	建 具 工 事	管 工 事	電 気 工 事	給 湯 機 器 設 備	シ ス テ ム バ ス 設 置	
設置前工事	1 2 3	大工 土 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
		管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
システムバス 本体取付・設置			給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
	建設工事 外区分		架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トロッパ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トロッパ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	1 2 3	管	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
		大工	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	4 5 6	電気	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付					○	○		建築の外装仕上げ工事
		管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事					○			給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】					○			浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事（試運転・確認）					○	□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1 3	電気 他	内装仕上げ工事	○	○						床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
			浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】 浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

■ 排水配管工事注意事項


- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項





- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

＜給水立上げイメージ図＞




■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より 265mm 下がりで打設してください。

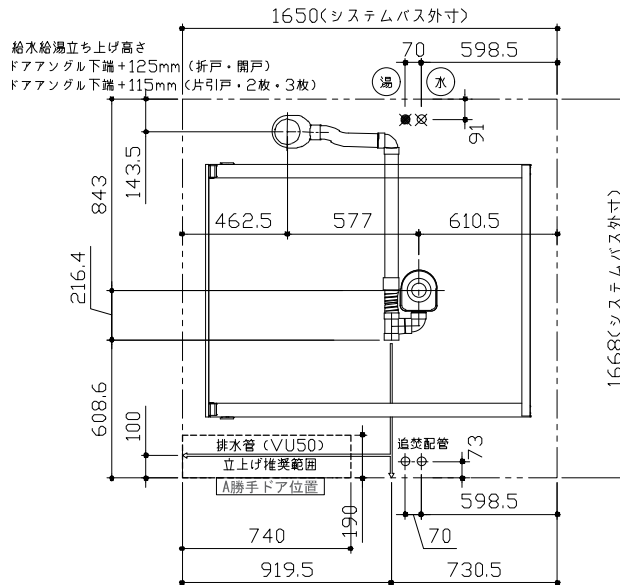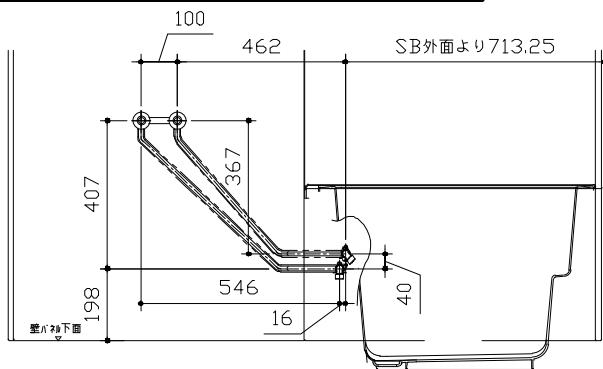

■ 設備記号

記号	記号の意味
×	給水位置
●	給湯位置



＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

＜給水給湯管取合詳細図＞





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

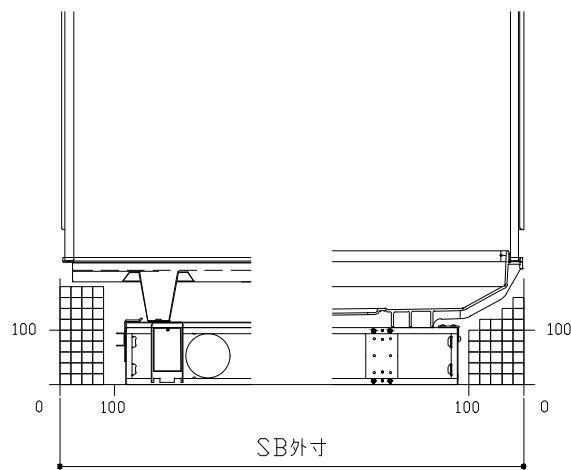


B矢視

A矢視

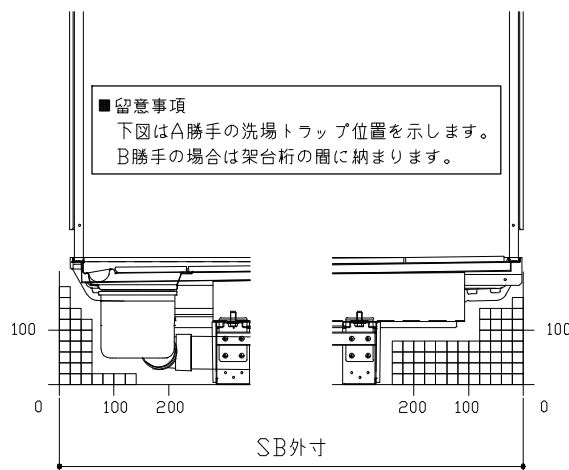

D矢視




C矢視

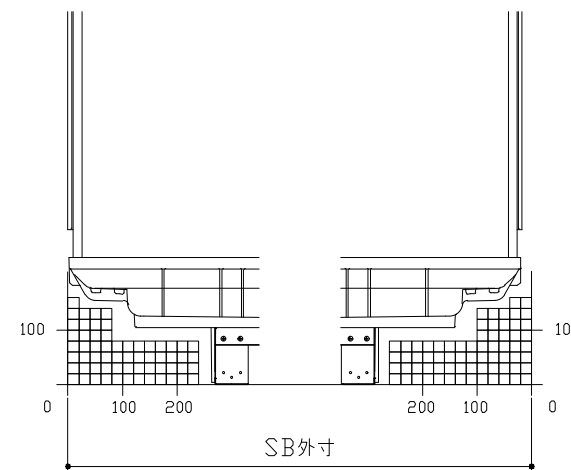

F矢視


E矢視



キープクリーンドア：折戸・上部換気口

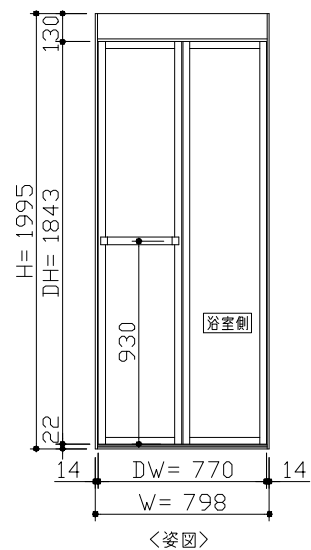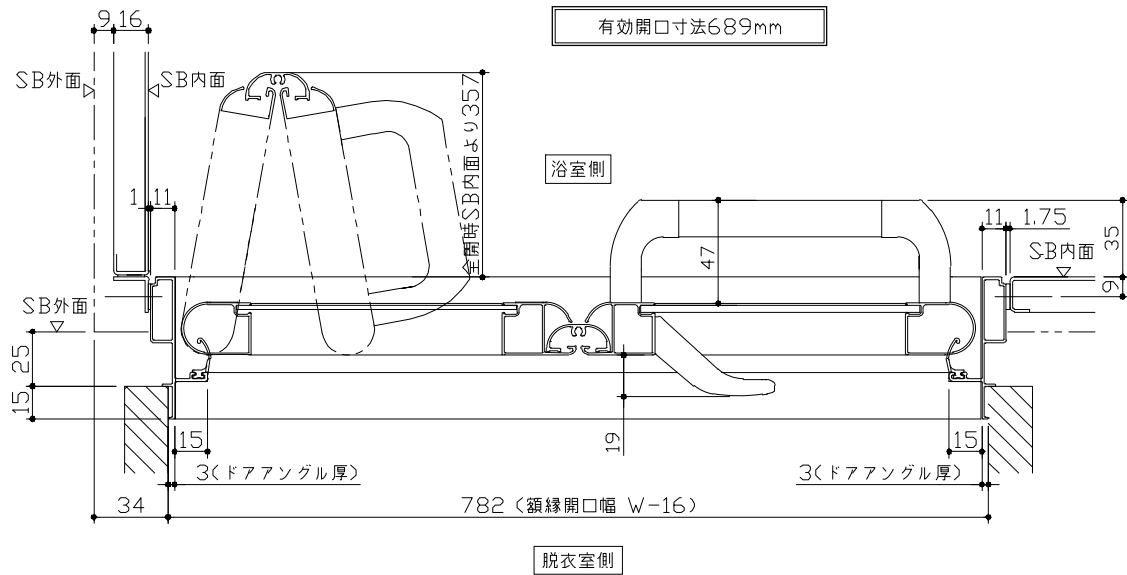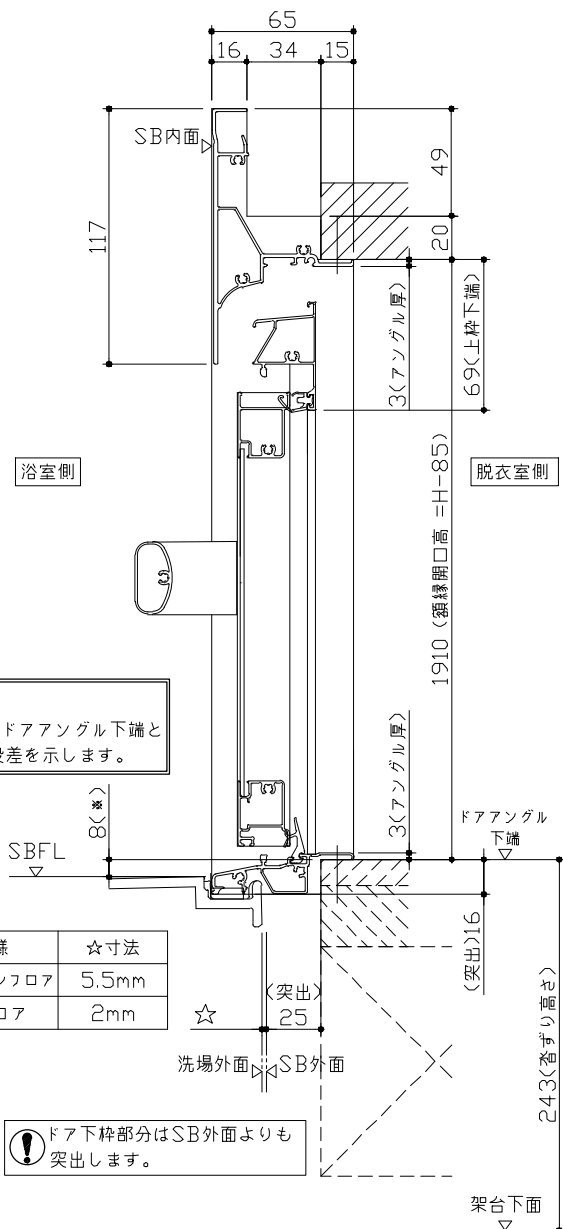

- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
 - ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



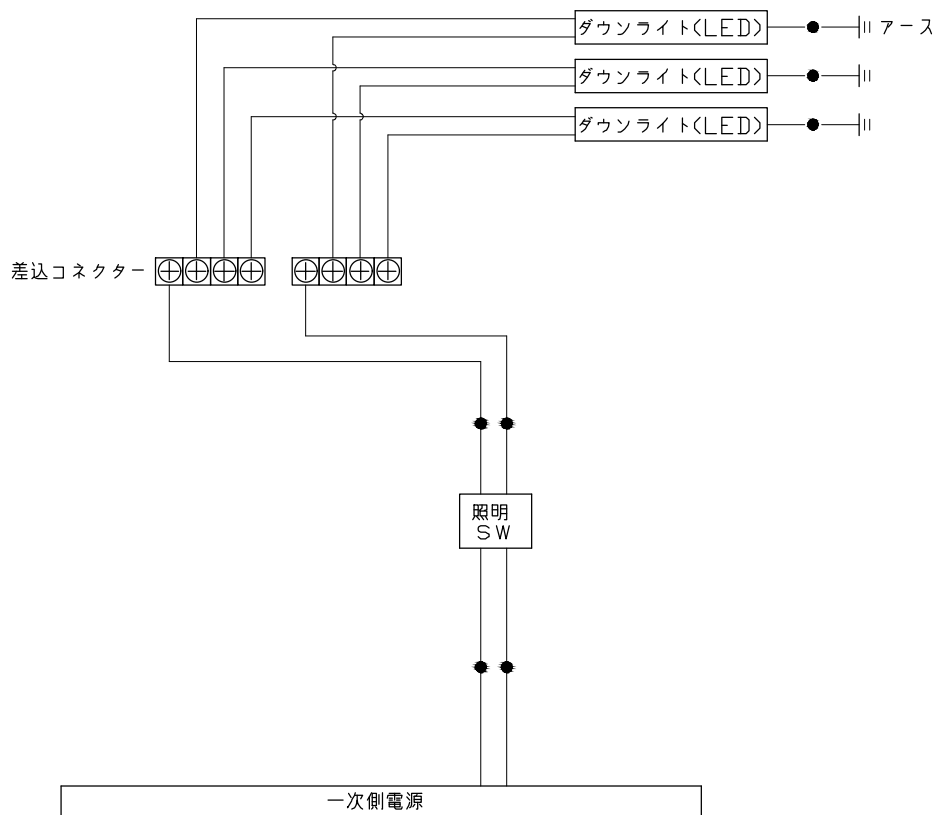

一次側電源から差し込みコネクタ及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

浴槽

※浴槽の取付けは、必ず取付金具（別売）を使用して下さい。

L 1452
C 180
D 750

(サニタ 噴出口)
ジェットバス運転時

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法		
	L	C	D
1593	1520	32.5	35.5
1618	1545	57.5	
1643	1570	82.5	
1668	1595	107.5	
1693	1620	120	48
1718			
1743			
1768			
1793			
1818			
1843			
1868			

規格

25
502
365
280
877.5
330
380
φ50

(サニタ 噴出口)
ジェットバス運転時

(サニタ 吸水口)
ジェットバス運転時

(循環金具穴)
うるぽか湯運転時

418 (高さ寸法)
480 (幅寸法)

※本図は参考図面です

洗い場用水栓

The technical drawing illustrates the dimensions for a sink faucet (洗い場用水栓). It includes a front view on the left and a side view on the right.

Front View Dimensions:

- Overall width: 300
- Three equal segments: 100, 100, 100
- Mounting hole: M22x2

Side View Dimensions:

- Overall height: 117
- Mounting plate height: 78.5
- Spout height: 35.5
- Spout width: 127.5
- Spout diameter: $\phi 160$
- Spout inner diameter: $\phi 105$
- Spout thickness: 66
- Spout offset: 45.5
- Spout material: PJ1/2
- Panel height: 605
- Panel bottom: パネル下面

照明

ダウンライト
LED 4.1W (1灯あたり)

The diagram is a cross-sectional view of a recessed LED downlight. It shows the light fixture installed into a ceiling. Key dimensions and labels include:

- $\phi 75$ (天井開口): Diameter of the ceiling opening.
- $\phi 85$: Diameter of the base of the light fixture.
- 64: Total height of the fixture from the ceiling to the bottom of the light source.
- 25: Height of the base plate from the ceiling.
- 3: Thickness of the base plate.
- 天井厚み: Ceiling thickness.

換気機器

管工事

Technical drawing of a ventilation unit installation. The drawing shows a side view of the unit mounted on a base. Key dimensions and components are labeled:




- Overall width: 109
- Overall height: 184
- Base width: 250 (indicated as $\phi 250$)
- Base height: 25 (indicated as 天井厚み)
- Unit height: 159
- Unit width: 174
- Unit depth: 69
- Unit diameter: $\phi 98$
- Unit thickness: 42
- Unit height from base: 77


ミラー

ミラー：樹脂ミラー、表面防曇コートなし
（鏡面：PETフィルム、基材：スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板）

The drawing shows two views of a mirror assembly. The front view on the left is a rectangle with a height dimension of 570 (鏡本体) and a width dimension of 260 (鏡本体). Inside this rectangle, there is a smaller rectangle with a width dimension of 250 (マグネットシート). The side view on the right shows the profile of the mirror, with a height dimension of 300 (マグネットシート). A label '鏡' with an arrow points to the top edge of the mirror assembly.

ハンドバー支持部取合詳細図

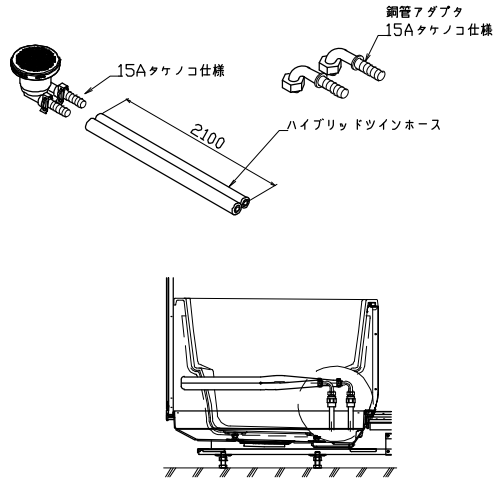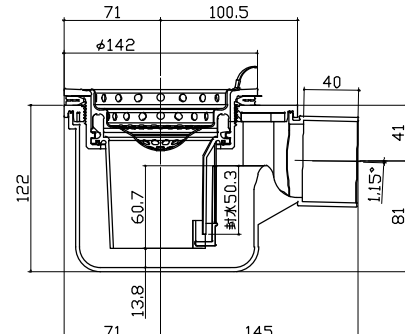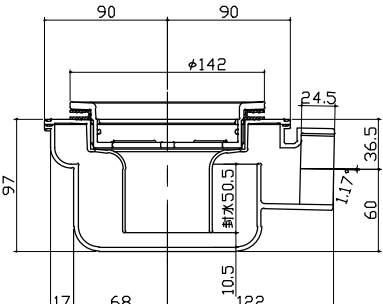循環金具・フロアダプタ関連	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ		
 銅管アダプタ 15Aタケノコ仕様 15Aタケノコ仕様 ハイブリッドツインホース 2100 追焚配管立上図				
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 仙台-米沢SR SB6様邸	GRANSPA グランspa	部材詳細図	2/2
	現場番号： C3384831	プラン番号： 1319F-2404-0180T	作成日： 2024年4月30日	
	米沢ショールーム	担当営業： 米沢SR	担当アドバイザー： 米沢SR	

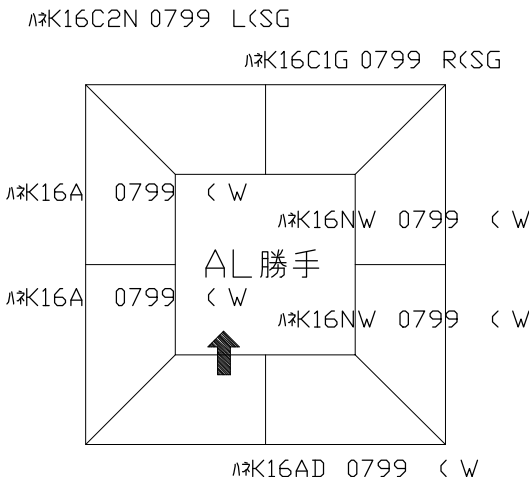パネル割図		シャーフック		
ΛK16C2N 0799 L<SG ΛK16C1G 0799 R<SG ΛK16A 0799 < W ΛK16NW 0799 < W AL勝手 ΛK16A 0799 < W ΛK16NW 0799 < W ΛK16AD 0799 < W 		ΛK16C2N 0799 L<SG 799 80 1701 1678 1003 980 現地加工: φ3.5 
