システムバス 御見積書

御名前　グランスパ カタログプラン　様

業者　様

商品名　GRANSPA　グランスパ

プラン番号　1005Z-2502-0617F　タカラスタンダード株式会社
現場番号　C3639452

商品
御見積金額　¥1,531,300　（税込 ¥1,684,430）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　¥183,000　(税込 ¥201,300)

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
　　又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616（BL勝手）
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	グランホワイト
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	クリスタルパールホワイト
浴槽形状	ラウンド浴槽
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ダークグレー　/　ブラック
浴槽前カウンターカラー	－
エプロン材質/カラー	ステンレス　/　ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー（正面）	ジオマーブルアイボリー
パネルカラー（周辺）	パールホワイト
ガス種　/　周波数	未定　/　未定

◆ 備考

戸建　01

◆ 御確認事項

No.*

御名前 グランスパ カタログプラン 様

現場番号	C3639452	プラン番号	1005Z-2502-0617F	作成日	2025/2/25

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸＜800幅＞(ブラック)／強化ガラス(透明)(19サイズ)	1	+59,500	+59,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・グランホワイト)	1	+20,000	+20,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽) (クリスタルパールホワイト)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり) (ブラック)	1		
11	浴槽形状	人大ラウンド浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	あり クッションピロー:チャコールグレー	1	+199,000	+199,000
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	1本仕様	1	+10,000	+10,000
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	タッチ水栓:樹脂製ホース(メタル調)FTB230K 水栓上部カウンター(ダークグレー)	1	+99,000	+99,000
19	洗い場用水栓	ｴｺｼｬﾜｰ(節水+手元止水+3Way):KVK FTB230KE	1	+13,000	+13,000
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	＜手すりタイプ＞(T1020S MH)	1	+9,000	+9,000
23	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザインハイクラス)(Kパネル)	1	+55,000	+55,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	窓枠フリー	窓枠フリー(樹脂タイプ)L1512 B＜ﾌﾞﾗｯｸ色＞	1	+21,000	+21,000
26	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
27	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)ブラック	1	+52,500	+52,500
28	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
29	換気機器開口	工場開口	1		
30	照明	ストレートライン照明(調光・調色機能付・ラグジュアリーミラー対応用)	1	+91,000	+91,000
31	天井照明開口	工場開口	1		

御名前 グランスパ カタログプラン 様

現場番号	C3639452	プラン番号	1005Z-2502-0617F	作成日	2025/2/25

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	ミラー	ラグジュアリーミラー（全幅タイプ）	1	+117,000	+117,000
33	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
34	タオル掛け	タオル掛けなし	1	−1,000	−1,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	どこでもラック	タオルハンガーL（チャコールグレー）	1	+2,800	+2,800
37	風呂フタフック	風呂フタフック（固定式）（チャコールグレー）	1	+4,000	+4,000
38	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
39	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
40	トラップカバー	なし	1		
	システムバス合計		40		¥1,531,300

商品総合計		40	¥1,531,300

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費 ¥183,000（ 税込 ¥201,300 ）

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

（ ）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

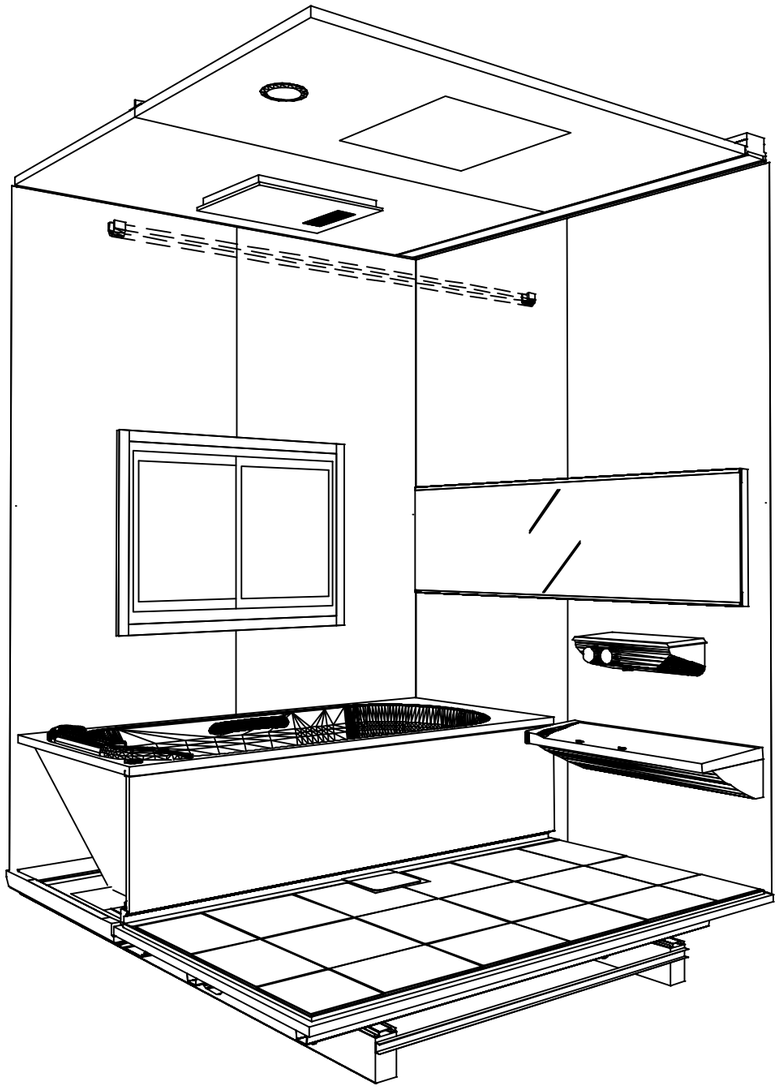

鳥瞰図

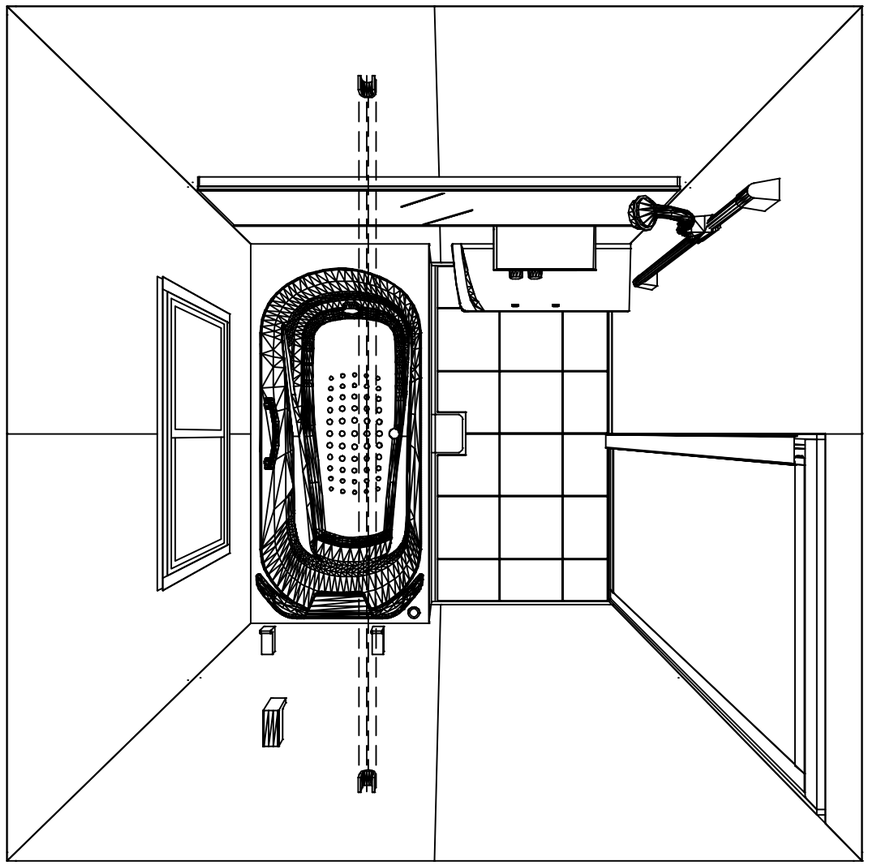

1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	姿図
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日
	本　社　（代表）	担当営業　：	担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

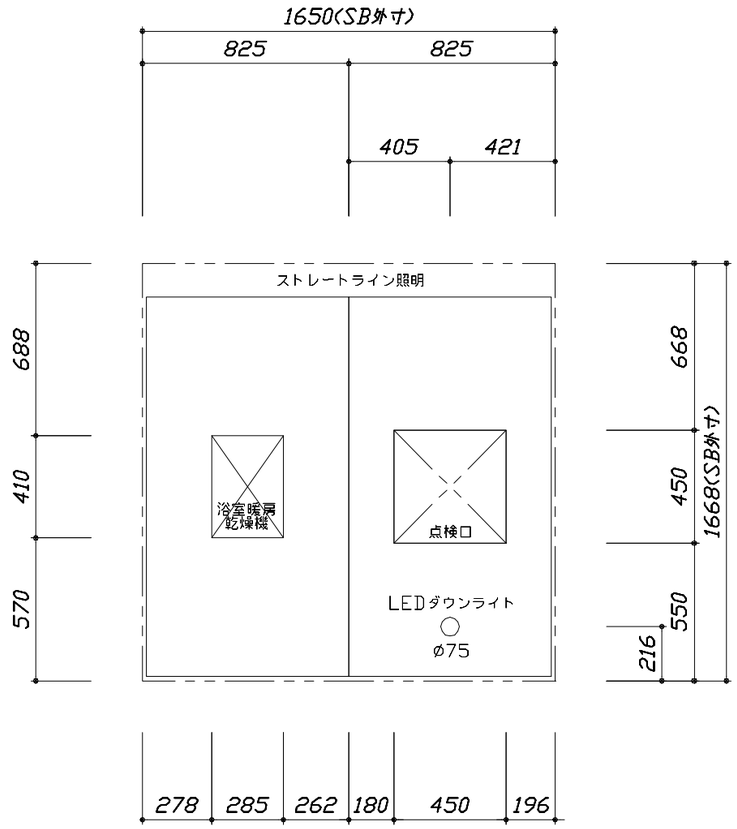

＜天井伏図＞

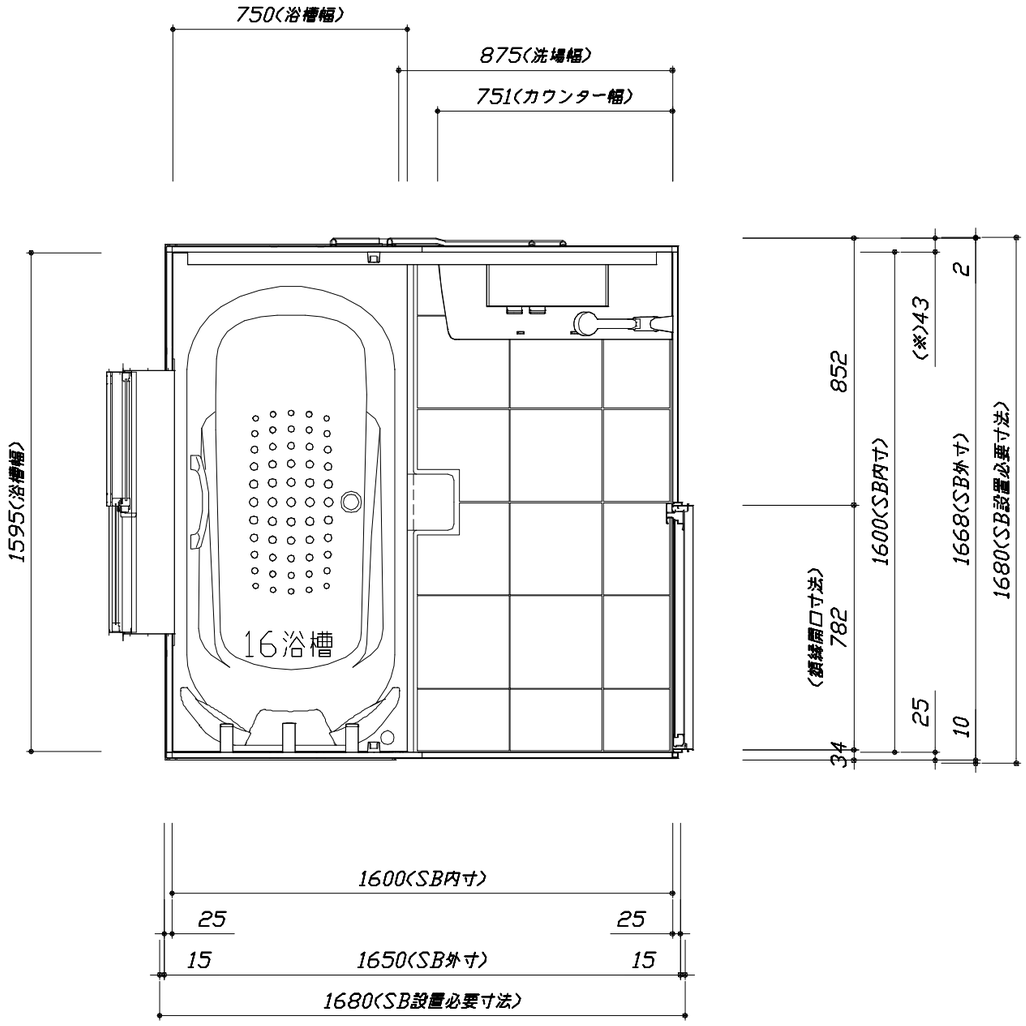

＜平面図＞

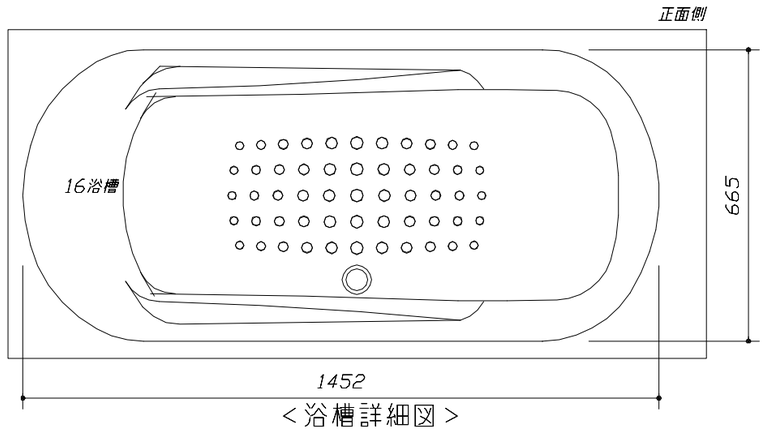

＜浴槽詳細図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	施工図1	縮　尺： 1:25,20
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日	
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
　大きさ、設置位置等確認お願いします。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



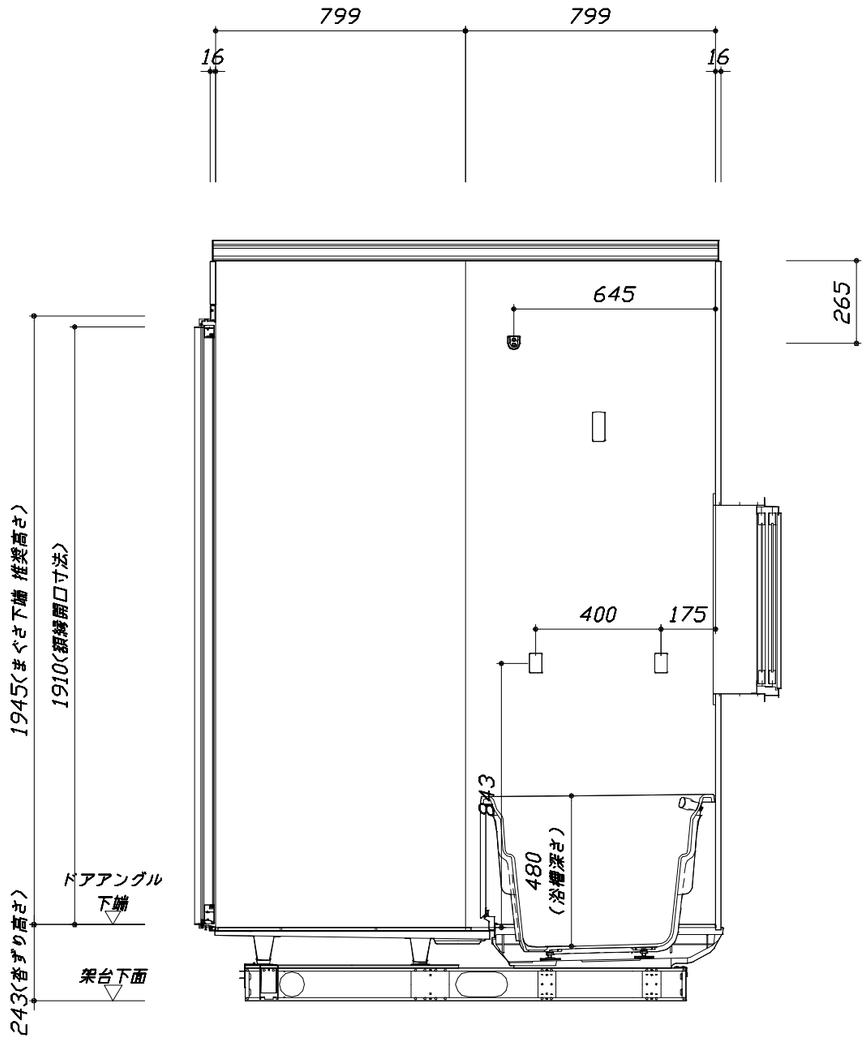

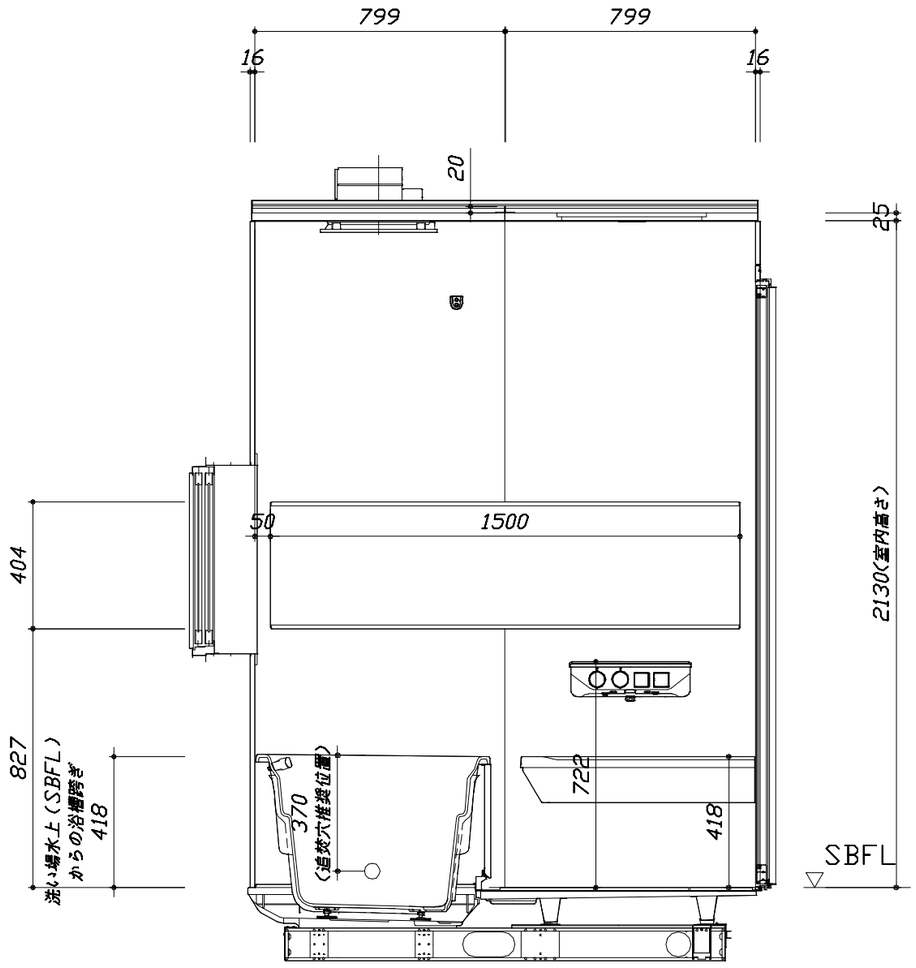

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

＜カウンター対面図＞

＜カウンター面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	施工図2	縮　尺： 1:20
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日	
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・浴槽側面の窓は参考です。窓は現地手配となります。
　大きさ、設置位置等確認お願いします。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。

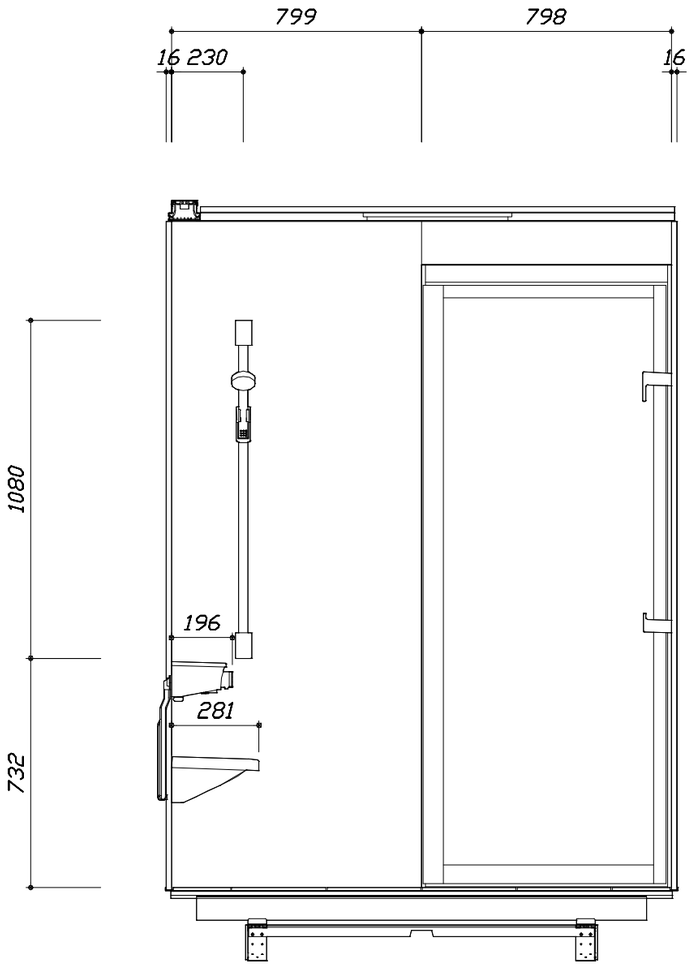

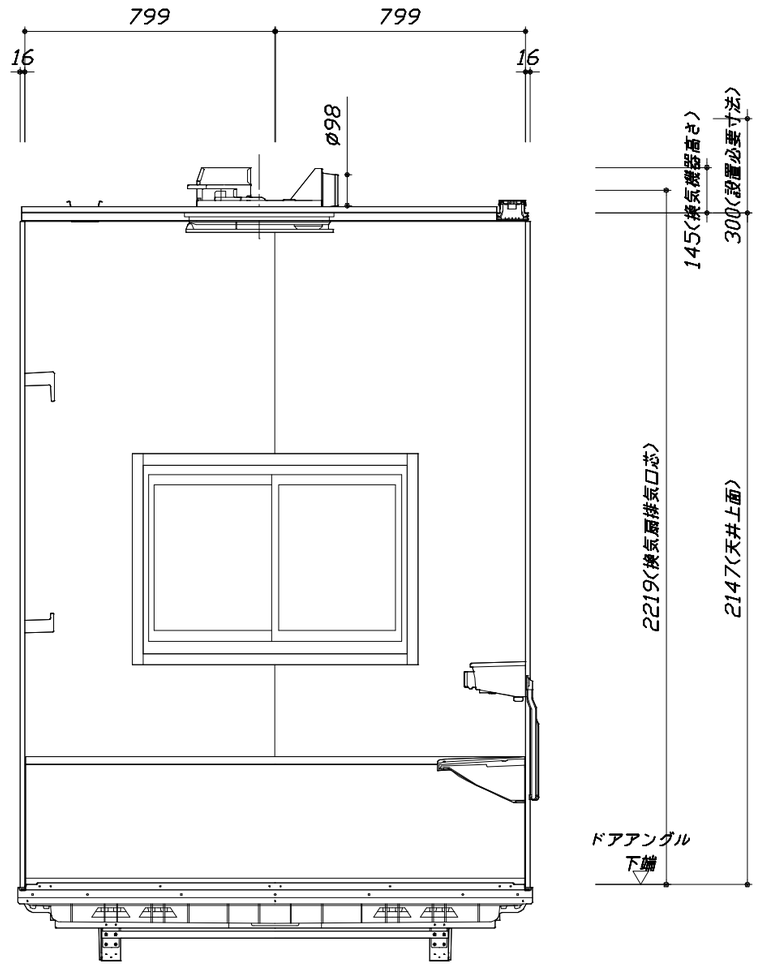

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

＜洗場側面図＞

＜浴槽側面図＞



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	施工図3	縮　尺： 1:20
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日	
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BL勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼　保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ラウンド浴槽 グリップ付（305リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング)　 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー　裏面保温材　タオル掛け穴:なし
天井	化粧ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	ｷｰﾌﾟｸﾘｰﾝﾄﾞｱ:19高さ開き戸(ｱﾙﾐ框/飛散防止ﾌｨﾙﾑ付強化ｶﾞﾗｽ/ﾀﾃ型換気口)
窓１	現地手配
窓２	―
窓枠１	ABS樹脂　B：ブラック
窓枠２	―
排水トラップ	洗い場:ＡＢＳ樹脂,　浴槽:ＡＳＡ樹脂　　封水50㎜
雑排水配管	硬質塩ビパイプ　VU50
製品重量	300kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ラグジュアリーミラー　くもり止め加工（13W）
収納棚	―
タオル掛け	―
洗場側水栓	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ(KVK FTB230KE)(樹脂ﾎｰｽ:ﾒﾀﾙ調)
浴槽側水栓	―
兼用水栓	―
ﾌｯｸ/ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰT1020S MH）
照明	ストレートライン照明（LED　23.7W調光･調色機能付）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V･最大消費電力1250W)(ﾀﾞｸﾄ径φ98)（常時換気対応品)ブラック
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	―
ハンドバー②	―
ハンドバー③	―
ハンドバー④	―
ハンドバー⑤	―
ハンドバー⑥	―
ハンドバー⑦	―

本体カラー

浴槽	WN：クリスタルパールホワイト
カウンター	KA：ダークグレー
ﾊﾟﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	JDS：ジオマーブルアイボリー
ﾊﾟﾈﾙ(周辺･3面)	VW：パールホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	KA：ダークグレー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	PW：グランホワイト
ドア / 天井	B：ブラック / B：チャコールブラック
収納棚	―
タオル掛け	―
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	ホワイト

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

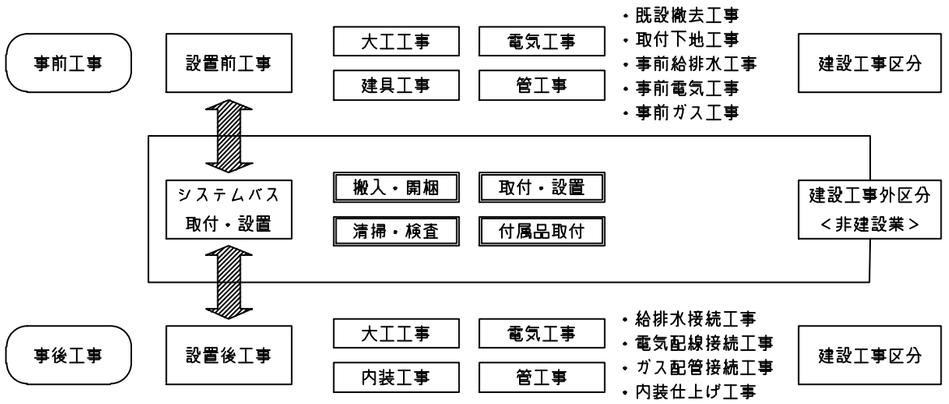

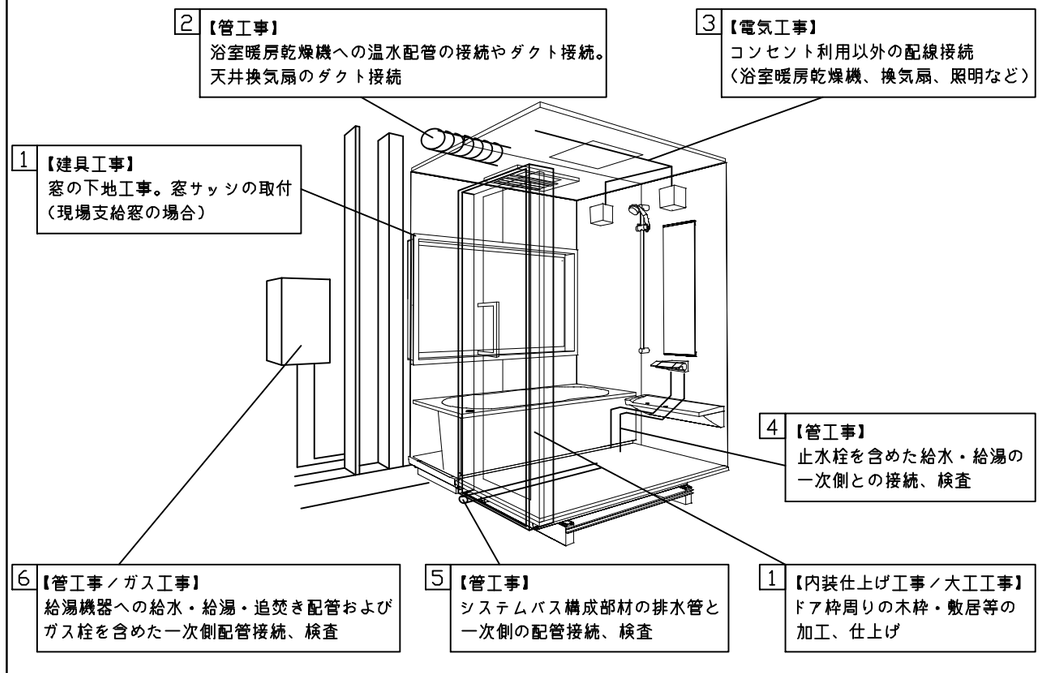

■システムバス　工事区分　　参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位（図）	業種区分	作業名称（区分）	建設工事 大工工事	建設工事 とび土工工事	建設工事 建具工事	建設工事 管工事	建設工事 電気工事	建設工事外 給湯機器設備	建設工事外 システムバス設置	作業内容
設置前工事		大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
	1	管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
	2		換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
	3		給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス本体取付・設置		建設工事外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置　【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付　【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付　【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付　【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付　【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査　【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事		管 大工 電気	建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
	1		排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
	2		浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	3		浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	5		建築側排水配管との接続工事　【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
	6		給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
	3		浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：　グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	工事区分表
現場番号：　C3639452	プラン番号：　1005Z-2502-0617F	作成日：　2025年2月25日
本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：

■ 排水配管工事注意事項

●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
●2重トラップにしないでください。
●配管途中で配管径を狭めないでください。
●排水勾配は1/100～1/50設けてください。
●排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
●給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27㎜以下にしてください。

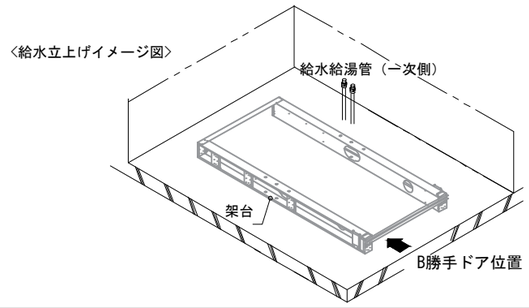

■土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より２６５㎜下がりで打設してください。

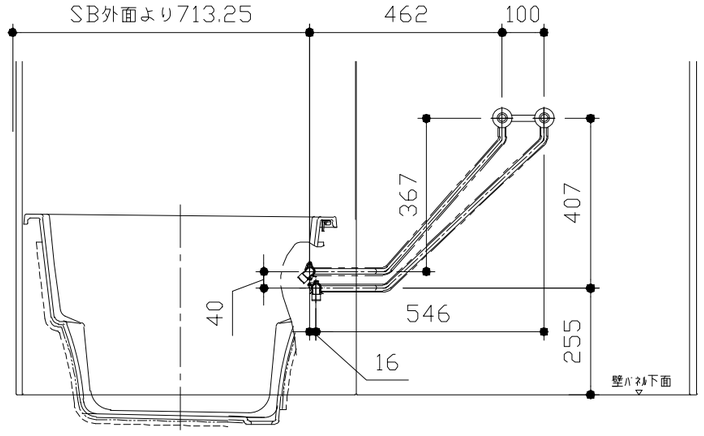



ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	239
片引戸・２枚引戸・３枚引戸	230

〈給水給湯管取合詳細図〉

■設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
◙	給湯位置

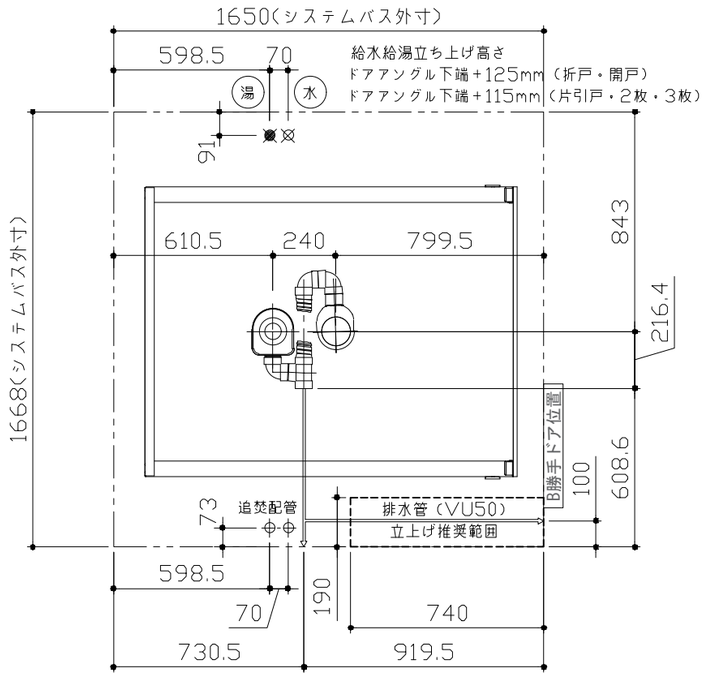

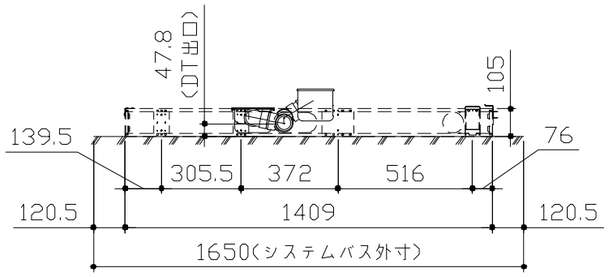

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	排水配管図
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：

■必ずご確認ください
（１）図面の見方
・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
・マス表示：ロ=20mm角

（２）留意事項
・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。







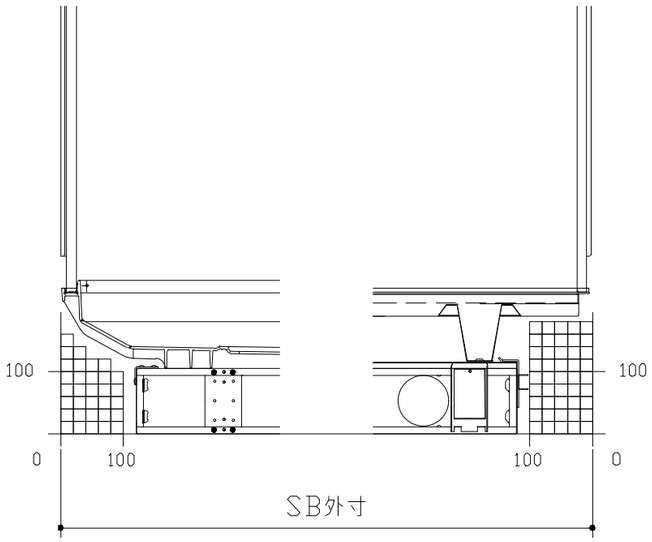

■留意事項
下図はA勝手の洗場トラップ位置を示します。
B勝手の場合は架台桁の間に納まります。

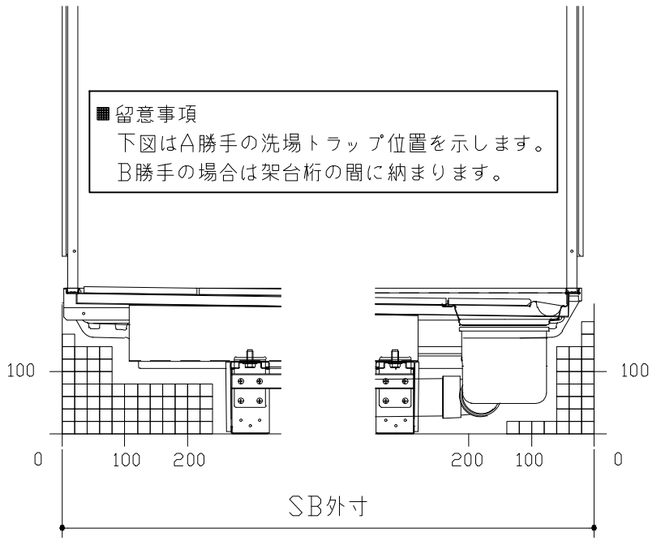

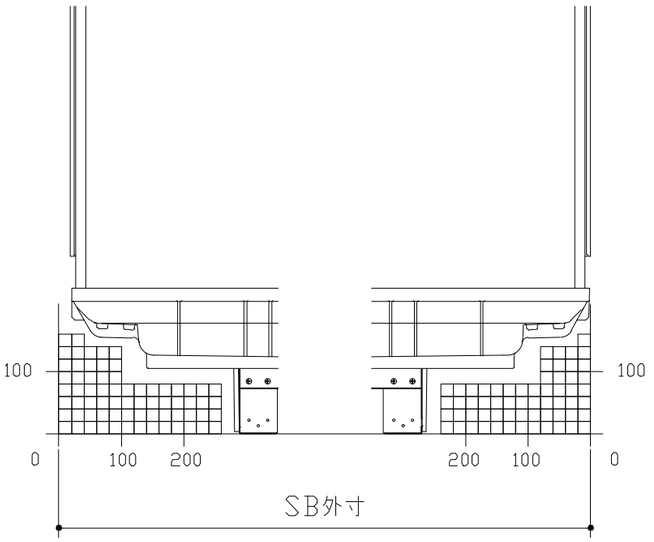

A矢視　B矢視　C矢視　D矢視　E矢視　F矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	床下空間図
	現場番号：　C3639452	プラン番号：　1005Z-2502-0617F	作成日：　2025年2月25日
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

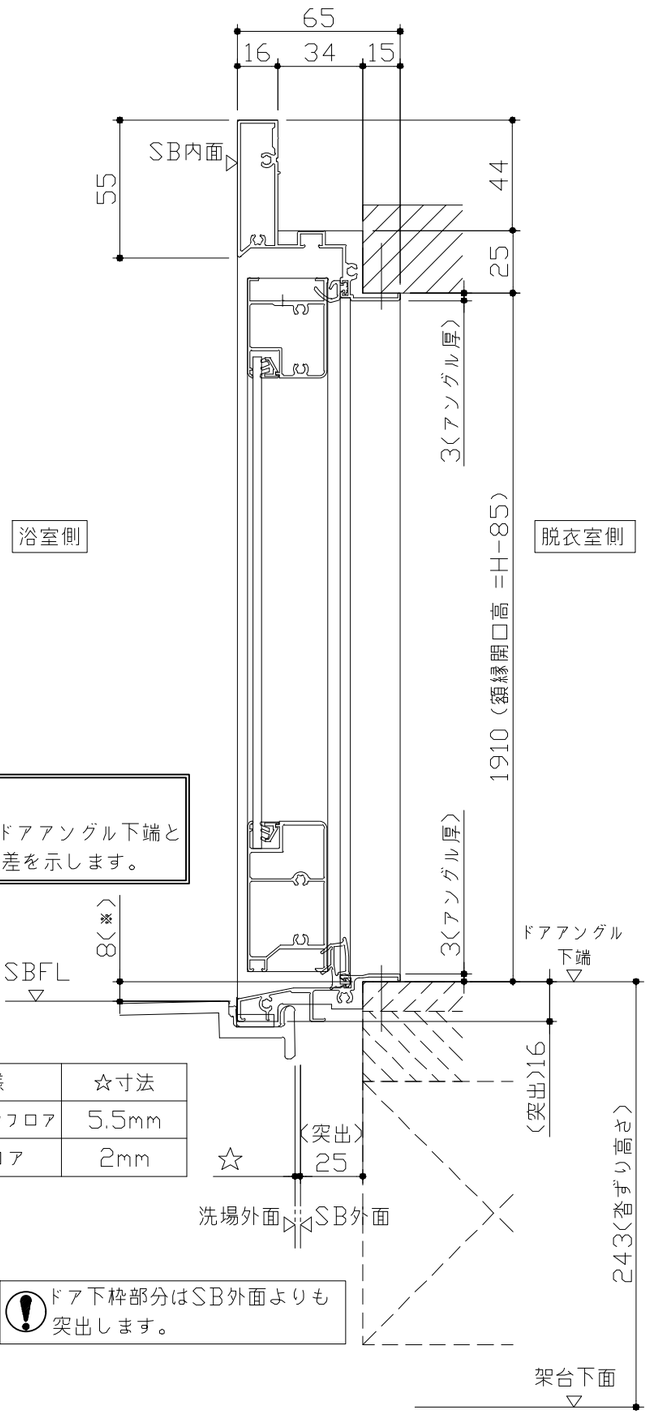

■留意事項
※印寸法はドアアングル下端と
SBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

ドア下枠部分はSB外面よりも
突出します。

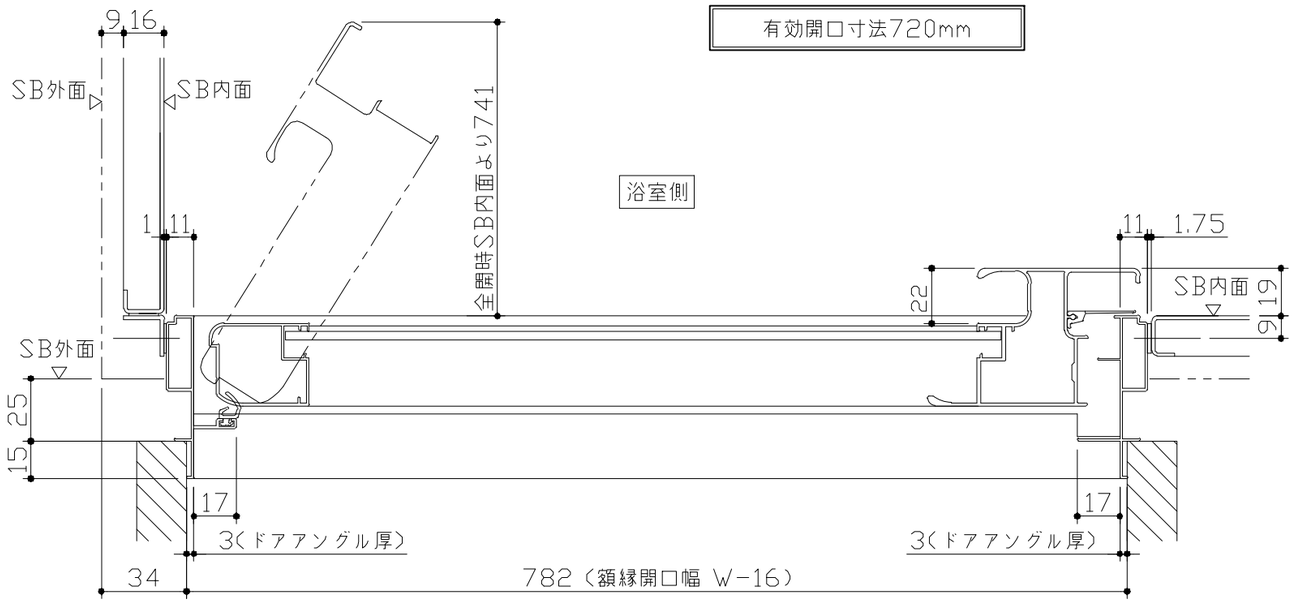

ﾄﾞｱ開き角度65°以上でタオル掛けと
干渉の恐れがあります。

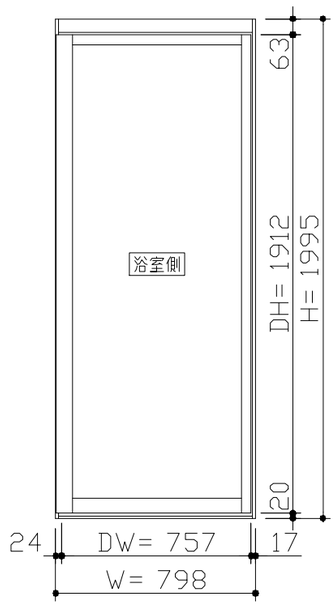

〈姿図〉

■ドア横の管柱、間柱について
- ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	ドア取合詳細図
現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日
本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：

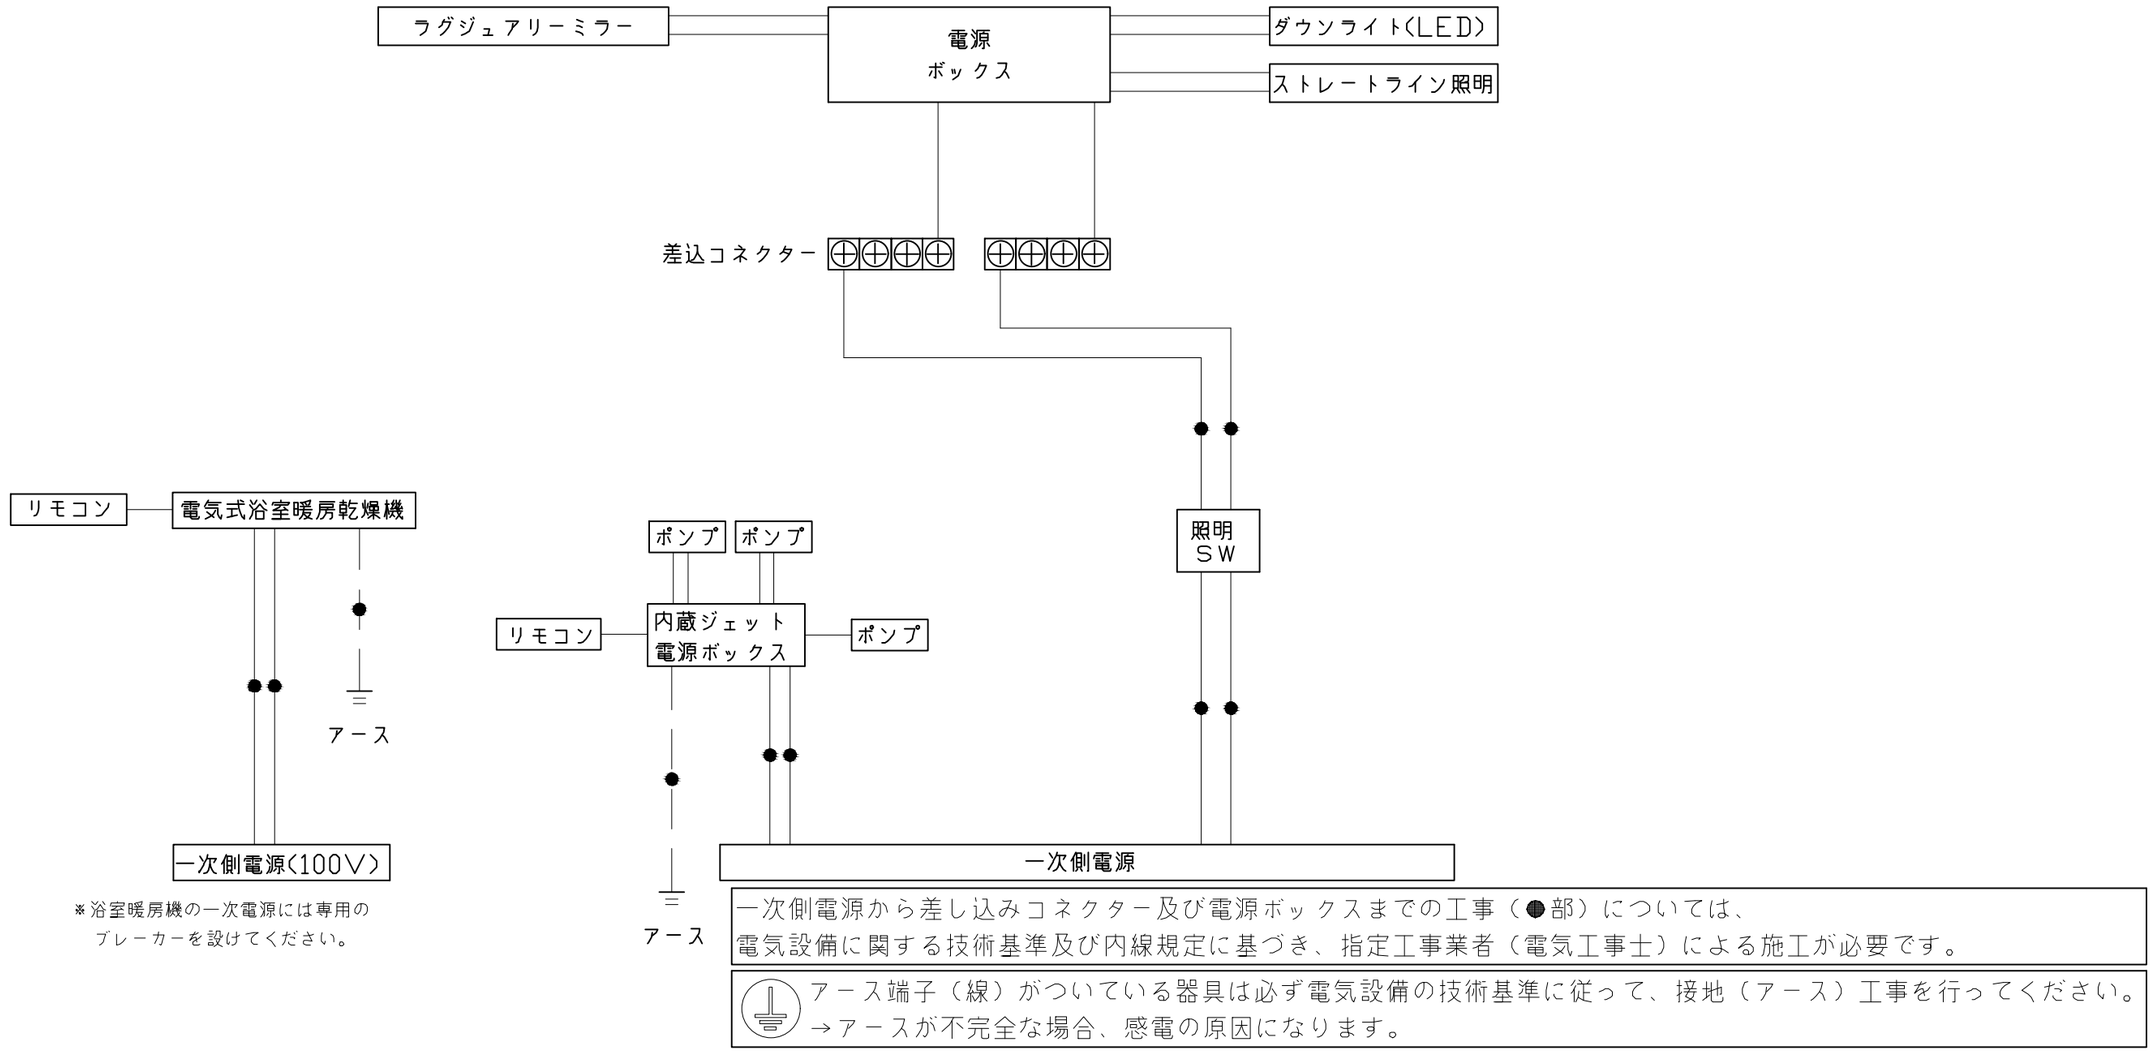

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、
電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ　カタログプラン様邸	GRANSPA　グランスパ	電気配線図
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：

浴槽

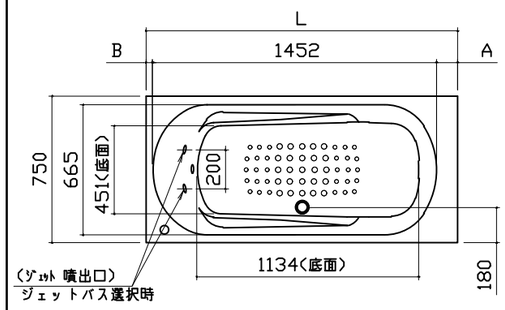

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法 L	A	B
1593	1520	32.5	35.5
1618	1545	57.5	
1643	1570	82.5	
1668	1595	107.5	
1693	1620	120	48
1718			
1743			
1768			
1793			
1818			
1843			
1868			

規格

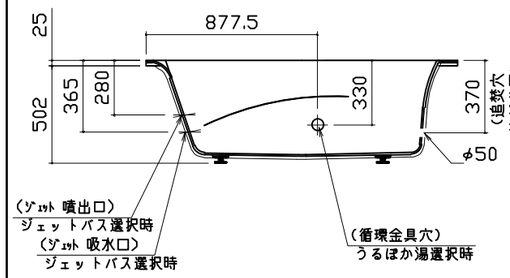



本図は参考図面です

洗い場用水栓



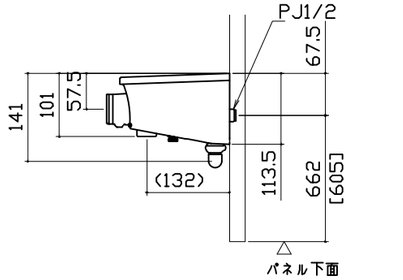

※[]内寸法はカウンターが無い場合

照明

ストレートライン照明
LED 23.7W（ダウンライト1灯含む）

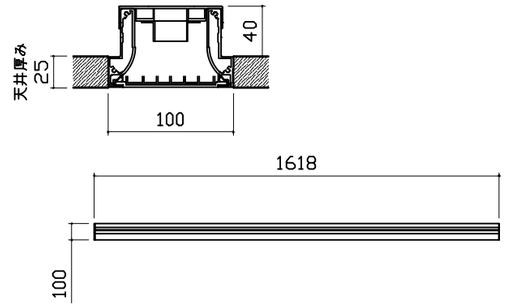

ダウンライト



換気機器

リモコンコード長さ：5m
外形：縦120mm×横116mm

管工事

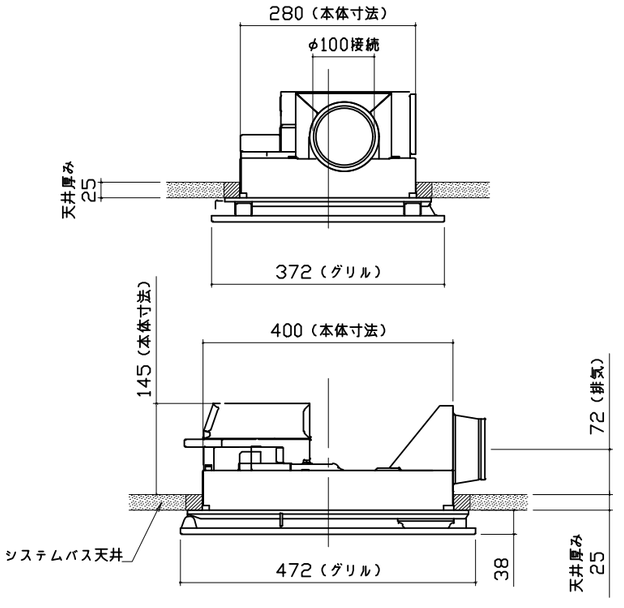

シャワーフックスライドバー

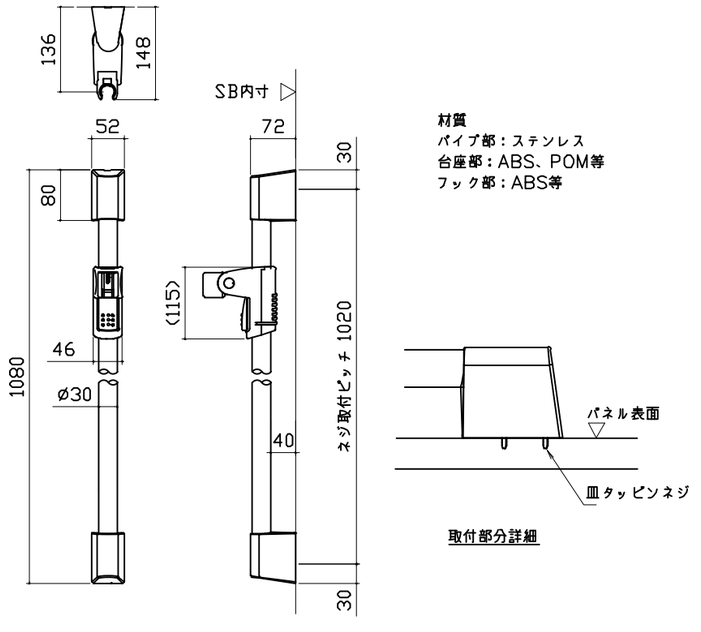

ミラー

枠：SUS304 t0.8、PMMA
ミラー：表面防曇コートあり
LED：13W

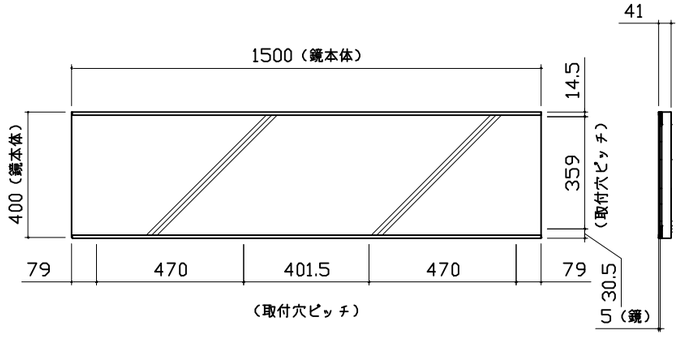

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ カタログプラン様邸	GRANSPA グランスパ	部材詳細図 1/3
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日
	本 社 （代表）	担当営業 ：	担当アドバイザー：

窓枠フリー

※[ ]寸法はそれ以下に現地加工することができます。
※末尾 E：フクビ化学工業製　NW/NG/NB：キョーセー製
材質：窓枠本体/カバー　AESコートABS　…L1512(E/NG/NB)
　　AASコートABS　…L1512(NW)
　　コーナーピース部　ABS　…(E/NW/NG/NB共通)

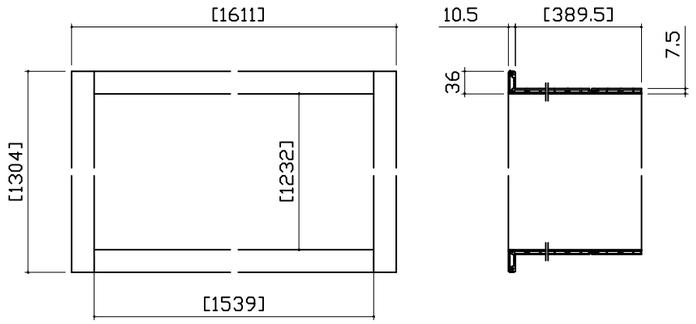

循環金具･フロアダプタ関連

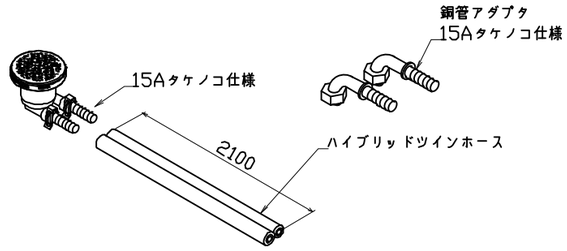



追焚配管立上図

風呂蓋　フロフタMDVH-16KT

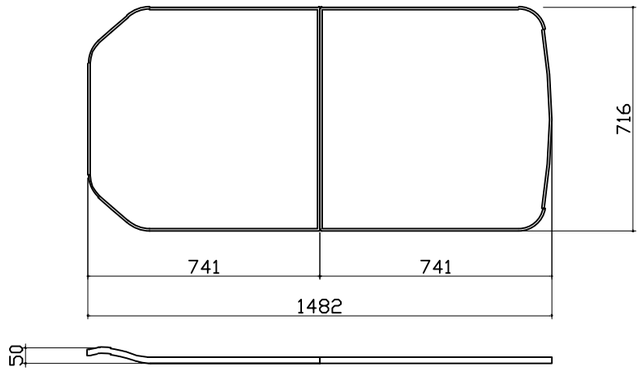



断面図

洗い場側排水トラップ

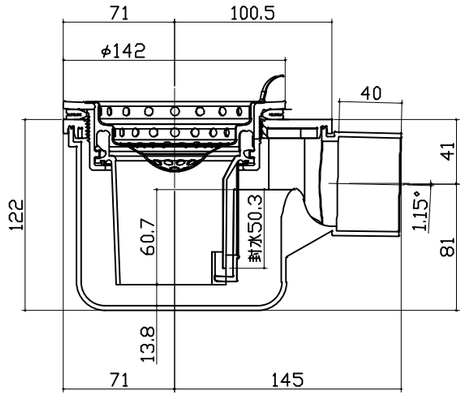

浴槽側排水トラップ

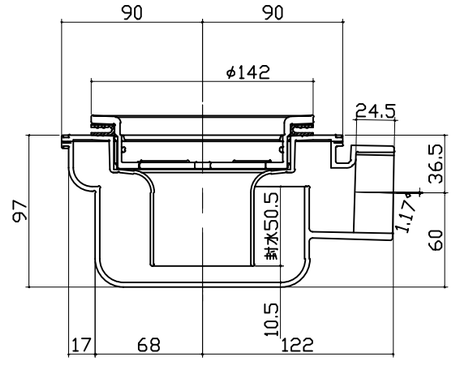

肩包み湯①

リモコン（浴室内設置）



ポンプ(浴槽に組み付け)



電源ボックス（天井上設置）

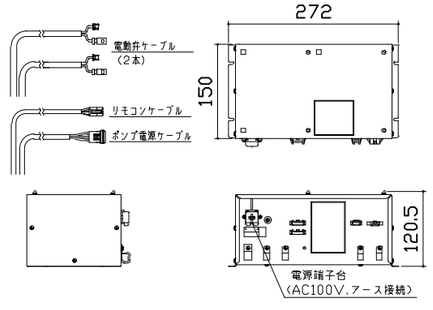

2カ所噴流ジェットポンプ仕様	
ポンプ品番	HJPN-100K
電源電圧	AC100V
周波数	50/60 Hz共通
流量	36 L/min
消費電力	130W
振動	定格揚程時にて15μ以下
常用使用最高水温	45℃

※朝日興業製

肩包み湯②

現地組付け部材

クッションピロー（浴槽に組付け）
本体：発泡ＰＥ



肩湯セットK（浴槽に組付け）
本体：ＳＡＳ



肩包み湯③

【工事範囲】

当社工事範囲

1．電源ボックスの取付
2．ポンプ電源ケーブルの配線及びポンプユニットと電源ボックスの接続
3．電動弁ケーブルの配線及び電動弁と電源ボックスの接続
4．リモコンケーブルの配線、電源ボックス及びリモコンの接続
5．リモコンの取付

電気工事業者様　工事範囲

1．電源ボックスへ一次側100Ⅴの接続
2．アース工事
3．電源回路に漏電遮断機の設置

■留意事項
(1) ポンプユニットは、工場で浴槽に組み付けられています。

電気工事

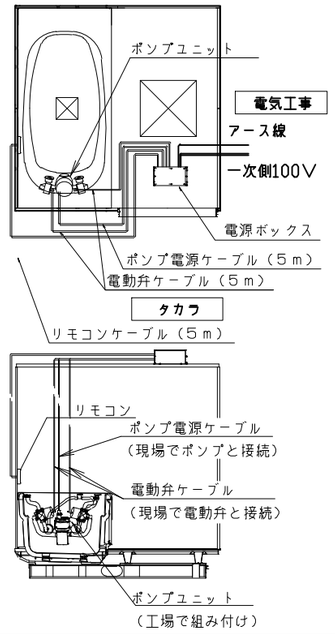

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　グランスパ　カタログプラン様邸	ＧＲＡＮＳＰＡ　グランスパ	部材詳細図　3/3
	現場番号：　C3639452	プラン番号：　1005Z-2502-0617F	作成日：　2025年2月25日
	本　　社　（代表）	担当営業　　：	担当アドバイザー：

パネル割図

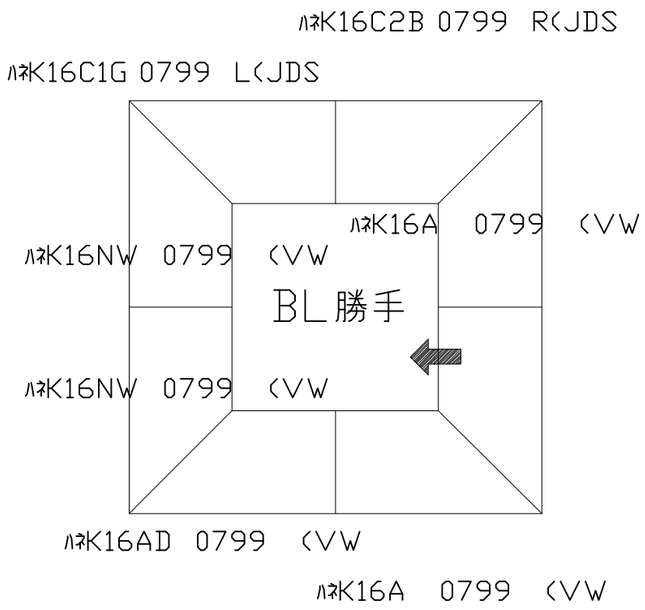

ミラー

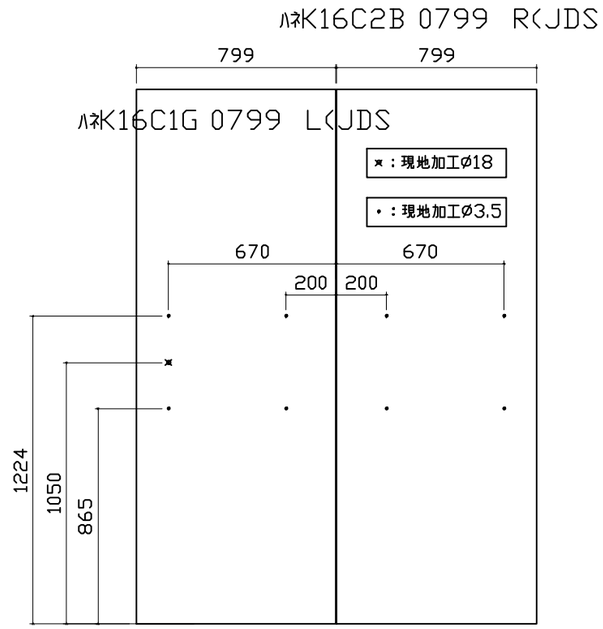

シャワーフックスライドバー

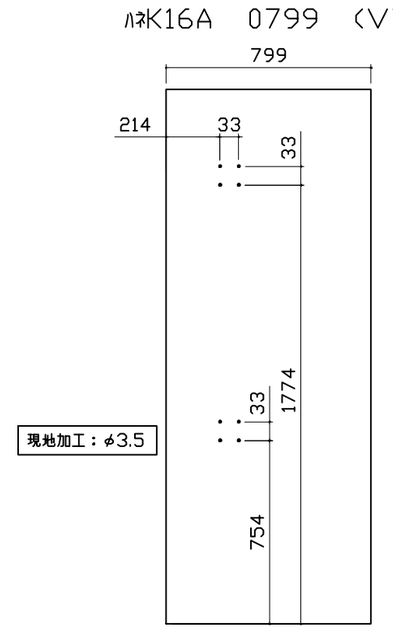

ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ

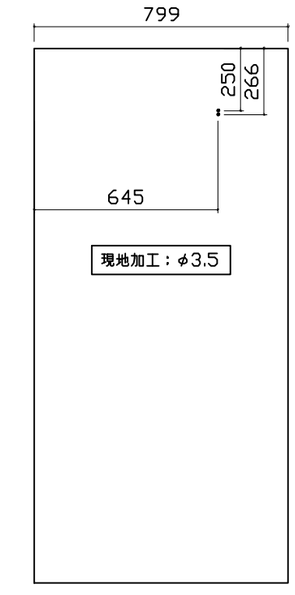

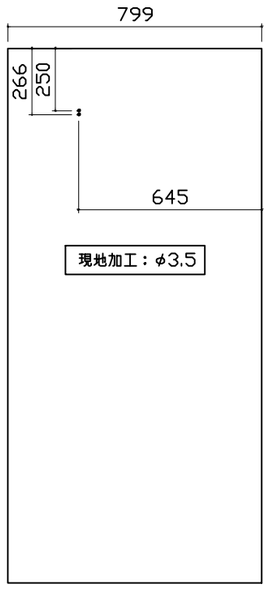

風呂蓋収納

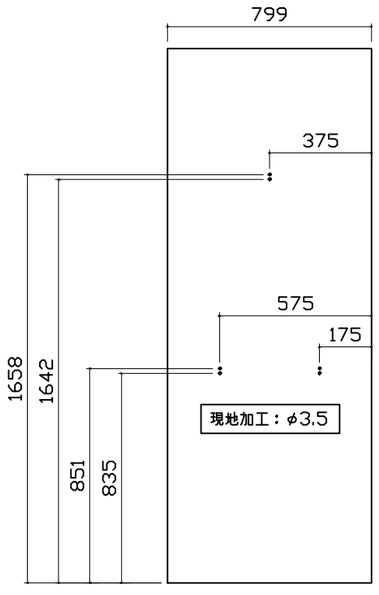

■留意事項
タオルカケ・ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： グランスパ カタログプラン様邸	GRANSPA グランスパ	穴開け指示図 1/1
	現場番号： C3639452	プラン番号： 1005Z-2502-0617F	作成日： 2025年2月25日
	本 社 （代表）	担当営業 ：	担当アドバイザー：

システムバス
グランスパ GRANSPA

グランスパ カタログプラン　　様邸

Takara standard
現場番号 C3639452
プラン番号 1005Z-2502-0617F

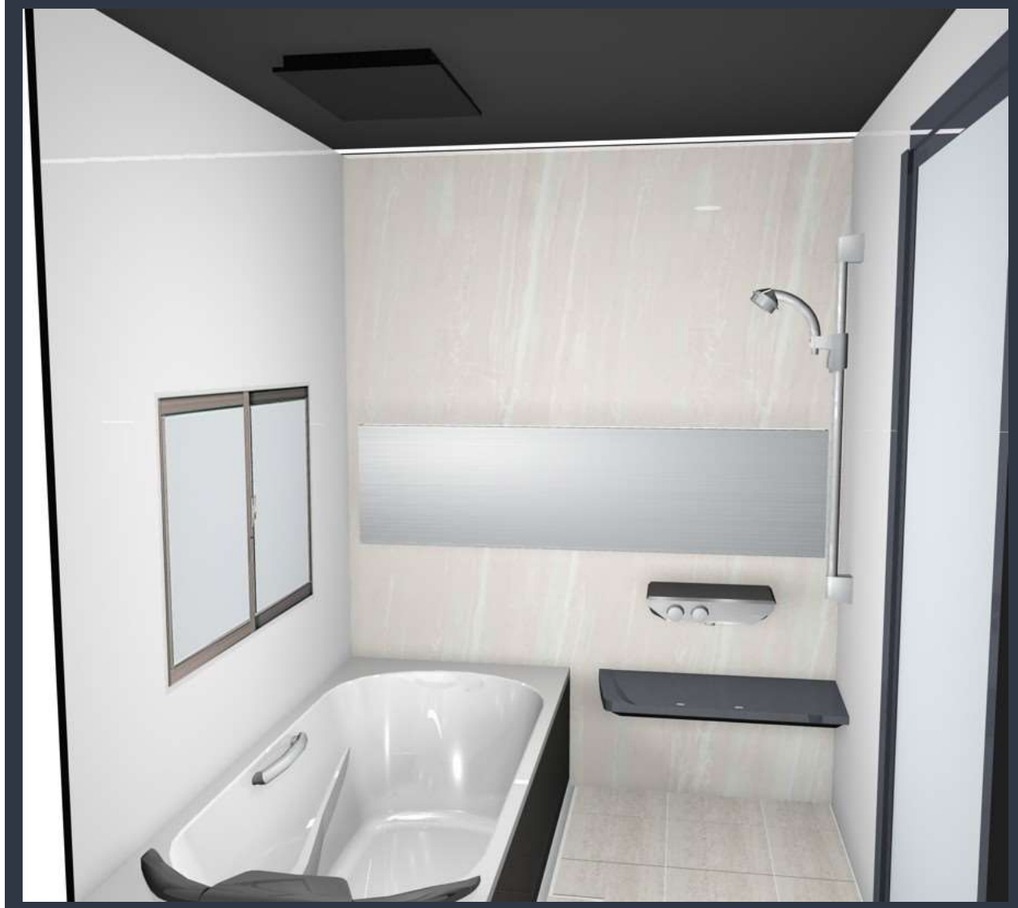

画像はイメージです。

ユニットサイズ　1616（BL勝手）

室内高さ：K タイプ

壁（正面）	壁（周辺）	キープクリーン浴槽	エプロン
プレミアムクラス ジオマーブルアイボリー	ハイクラス パールホワイト	クリスタルパールホワイト	ステンレス製 ブラック
キープクリーンフロア	**排水口カバー**	**フラット天井**	**キープクリーンドア**
プレミアムフロア グランホワイト	タイル仕上げ	チャコールブラック	ドア枠：ブラック 強化ガラス：透明

浴槽形状
ラウンド浴槽

機能商品
肩包み湯

カラー
- ホワイト
- チャコールグレー

カウンター
人造大理石カウンター

カウンターカラー
- ホワイト
- ベージュ
- ダークグレー

※画像はダークグレーです。

水栓
洗い場用水栓＜カラー：ダークグレー＞

プッシュ式サーモスタット

エコシャワー（KVK 製）
V KVK FTB230KE
節水仕様＋手元止水

節湯 A1　節湯 B1

エコ・ミスト・とろ湯の 3 つの水流が楽しめます。大型シャワーヘッドで上質なデザインです。手元ストップボタンで節水。

シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）
T1020SMH

シャワーフックを上下にスライドできます。
また、お好みの角度に調整することも可能です。

照明
ストレートライン照明（ブラック）

調光・調色機能付

換気機器
浴室暖房乾燥機（ブラック）

100V 標準タイプ（浴室換気仕様）

多彩な機能でオールシーズン快適な浴室に。
暖房　乾燥　換気

1 台 3 役の浴室暖房乾燥機

ドア
開き戸

キープクリーンドア
パッキンレス　タテ型換気口

ミラー
ラグジュアリーミラー

浴槽仕様
高断熱浴槽

お湯が冷めにくいので、次に入る人も快適です。

※保温材の表現はイメージです。

断熱風呂フタ（組み合わせ式）
※浴槽形状により風呂フタの形状は異なります。

高断熱浴槽仕様
高断熱浴槽　断熱風呂フタ

がセットなら･･･

4 時間後の湯温低下をわずか
2.5℃以内に抑えます。（JIS 準拠）

浴槽グリップ
＜付き位置＞

1 本付きます。

どこでもラック
タオルハンガー L

風呂フタフック　チャコールグレー

窓枠フリータイプ（樹脂製）L1512　ブラック

ランドリーパイプ　1 本
（ブラケット：ホワイトタイプ）

システムバスの特長
この心地よさ、タカラオリジナル

ピカピカ　ポカポカ　ガッチリ

優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。

ホーロークリーン浴室パネル
お手入れカンタンで清潔、浴室の壁は高品位ホーロー。

ホーロークリーンパネル

- 毎日シャワーで流すだけ！
- 湯アカもサッとひと拭き！
- 傷つきにくく汚れにくい！

キープクリーンフロア（プレミアムクラス）
キープクリーンフロア

床は表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、お手入れがカンタンです。

キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）
クイーン オブ バス
キープクリーン浴槽

美しい光沢と質感、なめらかな手触りと優れた清掃性が魅力。

パーフェクト保温
あたたかさを逃がさない！

まるごと包み込むように、浴室全体を保温材で完全防備。

パーフェクト保温

※画像はイメージです。

震度 6 強相当の振動にも負けない強度
強さの秘密は、浴室の重さをしっかり支えるフレーム架台。

システムバス下台部分　※画像はイメージです。

カラーシミュレーション
お好みのカラーの組み合わせが見つかります！

グランスパ

●画像はイメージです。カラー・間口等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。



システムバス
グランスパ GRANSPA

グランスパ カタログプラン　　様邸

Takara standard
現場番号 C3639452
プラン番号 1005Z-2502-0617F

ホーロークリーン浴室パネル

プレミアムクラス

※ハイクラスよりプラス¥15,000(税抜き) / FRP浴槽仕様の場合は選択不可。

ジオマーブル モスグレー

ジオマーブル ベージュ

ジオマーブル アイボリー

ノルディック グリーン

ノルディック ベージュ

ハイクラス

テラゾー ホワイト

リネンホワイト


ブリックグレー

ブリック ベージュ

ブリック ダーク

コンクリート グレー

フロウストーン グレー

フロウストーン テラコッタ

スタッコグレー

グレージュ アッシュ

ホワイト アッシュ

ウォルナット ホワイト

ウォルナット グレージュ

ウォルナット ブラック

パール ホワイト

パール ベージュ

パール ブラック

キャンバス イエロー

カリビアン ブルー

コラージュ ミックス

【FRP 浴槽仕様の場合】
★のついた柄はアクセントデザインとして選択可。
(レギュラークラスと同価格)

レギュラークラス

※ハイクラスよりマイナス ¥20,000(税抜き)

ピッコロタイル ブルー

ピッコロタイル ピンク

ラミナストーン ホワイト

ラミナストーン ベージュ

サンドストーン ホワイト


ホワイト

ダーク グレー

ブラック

洗い場

キープクリーンフロア(プレミアムクラス)

※ハイクラスよりプラス¥20,000(税抜き)

グランホワイト

グランベージュ

グライングレー

キープクリーンフロア (ハイクラス)

カームホワイト

カームベージュ

カームグレー

カームダークグレー

FRP フロア

※浴室サイズにより価格が異なります。

ホワイトグレー

グレーベージュ

グレー

浴槽

キープクリーン浴槽 (アクリル人造大理石)

クリスタルパール ホワイト

シュガーライト グレー

シュガーライト ベージュ

シュガー ブラック

FRP 浴槽

ホワイト

ベージュ

ライトグレー
