システムバス 御見積書

御名前　北海道-新旭川SR SB1　様

業者　様

商品名　GRANSPA　グランスパ

作成日　2024年12月22日
ﾌﾟﾗﾝ番号　1203E-2412-0176T
現場番号　C5950277

タカラスタンダード株式会社
◆旭川営業所
北海道旭川市末広東1条6丁目
TEL 0166-54-9930 / FAX 0166-54-9932

◆旭川ショールーム
TEL 0166-54-9935 / FAX 0166-54-9941

商品
御見積金額　¥902,700　（税込 ¥992,970）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　¥172,000　（税込 ¥189,200）

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
　　又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
旭川SR	旭川SR	吉川

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1620（BR勝手）
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームダークグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトグレー
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	人造大理石
カウンター/下カバーカラー	ホワイト　/　ホワイト
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス　/　ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー（正面）	フロウストーングレー
パネルカラー（周辺）	ホワイト
ガス種　/　周波数	13A　/　50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

No.*

御名前 北海道-新旭川SR SB1 様

現場番号	C5950277	プラン番号	1203E-2412-0176T	作成日	2024/12/22

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1620サイズ		1	848,000	848,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	折戸＜800幅＞（ホワイト）／樹脂ガラス（半透明）（19サイズ）	1		
4	ドア	上部換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア（ハイクラス・カームダークグレー）	1		
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>（高断熱浴槽）（シュガーライトグレー）	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス（保温材あり）（ブラック）	1		
11	浴槽形状	人大ワイド浴槽（ベンチ付）	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯（ジェットバス機能付）	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓：樹脂製ホース（メタル調）SB181-5UTH	1		
19	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド：SB181-5UTHB1NS	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	人造大理石カウンター	1		
22	シャワーフックスライドバー	あり	1		
23	浴室パネル	ハイクラス（一面デザイン）（Kパネル）	1		
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	カラーフラット天井（チャコールブラック）	1		
26	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
27	換気機器開口	工場開口	1		
28	照明	ダウンライト照明（3灯）（白色）	1	-3,000	-3,000
29	天井照明開口	工場開口	1		
30	ミラー	ワイドクリアミラー（全幅タイプ）	1	+37,000	+37,000
31	風呂フタ	風呂フタなし	1	-19,500	-19,500

御名前 北海道-新旭川SR SB1 様

現場番号	C5950277	プラン番号	1203E-2412-0176T	作成日	2024/12/22

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
33	ハンドバー	ステン I型600タイプ	1	+9,000	+9,000
34	収納棚	収納棚なし	1		
35	どこでもラック	シャワーフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
36	どこでもラック	タオルハンガーL(チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
37	どこでもラック	小物置きS(チャコールグレー)	1	+1,800	+1,800
38	吊り金具	20L	1	+17,500	+17,500
39	給水給湯管	洗い場1水栓＜上配管 ｶｳﾝﾀｰ側接続＞	1		
40	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
41	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
	システムバス合計		41		¥902,700

商品総合計		41	¥902,700

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費 ¥172,000 (税込 ¥189,200)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

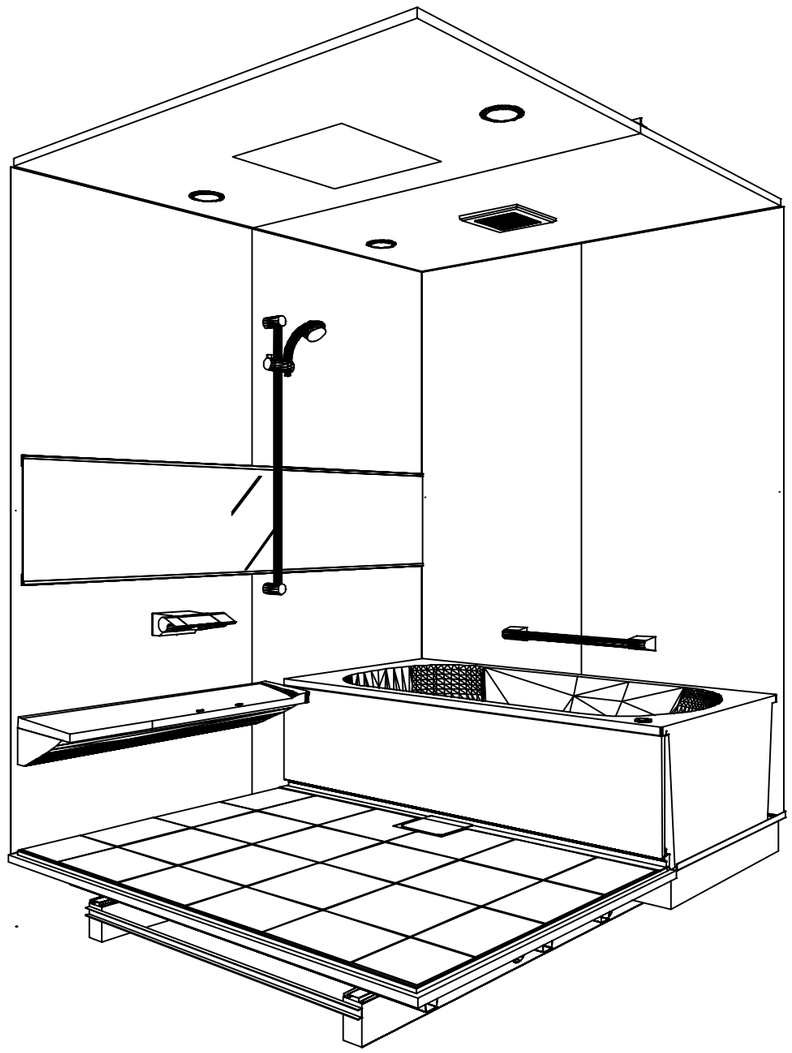

鳥瞰図

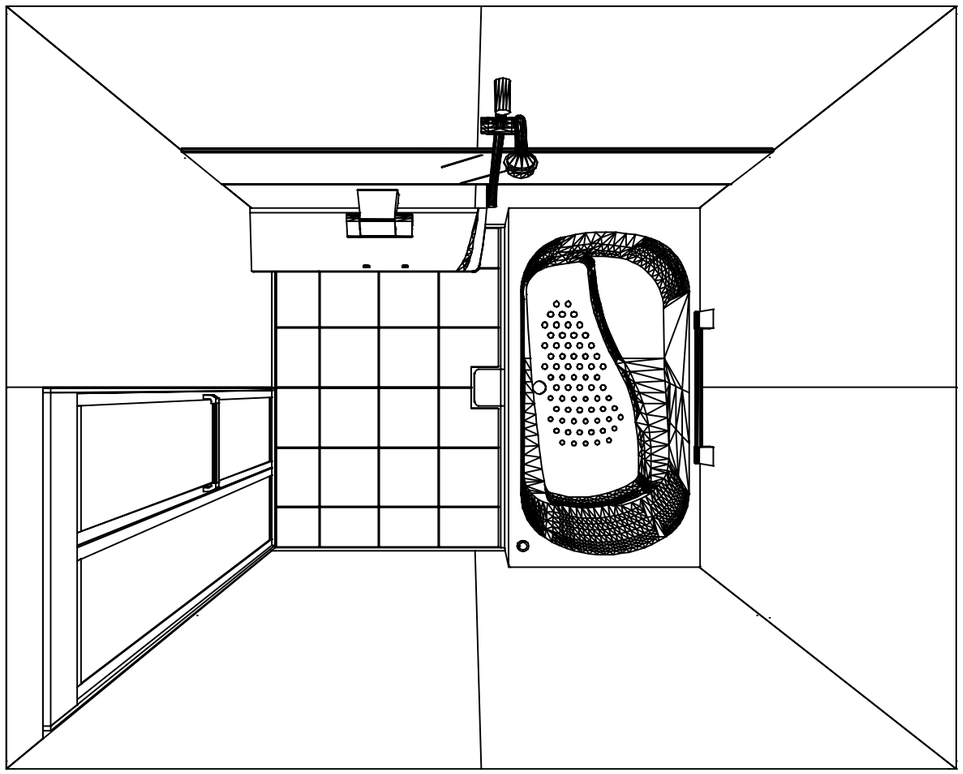

1620

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道−新旭川SR SB1様邸	GRANSPA グランスパ	姿図
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業 ：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

縮尺：A3サイズ等倍



■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

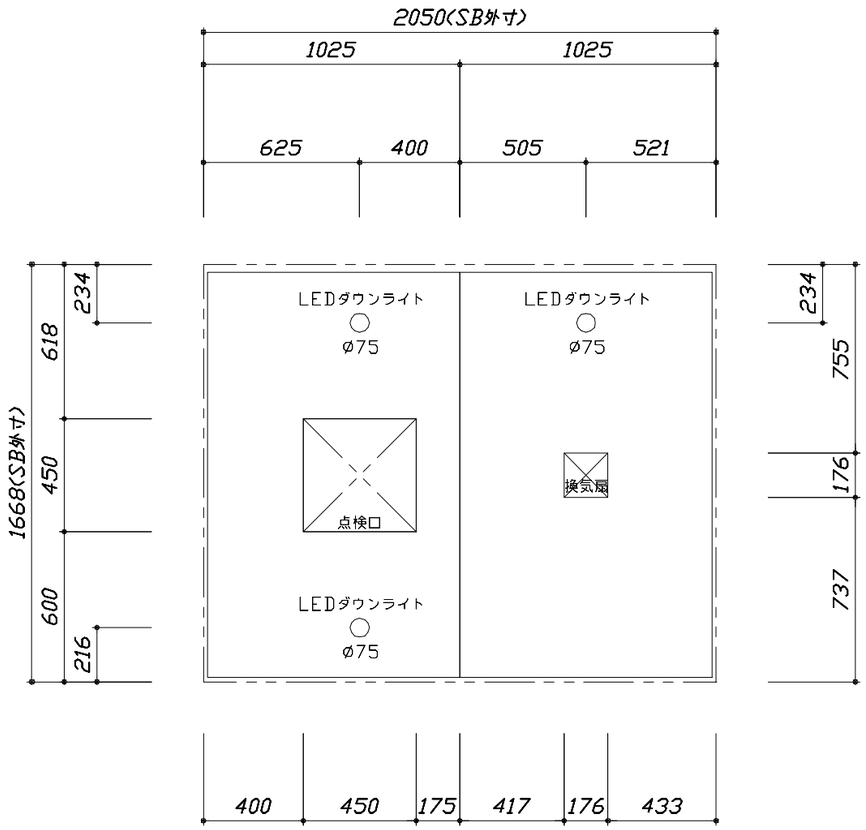

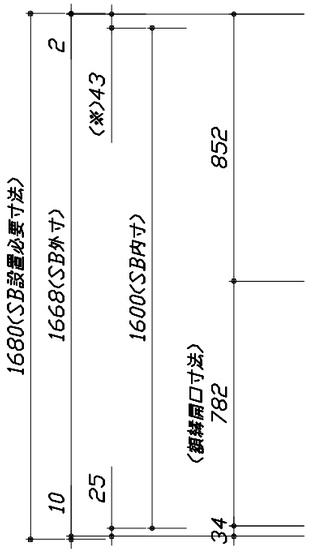

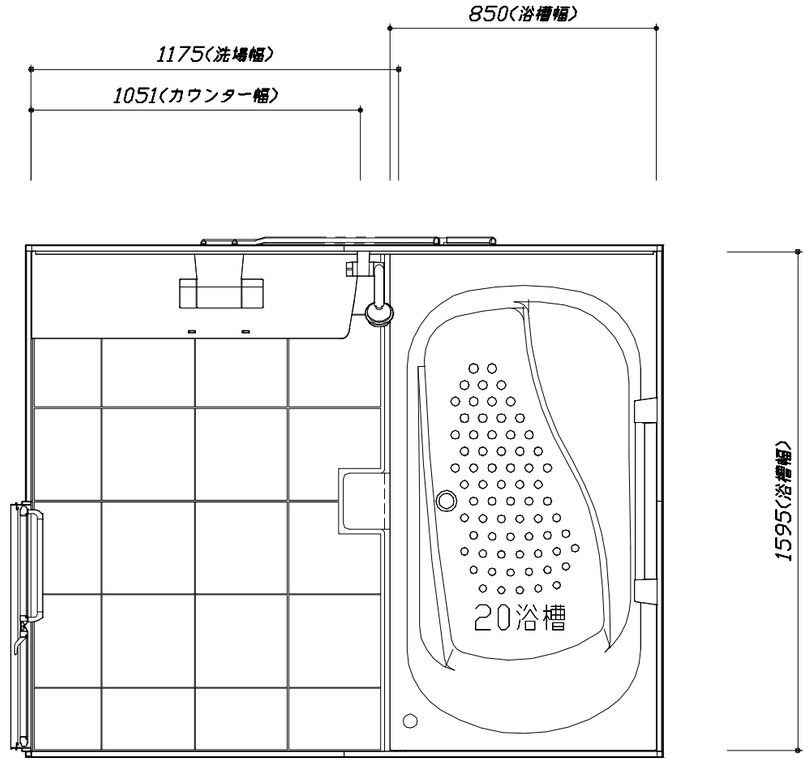

＜平面図＞

＜天井伏図＞

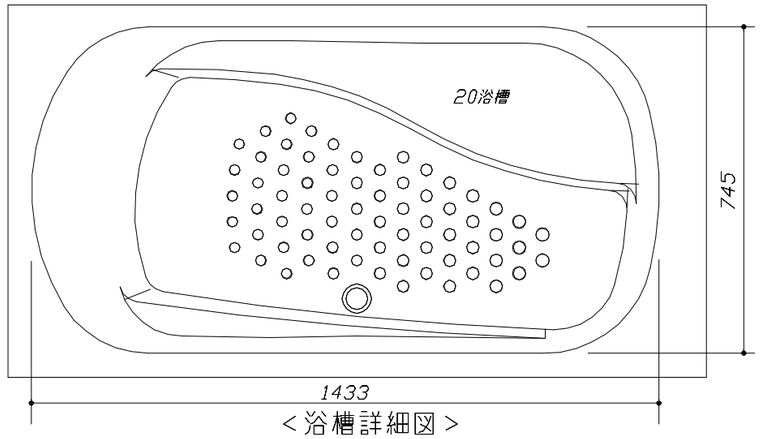

＜浴槽詳細図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道−新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	施工図1	縮　尺： 1:25,20
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E−2412−0176T	作成日： 2024年12月22日	
	旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



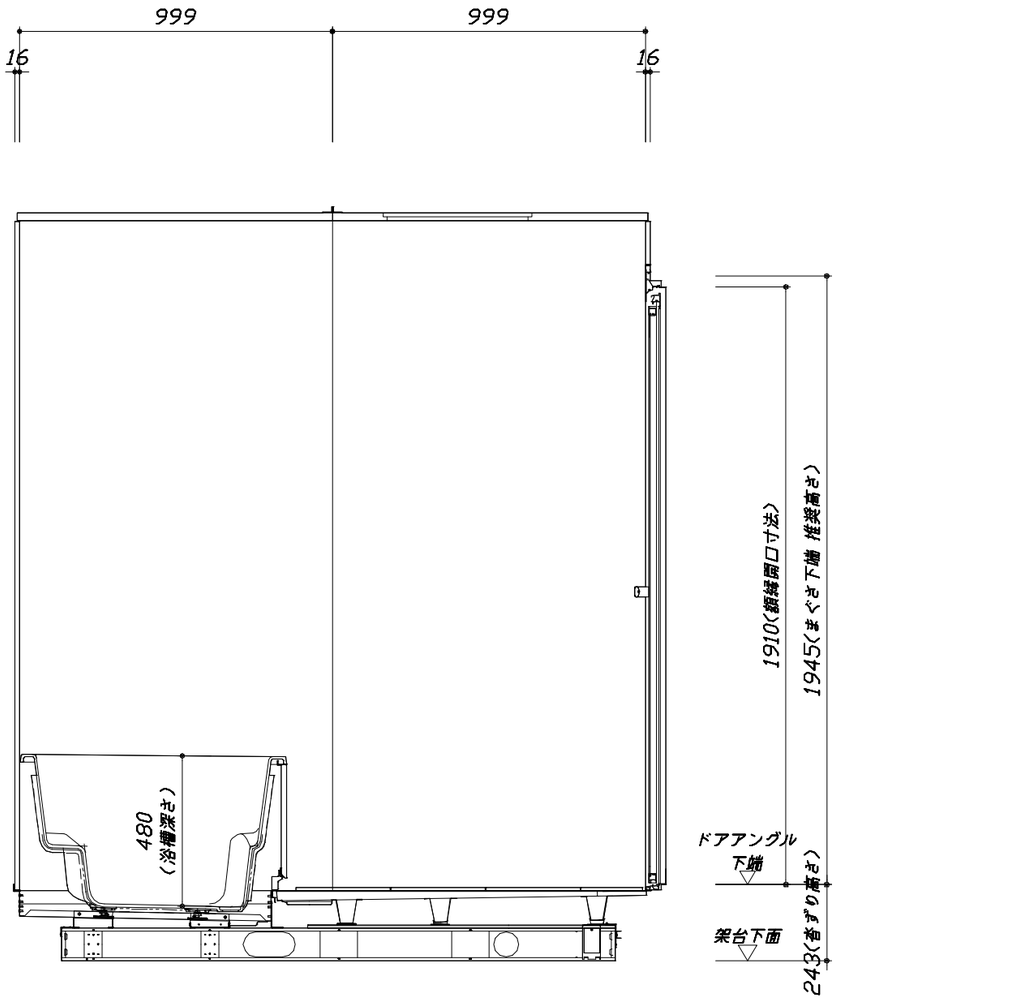

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

＜カウンター対面図＞

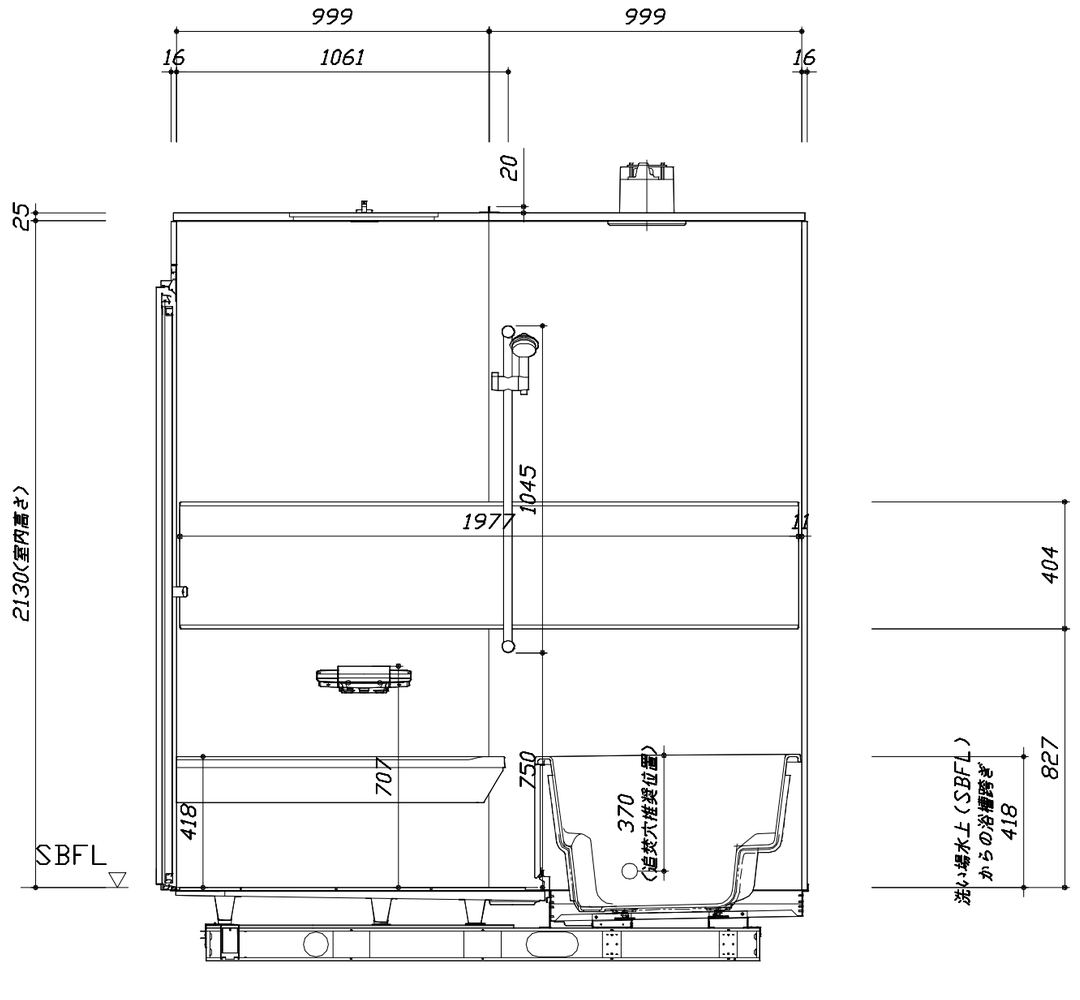

＜カウンター面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道−新旭川SR SB1様邸	GRANSPA グランスパ	施工図2	縮 尺： 1:20
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日	
	旭川営業所	担当営業 ：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



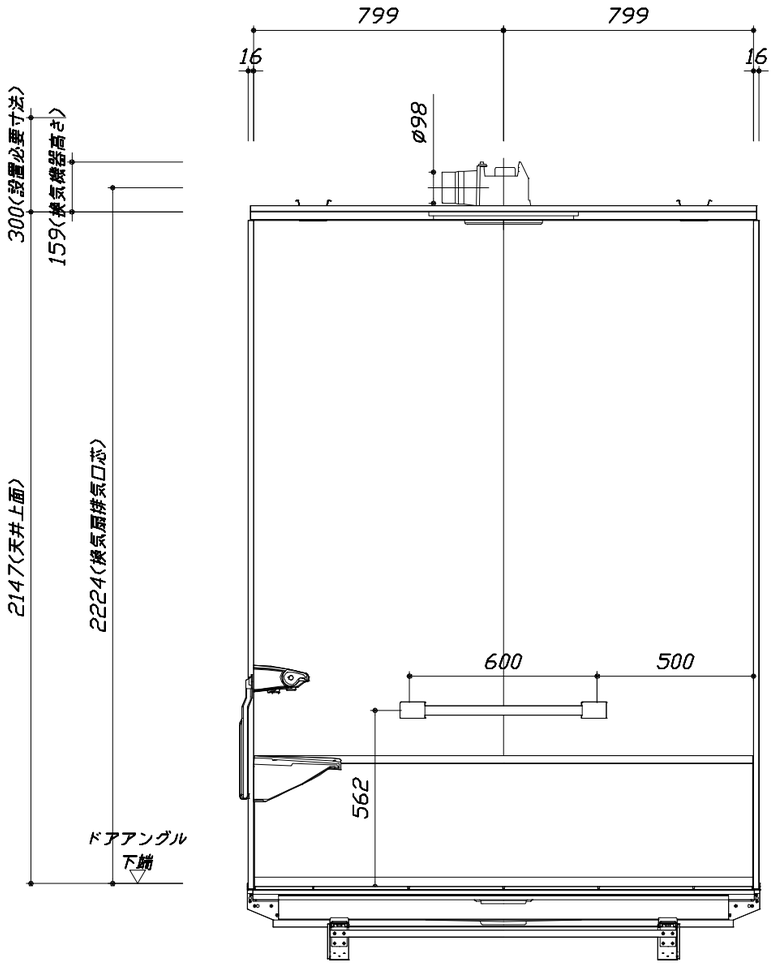

＜浴槽側面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

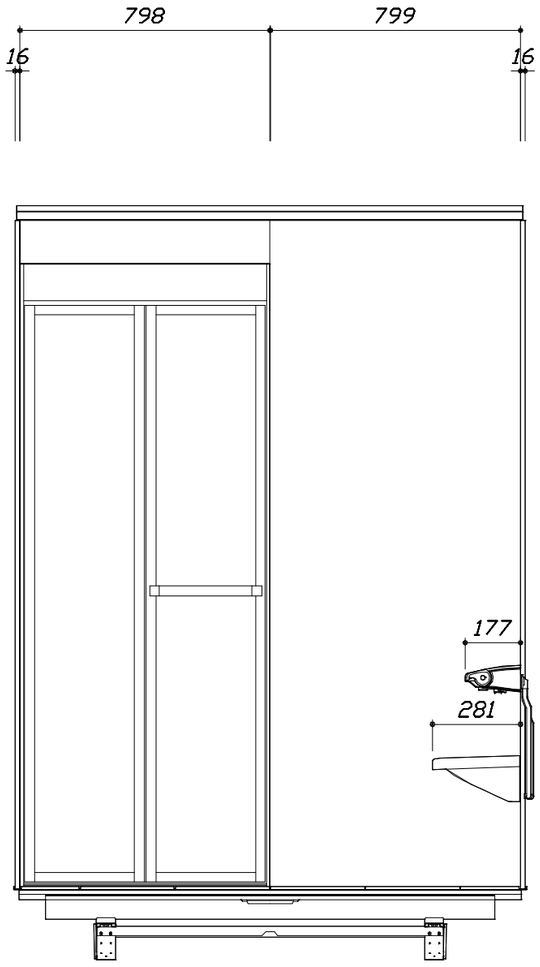

＜洗場側面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道ー新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	施工図3	縮　尺： 1:20
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日	
	旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1620サイズ(室内容量6.8立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼　保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	ワイド浴槽(ベンチ付)（330リットル） 追い焚き穴:あり
浴槽パン	ステンレス
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング)　 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	人造大理石カウンター：人造大理石 カウンター下カバー：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー　裏面保温材　タオル掛け穴:なし
天井	化粧ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	ｷｰﾌﾟｸﾘｰﾝﾄﾞｱ:19高さ折戸(ｱﾙﾐ框/樹脂ｶﾞﾗｽ/上部換気口)
窓１	―
窓２	―
窓枠１	―
窓枠２	―
排水トラップ	洗い場:ＡＢＳ樹脂,　浴槽:ＡＳＡ樹脂　　封水50㎜
雑排水配管	硬質塩ビパイプ　VU50
製品重量	365kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ワイドクリアミラー　くもり止め加工
収納棚	―
タオル掛け	―
洗場側水栓	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ(SB181-5UTHB1NS)(樹脂ﾎｰｽ:ﾒﾀﾙ調)
浴槽側水栓	―
兼用水栓	―
ﾌｯｸ/ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ	シャワーフックスライドバー（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰTN-1020）
照明	LEDダウンライト（LED 12.3W白色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V･最大消費電力9.3W)(ﾀﾞｸﾄ径φ98)ブラック
フロフタ	―
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	―
ハンドバー①	―
ハンドバー②	―
ハンドバー③	―
ハンドバー④	ステンレスタイプ　I型600タイプ
ハンドバー⑤	―
ハンドバー⑥	―
ハンドバー⑦	―

本体カラー

浴槽	GN：シュガーライトグレー
カウンター	WA：ホワイト
ﾊﾟﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	TG：フロウストーングレー
ﾊﾟﾈﾙ(周辺･3面)	W：ホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	―
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	HC：カームダークグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / B：チャコールブラック
収納棚	―
タオル掛け	―
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	―

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道－新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	仕様表	
現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日	
旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR	

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

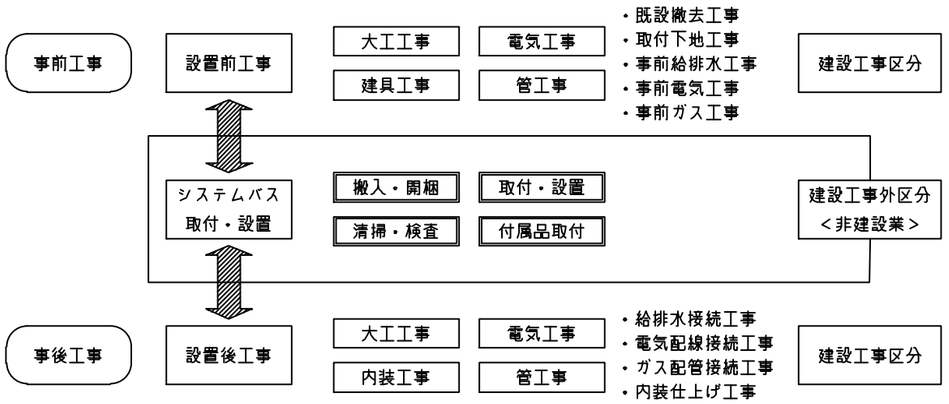

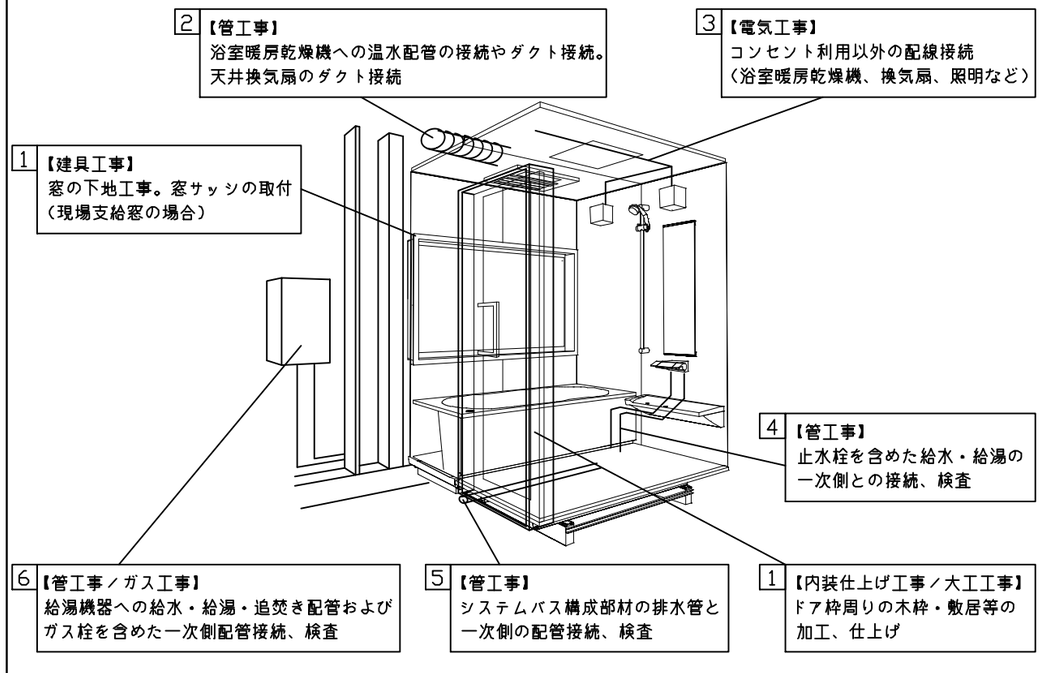

■システムバス　工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位（図）	業種区分	作業名称（区分）	建設工事 大工工事	建設工事 とび土工工事	建設工事 建具工事	建設工事 管工事	建設工事 電気工事	建設工事外 給湯機器設備	建設工事外 システムバス設置	作業内容
設置前工事		大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
	1	管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
	2		換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
	3		給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス本体取付・設置		建設工事外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置　【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付　【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付　【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付　【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付　【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査　【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事			建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
	1	管	排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
	2	大工	浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	3	電気	浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	5		建築側排水配管との接続工事　【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
	6		給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1	電気	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
	3	他	浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：　北海道－新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	工事区分表	
現場番号：　C5950277	プラン番号：　1203E-2412-0176T	作成日：　2024年12月22日	
旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー：　旭川SR	

■ 排水配管工事注意事項

●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
●2重トラップにしないでください。
●配管途中で配管径を狭めないでください。
●排水勾配は1/100～1/50設けてください。
●排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
●給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27㎜以下にしてください。

〈給水立上げイメージ図〉

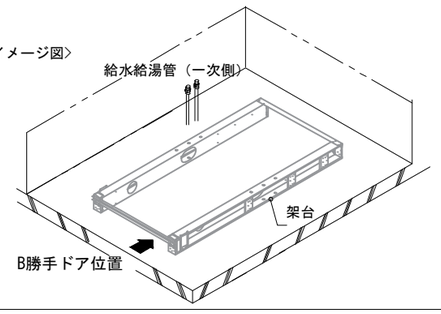

■土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より２６５mm下がりで打設してください。



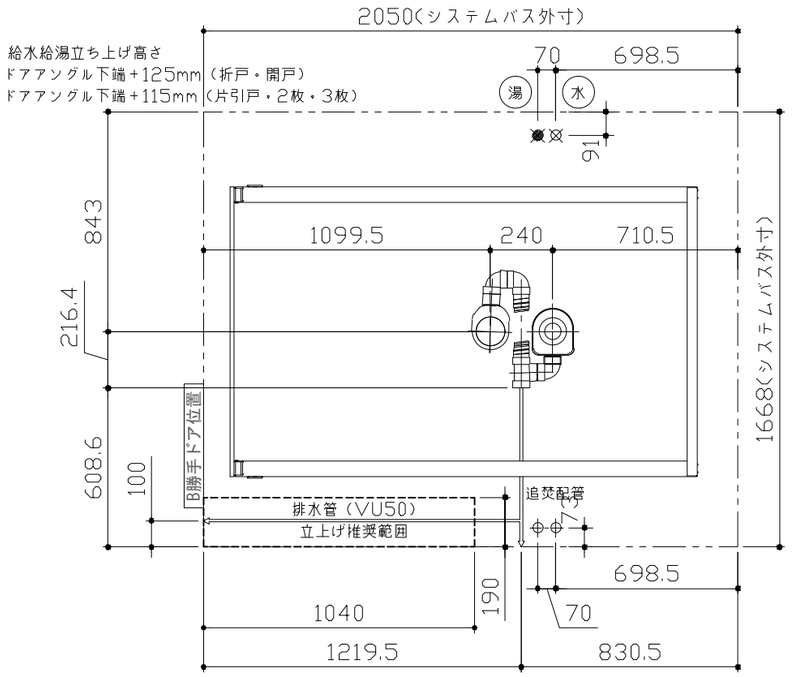

■設備記号

記号	記号の意味
⊠	給水位置
⊗	給湯位置



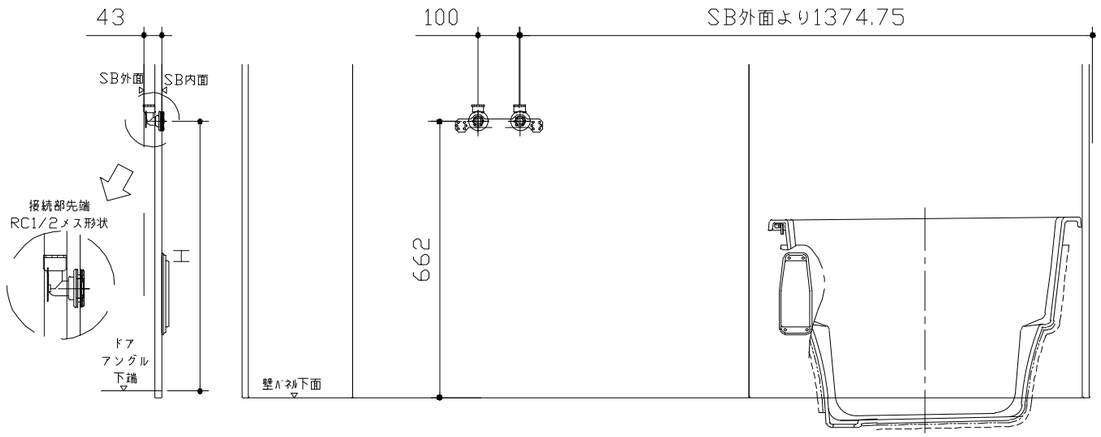

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	646
片引戸・２枚引戸・３枚引戸	637

〈給水給湯管取合詳細図〉

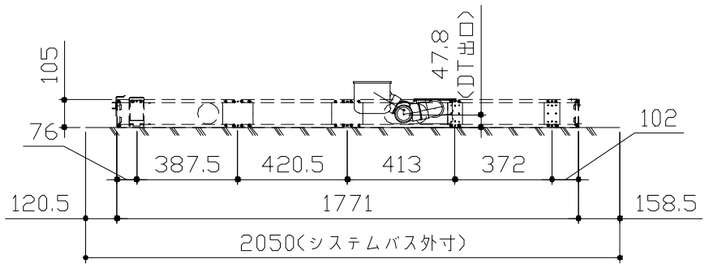

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道－新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	排水配管図
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

■必ずご確認ください
（１）図面の見方
・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
・マス表示：ロ=20mm角

（２）留意事項
・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。







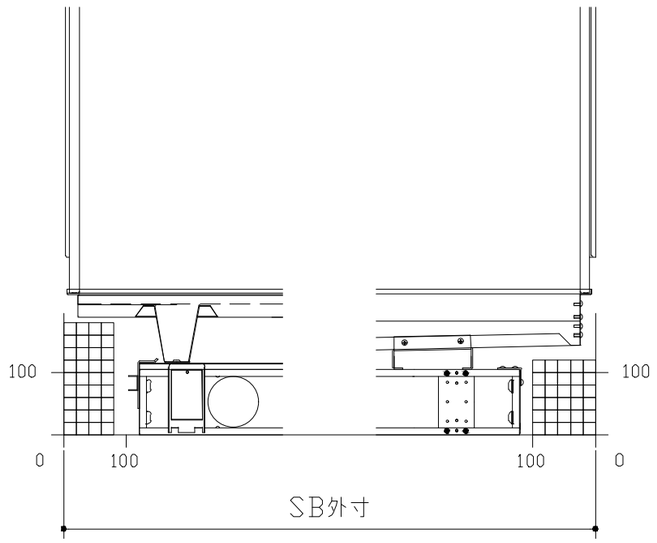

■留意事項
下図はA勝手の洗場トラップ位置を示します。
B勝手の場合は架台桁の間に納まります。

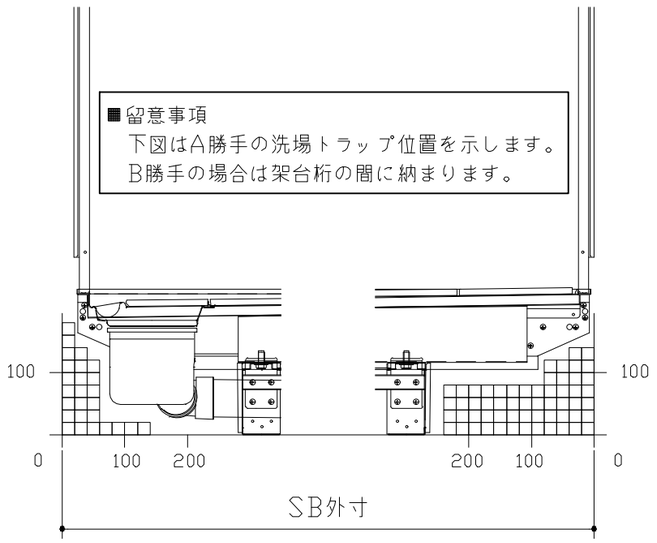

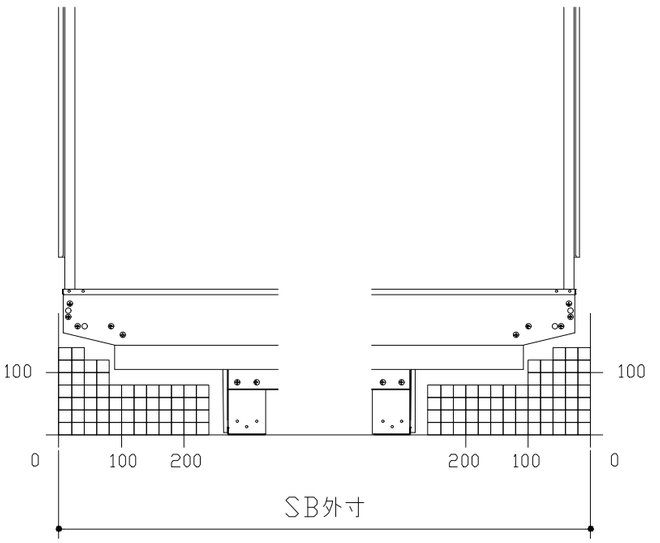

B矢視　A矢視　D矢視　C矢視　F矢視　E矢視

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道ー新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	床下空間図
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

キープクリーンドア：折戸・上部換気口

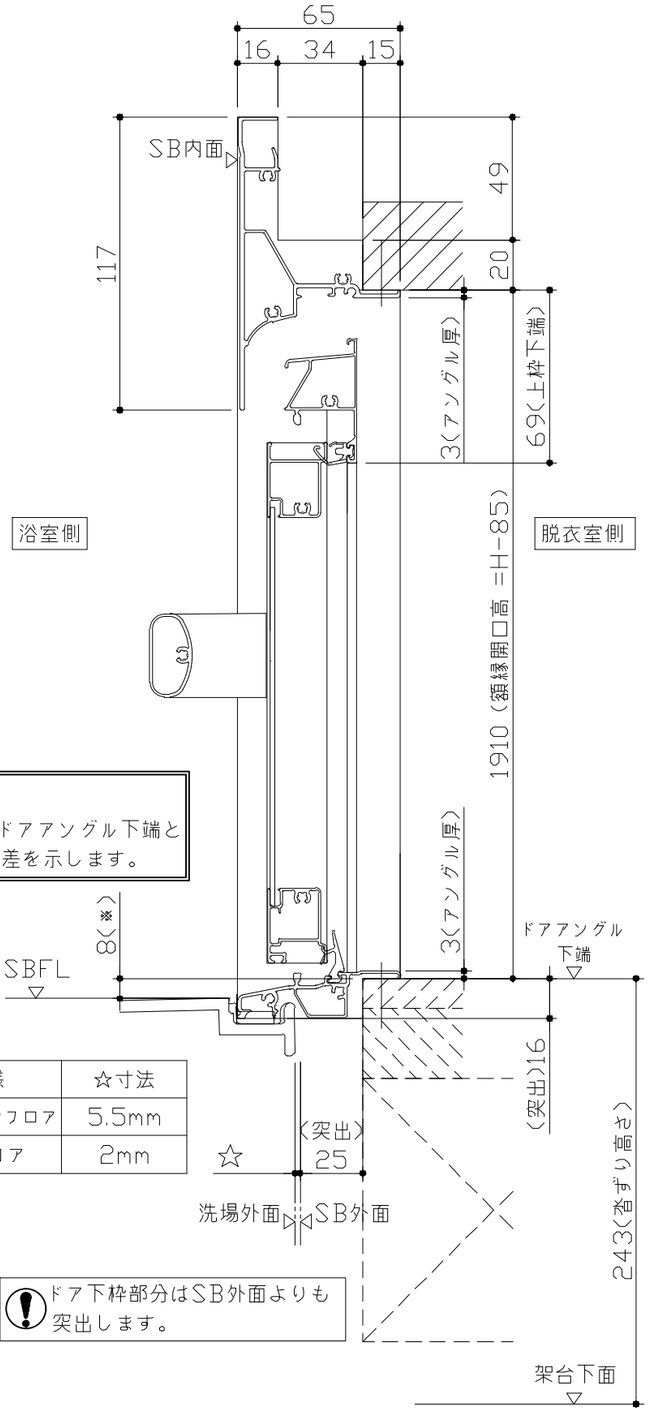

■留意事項
※印寸法はドアアングル下端と
SBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

ドア下枠部分はSB外面よりも
突出します。

有効開口寸法689mm

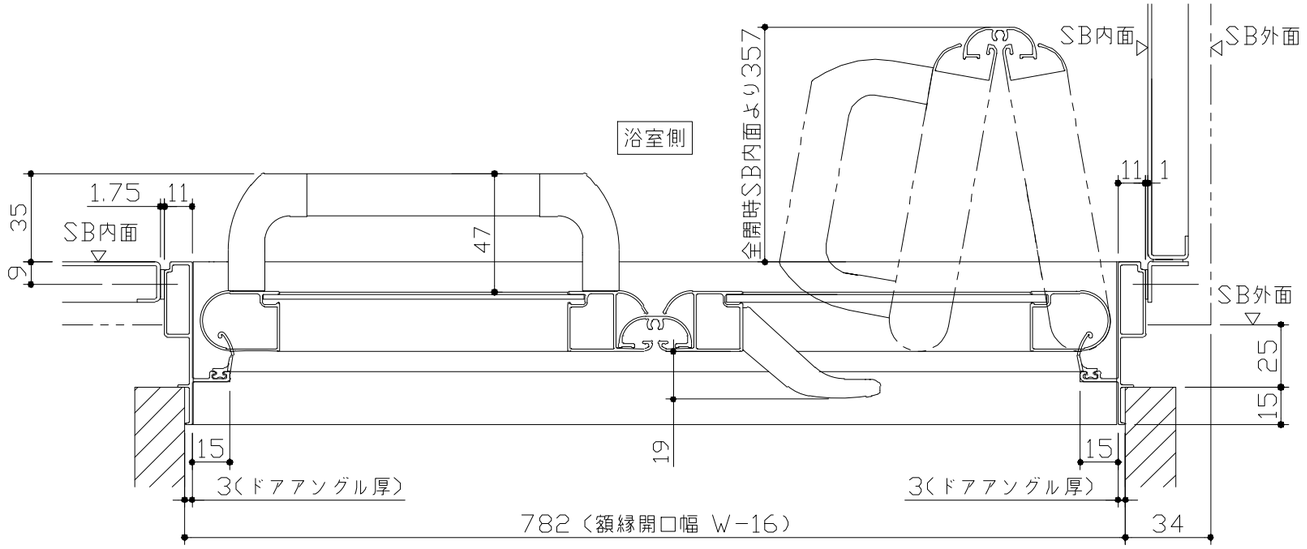

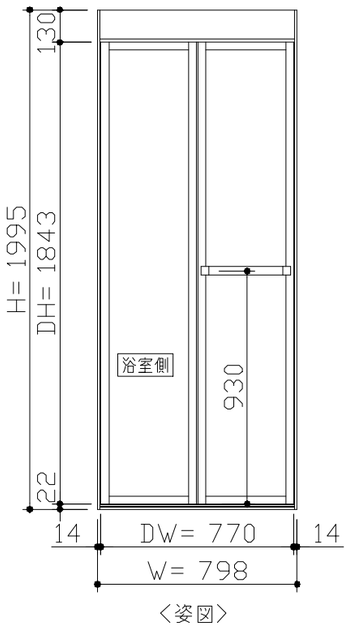

〈姿図〉

■ドア横の管柱、間柱について
- ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道－新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	ドア取合詳細図	
現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日	
旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR	

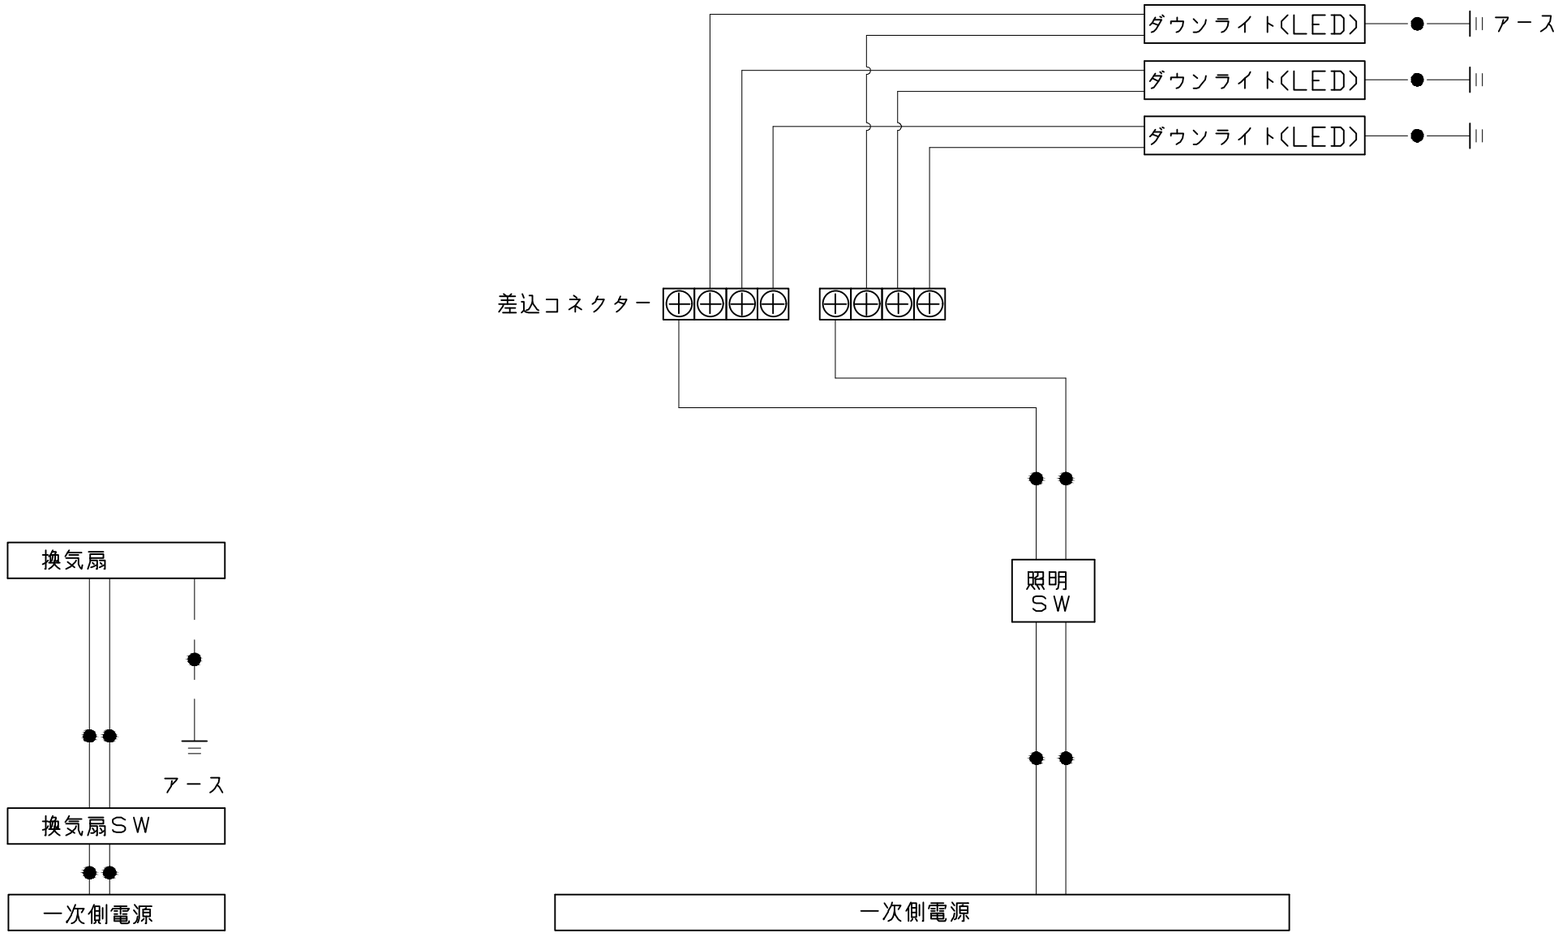

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、
電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道ー新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	電気配線図
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

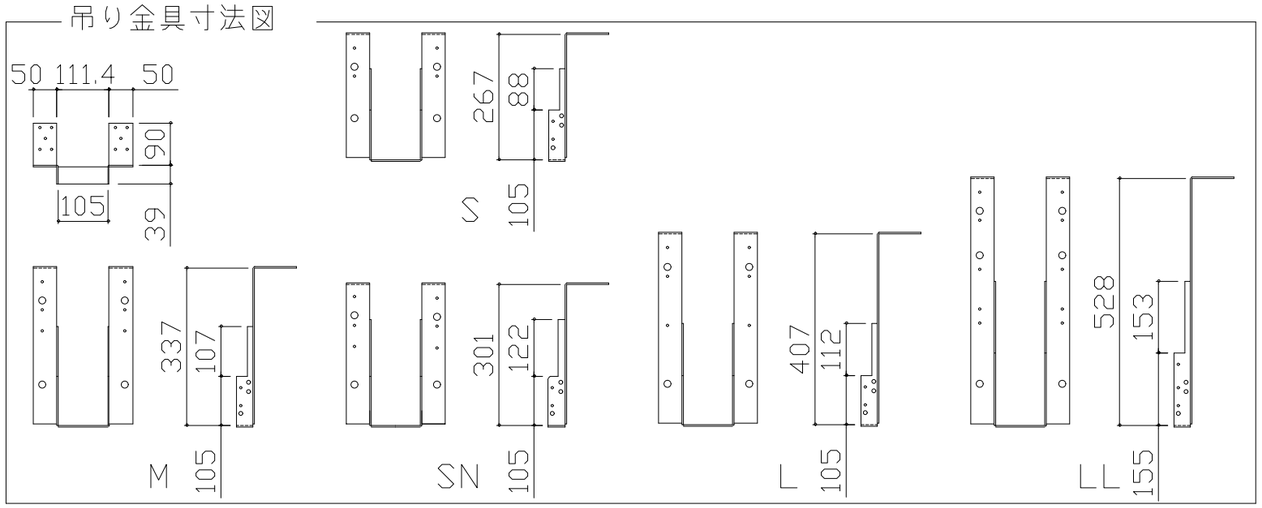

■吊金具設置条件について

- ●吊金具を設置する梁（土台）には600～900kgの重量がかかります。
  十分な強度を確保した梁(土台)を設置してください。
- ●吊金具を設置する梁（土台）の高さ寸法（h）に以下の制約条件が
  あるのでご注意ください。

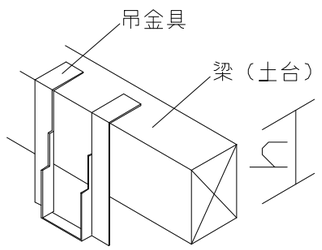

金具セット	h寸法
S	105以上
SN	105以上
M	150以上
L	210以上
LL	240以上

■設置必要材料（現地調達）

【受け梁材が木材の場合】

- ●受け梁材（105角　材質：ベイツガ、ベイマツ1級相当品）
- ●防錆釘（N-75　80本以上、N-32　20本程度）

【受け梁材が鉄パイプの場合】

- ●皿タッピンネジ（クロメート、M4×25　20本程度）

【共通】

- ●コンパネ（厚み：12mm以上）
- ●（コーチスクリュー、アンカー、六角レンチ、ドリル）

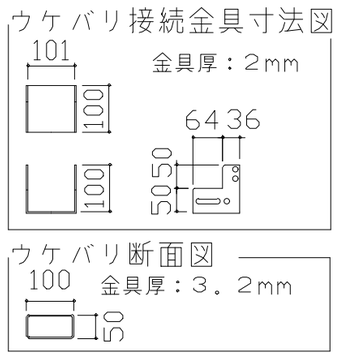

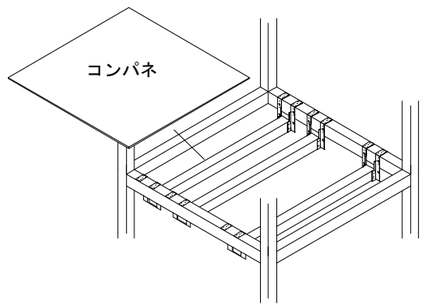

階上に設置する場合などは安全確保（落下防止）
の観点よりコンパネを設置してください。

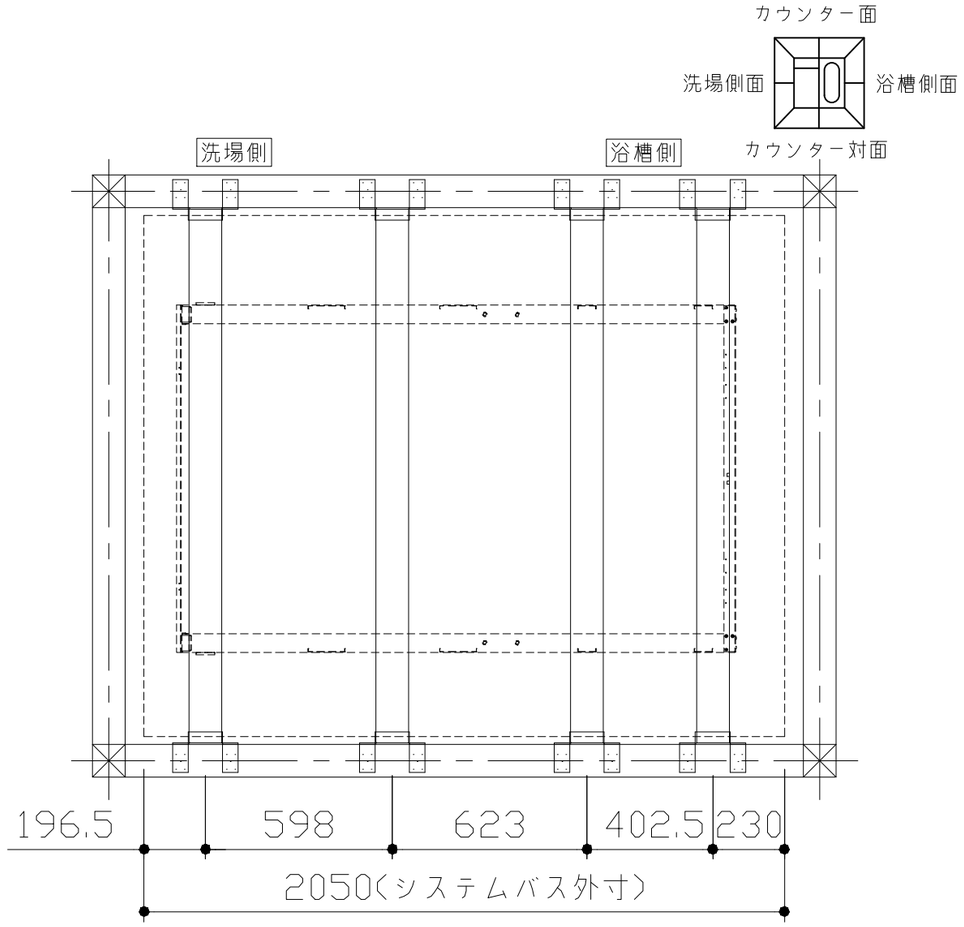

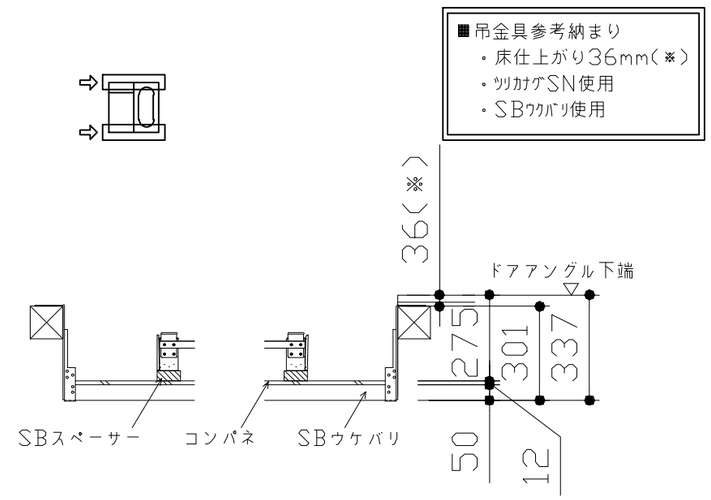

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道－新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	吊金具設置図
	現場番号：　C5950277	プラン番号：　1203E-2412-0176T	作成日：　2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業　　：旭川SR	担当アドバイザー：　旭川SR

浴槽

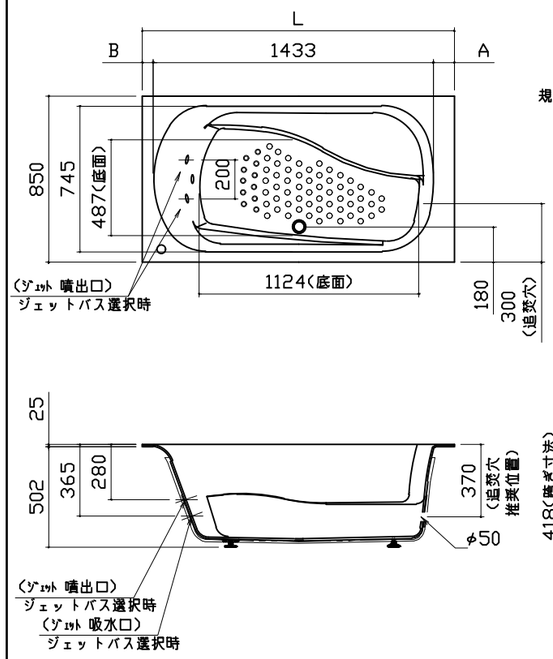

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法		
	L	A	B
1593	1520	32.5	54.5
1618	1545	57.5	54.5
1643	1570	82.5	54.5
規格 1668	1595	107.5	54.5
1693	1620	120	67
1718			
1743			
1768			
1793			
1818			
1843			
1868			

本図は参考図面です

洗い場用水栓

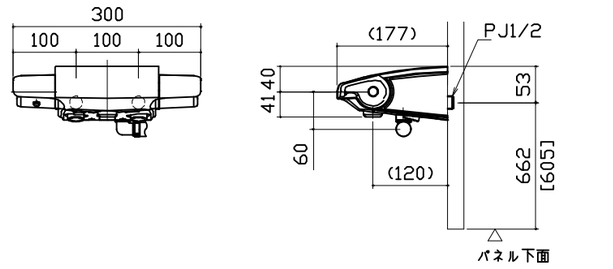

※[]内寸法はカウンターが無い場合

照明

ダウンライト
LED 3.1W（1灯あたり）

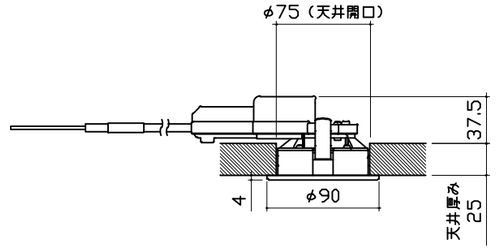

換気機器

管工事

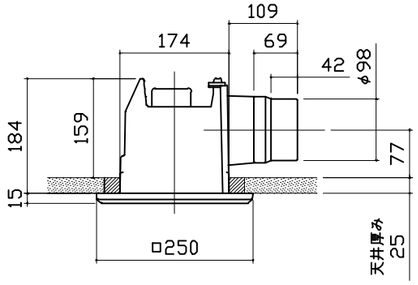

シャワーフックスライドバー

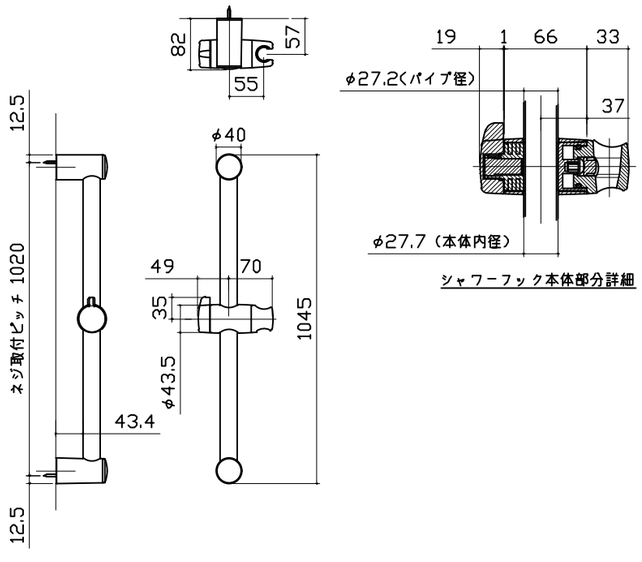

ミラー

枠：SUS304 t0.8
ミラー：表面防曇コートあり（ワイドクリアミラー）
表面防曇コートなし（ワイドミラー）

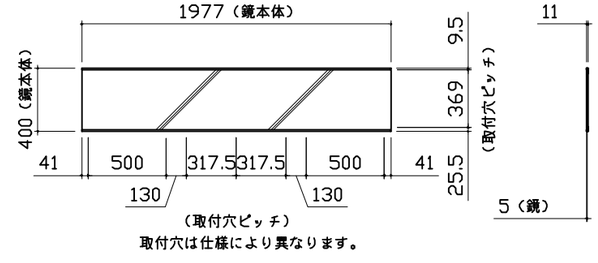

取付穴は仕様により異なります。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道－新旭川SR SB1様邸	GRANSPA グランスパ	部材詳細図 1/2
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業 ：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

ハンドバー支持部取合詳細図

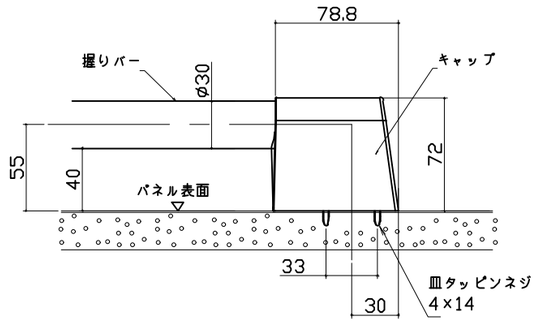

洗い場側排水トラップ

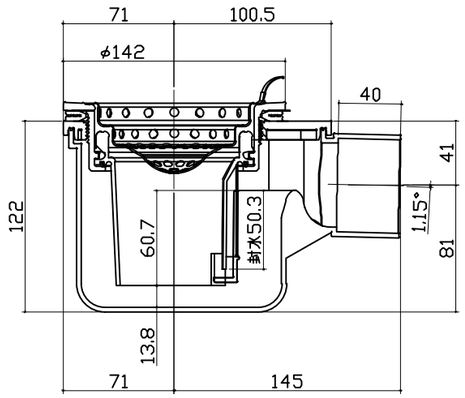

浴槽側排水トラップ

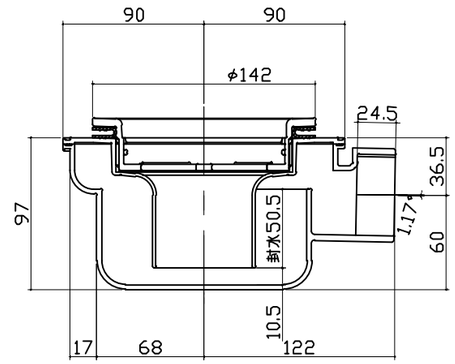

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道－新旭川SR　SB1様邸	GRANSPA　グランスパ	部材詳細図　2/2
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業　：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

パネル割図

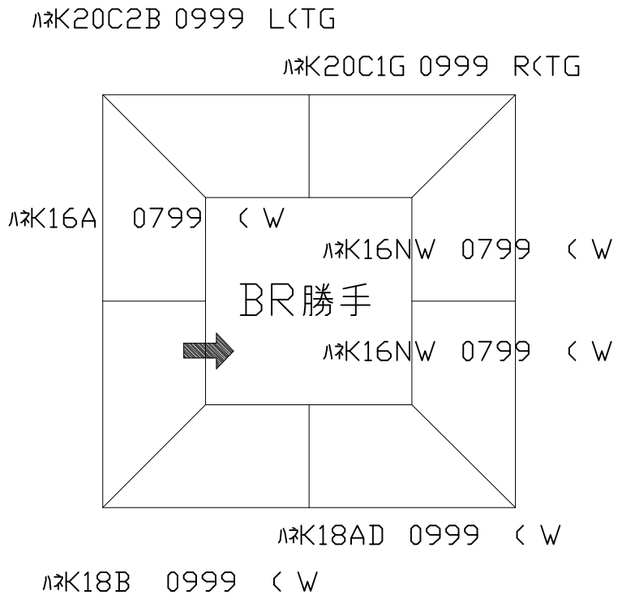

ミラー

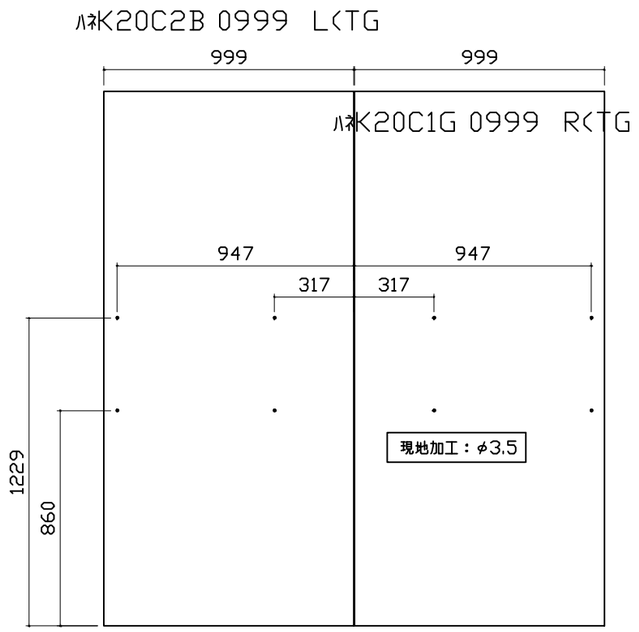

シャワーフックスライドバー

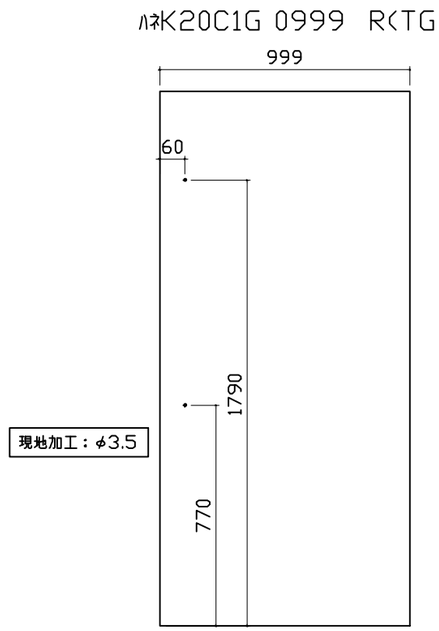

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道－新旭川SR SB1様邸	GRANSPA グランスパ	穴開け指示図 1/1
	現場番号： C5950277	プラン番号： 1203E-2412-0176T	作成日： 2024年12月22日
	旭川営業所	担当営業 ：旭川SR	担当アドバイザー： 旭川SR

システムバス グランスパ GRANSPA

北海道-新旭川SRSB1 様邸

Takara standard
現場番号 C5950277
プラン番号 1203E-2412-0176T

画像はイメージです。

ユニットサイズ 1620(BR勝手)

室内高さ：K タイプ

浴槽形状
ワイド浴槽（ベンチ付）

カウンター
人造大理石カウンター

カウンターカラー
- ホワイト
- ベージュ
- ダークグレー

※画像はダークグレーです。

浴槽エプロン
カラー

- ホワイト
- ベージュ
- ブラック

水栓
洗い場用水栓

樹脂ホース(メタル調)

サーモスタット

シャワーヘッド（SANEI製）
SB181-5UTHB1NS

節湯 B1

シャワーフックスライドバー

TN-1020

シャワーフックを上下にスライドできます。
また、お好みの角度に調整することも可能です。

天井
フラット天井（チャコールブラック）

照明
ダウンライト（ブラック）

白色

換気機器
天井換気扇

ブラック

ドア
折戸（ホワイト）

キープクリーンドア

パッキンレス　上部換気口

ミラー
ワイドクリアミラー

お湯をかけることで、くもり止め効果を発揮します。

浴槽仕様
高断熱浴槽

お湯が冷めにくいので、次に入る人も快適です。

※保温材の表現はイメージです。

浴室パネル

プレミアムクラス　※＋¥15,000(税抜き)となります。FRP浴槽仕様の場合は選択不可。



ジオマーブル モスグレー / ジオマーブル ベージュ / ジオマーブル アイボリー / ノルディック グリーン / ノルディック ベージュ

ハイクラス

テラゾーホワイト / リネンホワイト / ブリックグレー / ブリックベージュ / ブリックダーク / コンクリートグレー

フロウストーングレー / フロウストーンテラコッタ / スタッコグレー / グレージュアッシュ / ホワイトアッシュ / ウォルナットホワイト



ウォルナットグレージュ / ウォルナットブラック / パールホワイト / パールベージュ / パールブラック / キャンバスイエロー

カリビアンブルー / コラージュミックス

【FRP 浴槽仕様の場合】
★のついた柄をアクセントデザインとして選択可。
（レギュラークラスと同価格）

レギュラークラス　※ー¥20,000(税抜き)となります。

ピッコロタイル ブルー / ピッコロタイル ピンク / ラミナストーン ホワイト / ラミナストーン ベージュ / サンドストーン ホワイト / ホワイト / ダークグレー / ブラック

浴槽

キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）

シュガーライトベージュ / クリスタルパールホワイト / シュガーライトグレー / シュガーブラック

FRP浴槽

ベージュ / ホワイト / ライトグレー

洗い場

キープクリーンフロア（プレミアムクラス）

グラングレー / グランベージュ / グランホワイト

※＋¥20,000（税抜き）となります。

キープクリーンフロア（ハイクラス）

カームダークグレー / カームグレー / カームベージュ / カームホワイト

FRP フロア

ホワイトグレー / グレーベージュ / グレー

どこでもラック

タオルハンガー L

どこでもラック

小物置き S

どこでもラック

シャワーフック（チャコールグレー）

ハンドバー I型 600 mmタイプ

システムバスの特長
この心地よさ、タカラオリジナル

ピカピカ　ポカポカ　ガッチリ

優れた素材と機能性が実現する快適な浴室。

ホーローク リーン浴室パネル

お手入れカンタンで清潔、浴室の壁は高品位ホーロー。

- 毎日シャワーで流すだけ！
- 湯アカもサッとひと拭き！
- 傷つきにくく汚れにくい！

キープクリーンフロア（ハイクラス）

キープクリーンフロア

床は表面が硬く傷つきにくい磁器タイルなので、汚れが入り込まず、お手入れがカンタンです。

排水口カバー（タイル仕上げ）

キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）

クイーン オブ バス

キープクリーン浴槽

美しい光沢と質感、なめらかな手触りと優れた清掃性が魅力。

パーフェクト保温

あたたかさを逃がさない！

まるごと包み込むように、浴室全体を保温材で完全防備。

パーフェクト保温

※画像はイメージです。

震度 6 強相当の振動にも負けない強度

強さの秘密は、浴室の重さをしっかり支えるフレーム架台。

システムバス下台部分　※画像はイメージです。

カラーシミュレーション

お好みのカラーの組み合わせが見つかります！

グランスパ

●画像はイメージです。カラー・サイズ等、仕様詳細については御見積書をご確認ください。●印刷色のため実際の商品とは多少異なります。●寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。
