システムバス 御見積書

御名前　名古屋-豊橋SR SB8　様

業者　様

商品名　GRANSPA　グランスパ

作成日　2024年8月23日
プラン番号　1503C-2405-0026T
現場番号　C2944592

タカラスタンダード株式会社
◆豊橋営業所
愛知県豊橋市下地町字境田84番地
TEL 0532-54-5262 / FAX 0532-53-5022

◆豊橋ショールーム
TEL 0532-54-5323 / FAX 0532-53-5031

商品
御見積金額　¥736,000　（ 税込 ¥809,600 ）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　¥137,000　（税込 ¥150,700）

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
SB8		

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ	S1216（AR勝手）
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームダークグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトグレー
浴槽形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	ー
カウンター/下カバーカラー	ー
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス　/　ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー（正面）	ブリックグレー
パネルカラー（周辺）	ホワイト
ガス種　/　周波数	未定　/　60Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社支店営業所等へお問い合わせ、又はカタログにて、よく御確認下さいませ。
☆組立工事費には給水、給湯、ガス、ダクト電気等の接続工事は含まれておりません。
☆この御見積書の有効期間は30日間です。

No.*

御名前 名古屋-豊橋SR SB8 様

現場番号	C2944592	プラン番号	1503C-2405-0026T	作成日	2024/8/23

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ S1216サイズ		1	690,000	690,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	片引戸＜800幅＞（ホワイト）／樹脂ガラス（半透明）（19サイズ）	1	+50,500	+50,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア（ハイクラス・カームダークグレー）	1		
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>（高断熱浴槽）（シュガーライトグレー）	1		
9	浴槽追焚き穴	なし	1		
10	エプロン	カラーステンレス（保温材あり）（ホワイト）	1		
11	浴槽形状	人大セミスクエア浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯（ジェットバス機能付）	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	兼用1水栓	サーモ水栓：樹脂製ホース（メタル調）KF3000HC-1N	1	+7,000	+7,000
19	兼用1水栓	標準シャワーヘッド：KF3000HC-1N	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	カウンターなし（兼用水栓）	1	−43,500	−43,500
22	中間棚		1	+4,000	+4,000
23	シャワーフックスライドバー	あり	1		
24	浴室パネル	ハイクラス（一面デザイン）（Kパネル）	1		
25	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
26	天井	高光沢フラット天井	1		
27	換気機器	天井換気扇ホワイト	1		
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	キュービッククリアライト＜2灯＞（電球色）	1	+11,000	+11,000
30	ミラー	ショートミラー（フック固定）	1	−11,500	−11,500
31	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+3,000	+3,000

御名前 名古屋-豊橋SR SB8 様

現場番号	C2944592	プラン番号	1503C-2405-0026T	作成日	2024/8/23

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
33	ハンドバー	樹脂製 I型600タイプ（風呂フタフック付）（ﾊﾞｰ：ﾎﾜｲﾄ、ﾌｯｸ：ﾎﾜｲﾄ）	1	+13,500	+13,500
34	ハンドバー	樹脂製 I型400タイプ（ホワイト）	1	+8,000	+8,000
35	収納棚	収納棚なし	1		
36	給水給湯管	壁付兼用水栓	1		
37	トラップカバー	なし	1		
	システムバス合計		37		¥736,000

商品総合計	37	¥736,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費 ¥137,000 (税込 ¥150,700)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

（ ）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

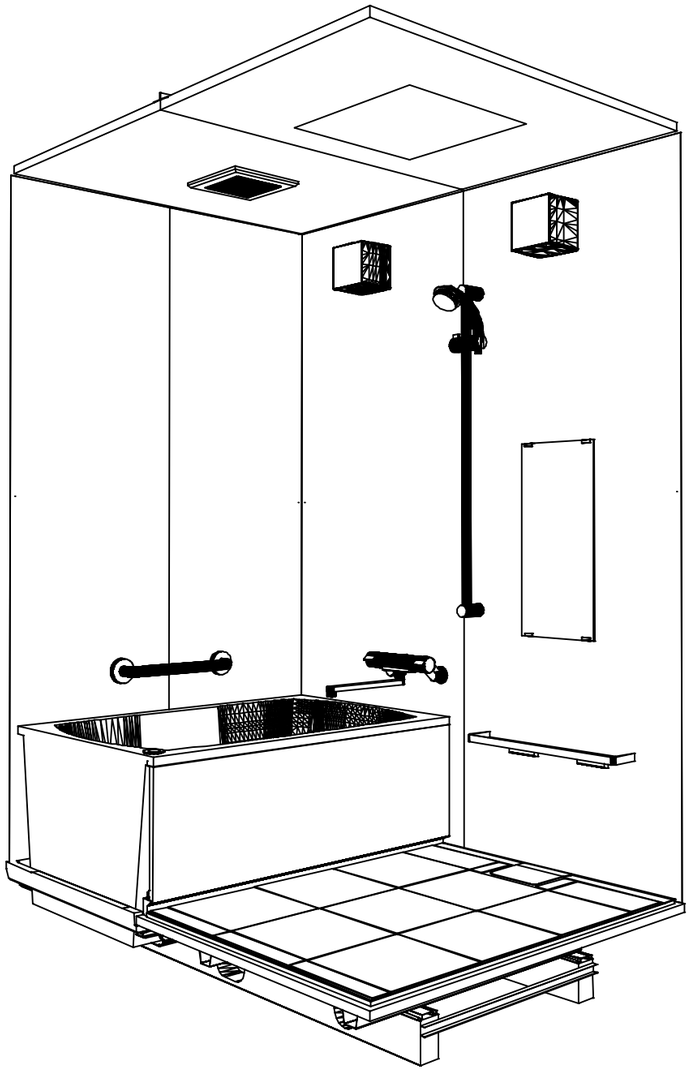

鳥瞰図

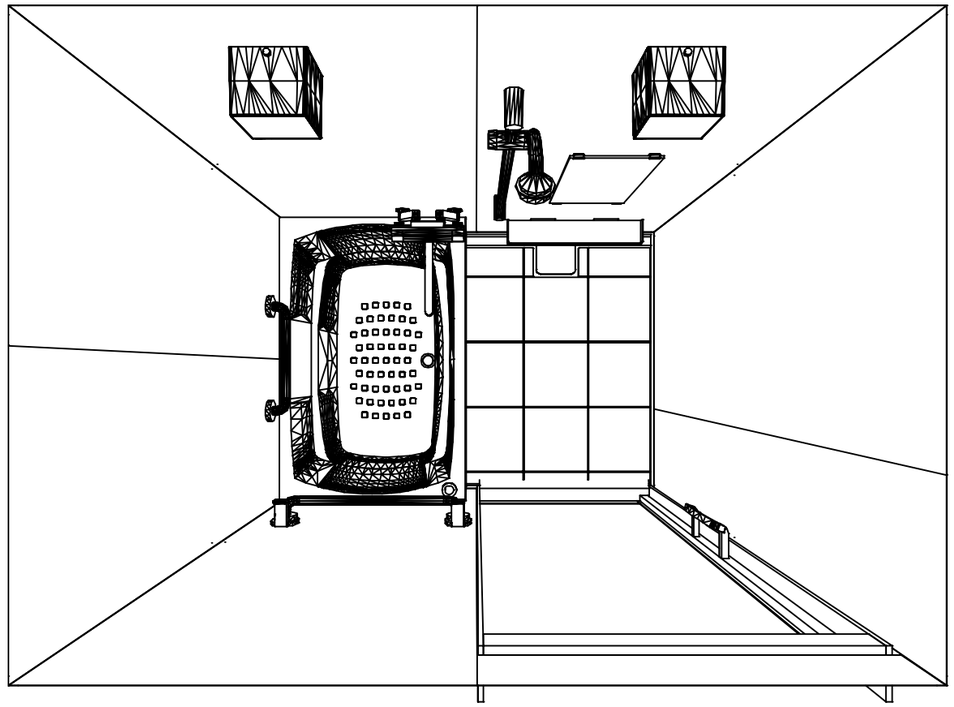

S1216

高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	姿図	
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日	
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍



■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

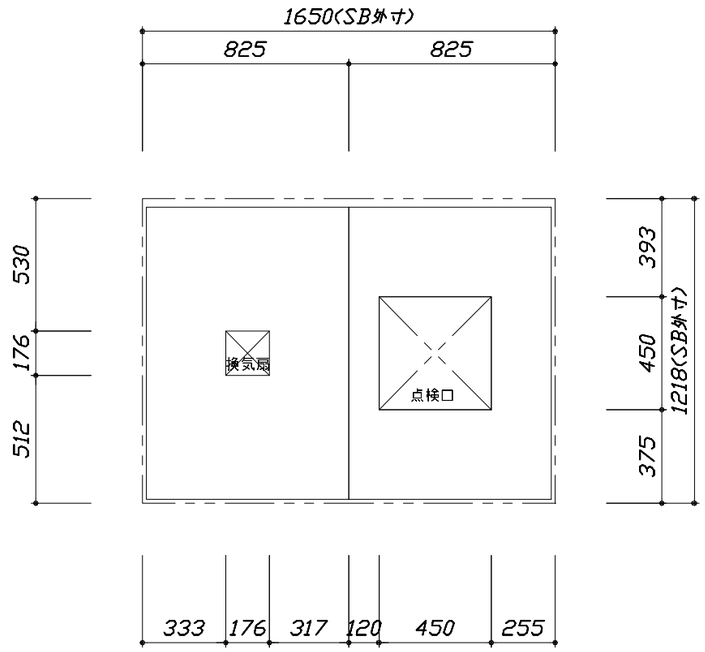

＜天井伏図＞

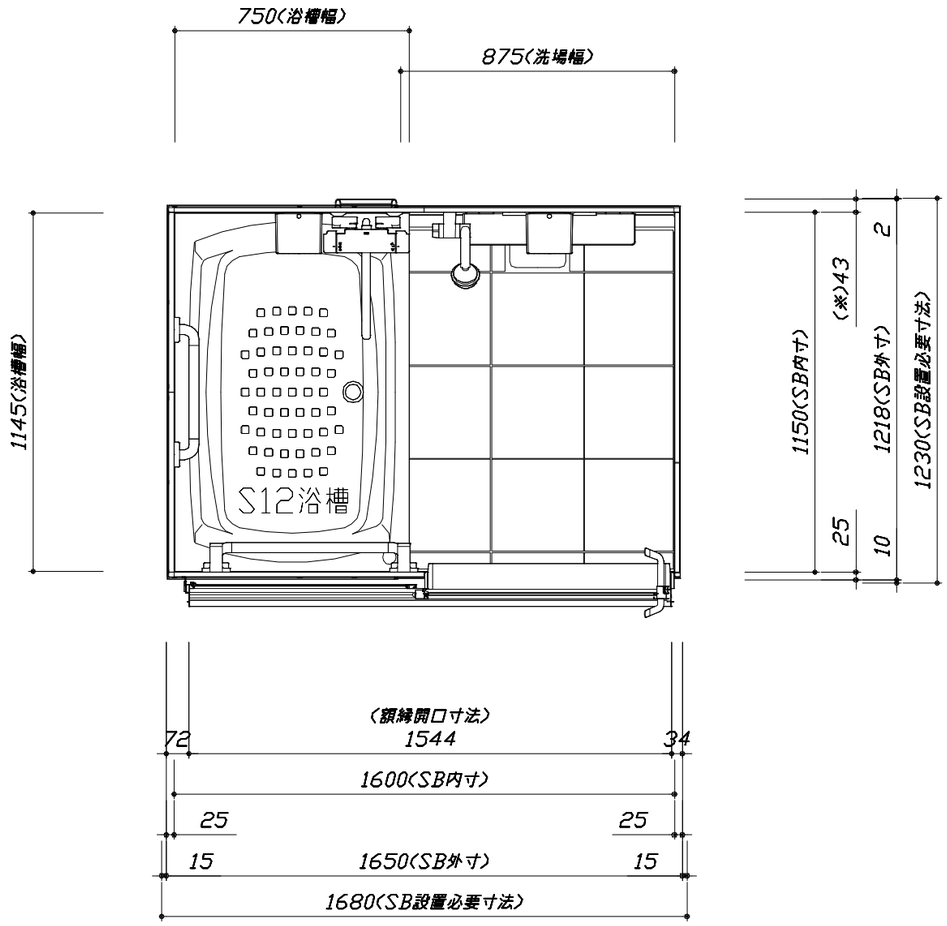

＜平面図＞

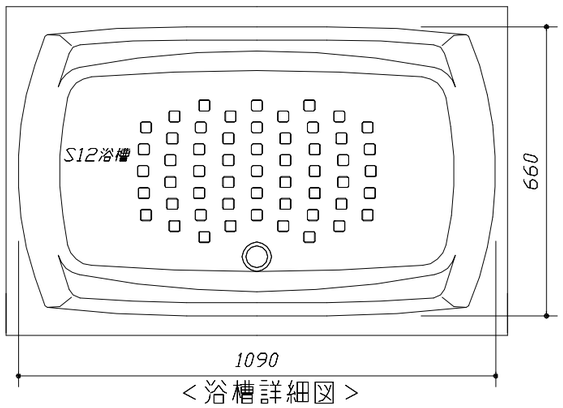

＜浴槽詳細図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	施工図1	縮 尺： 1:25,20
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日	
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・１２方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との
　打ち合わせを十分おこなってください。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



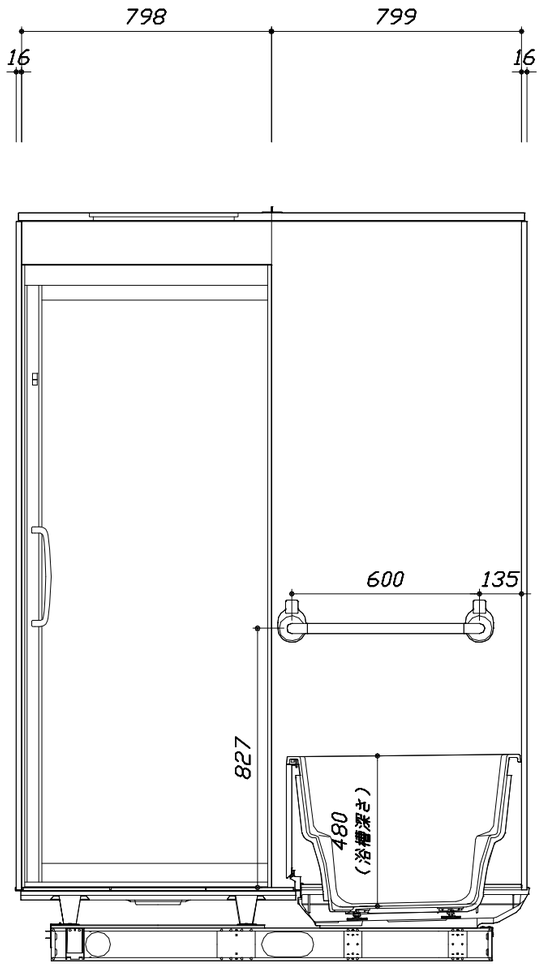

＜カウンター対面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

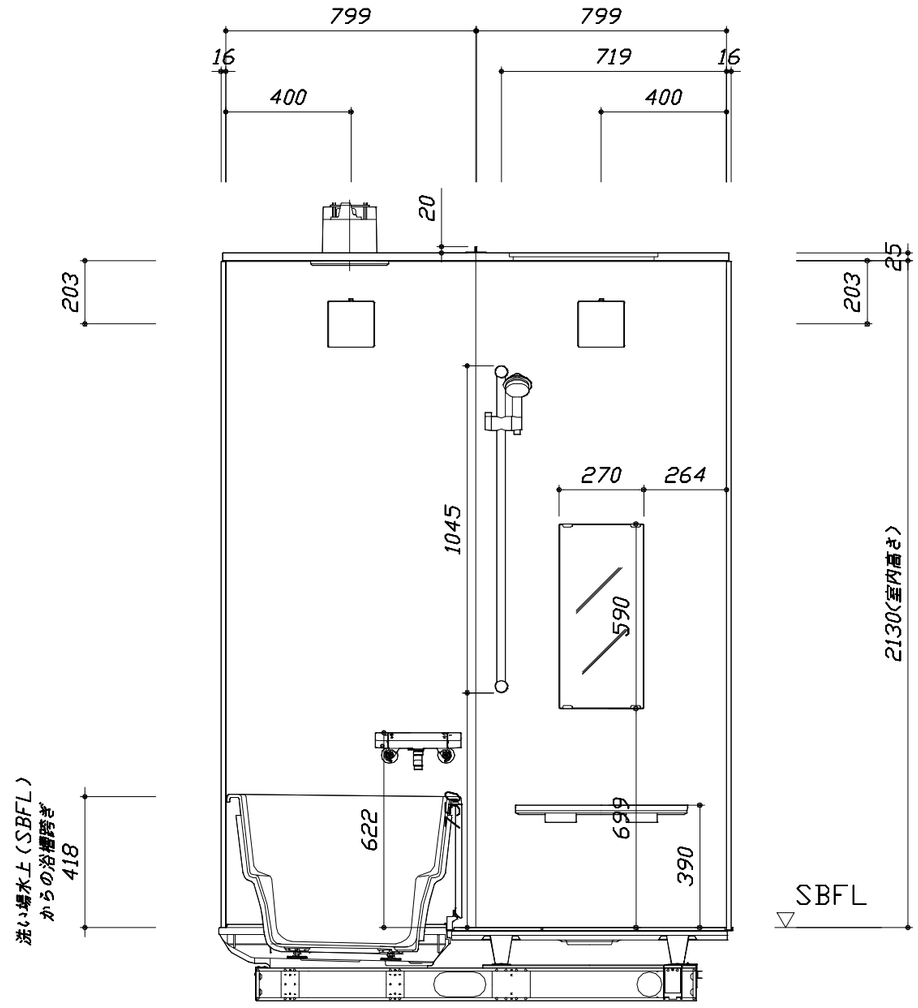

＜カウンター面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	施工図2	縮 尺： 1:20
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日	
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は17mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・１２方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との
　打ち合わせを十分おこなってください。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



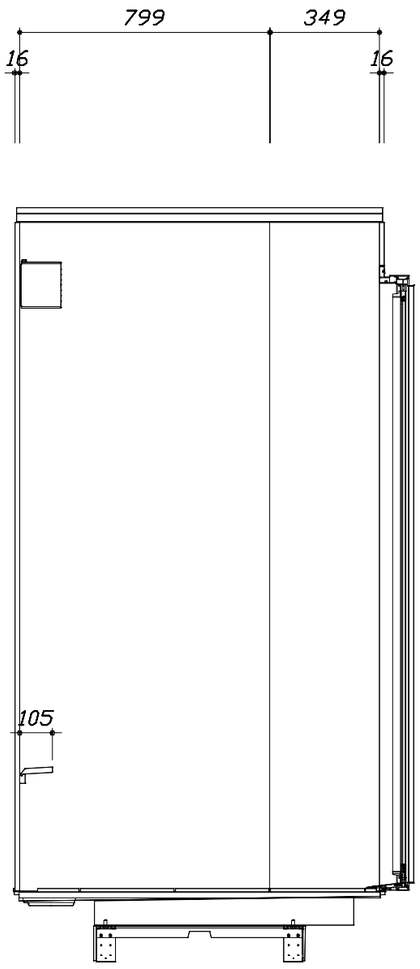

＜洗場側面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

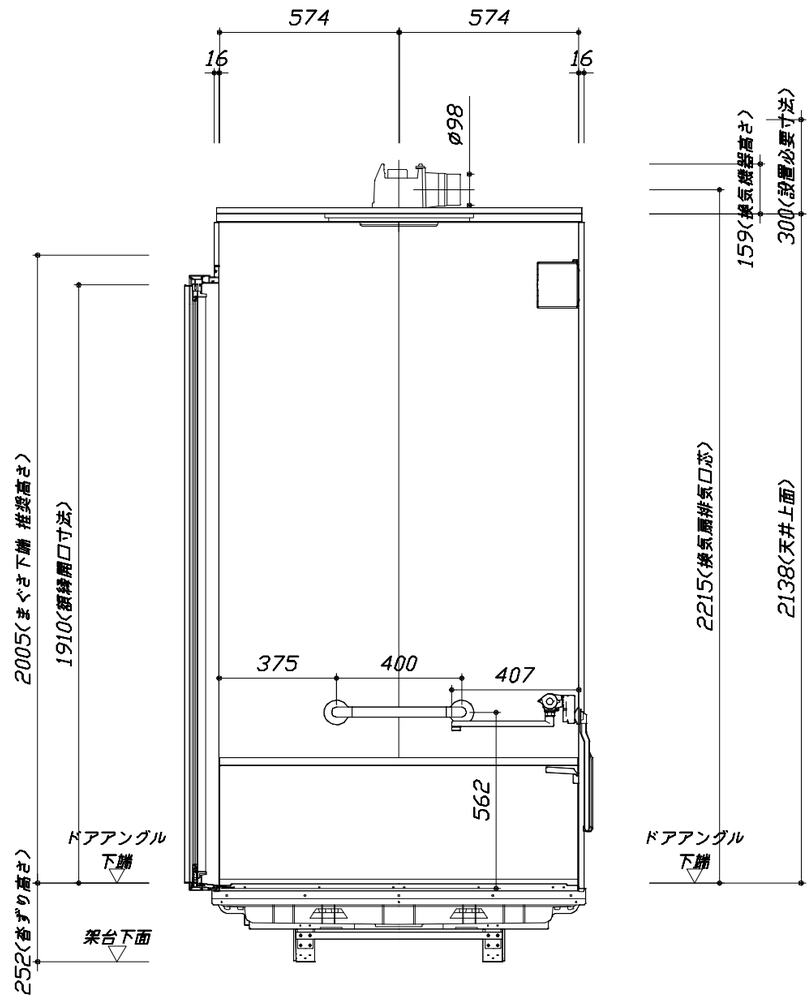

＜浴槽側面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	施工図3	縮 尺： 1:20
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日	
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	S1216サイズ(室内容量3.9立方メートル)
ドア勝手	AR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼　保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（S12浴槽・240リットル）追い焚き穴:なし
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング)　裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	中間棚：AS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー　裏面保温材　タオル掛け穴:なし
天井	高光沢ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：なし
ドア	ｷｰﾌﾟｸﾘｰﾝﾄﾞｱ:19高さ片引戸(ｱﾙﾐ框/樹脂ｶﾞﾗｽ/ﾀﾃ型換気口)
窓１	―
窓２	―
窓枠１	―
窓枠２	―
排水トラップ	洗い場:ＡＢＳ樹脂,　浴槽:ＡＳＡ樹脂　　封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ　VU50
製品重量	235kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ショートミラー（フック固定）
収納棚	―
タオル掛け	―
洗場側水栓	―
浴槽側水栓	―
兼用水栓	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ(KF3000HC-1N)(樹脂ﾎｰｽ:ﾒﾀﾙ調)
ﾌｯｸ/ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ	シャワーフックスライドバー（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰTN-1020）
照明	キュービッククリアライト　(LED　13.0W電球色)(2灯)
換気機器	天井換気扇(100V･最大消費電力9.3W)(ﾀﾞｸﾄ径φ98)ホワイト
フロフタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	―
ハンドバー①	―
ハンドバー②	―
ハンドバー③	樹脂製　I型600タイプ(フロフタフック付)　ホワイト
ハンドバー④	樹脂製　I型400タイプ　ホワイト
ハンドバー⑤	―
ハンドバー⑥	―
ハンドバー⑦	―

本体カラー

浴槽	GN：シュガーライトグレー
カウンター	―(カウンターなし)
ﾊﾟﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	CI：ブリックグレー
ﾊﾟﾈﾙ(周辺･3面)	W：ホワイト
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	―
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HC：カームダークグレー
ドア / 天井	W：ホワイト / HW：ホワイト
収納棚	―
タオル掛け	―
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	―

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

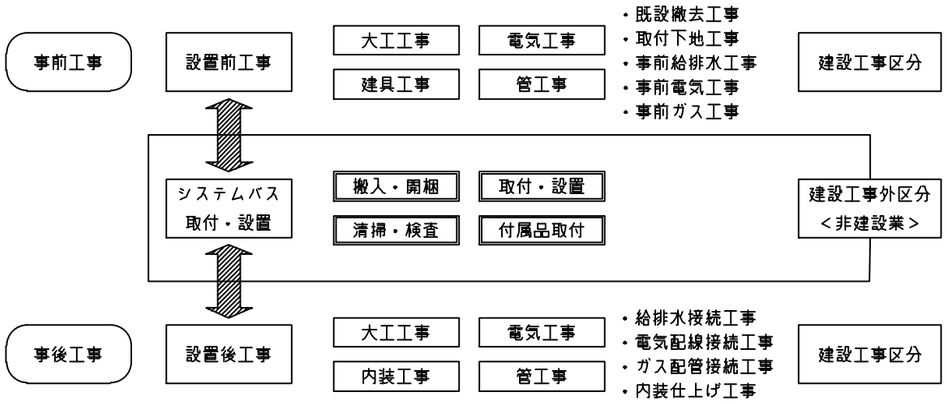

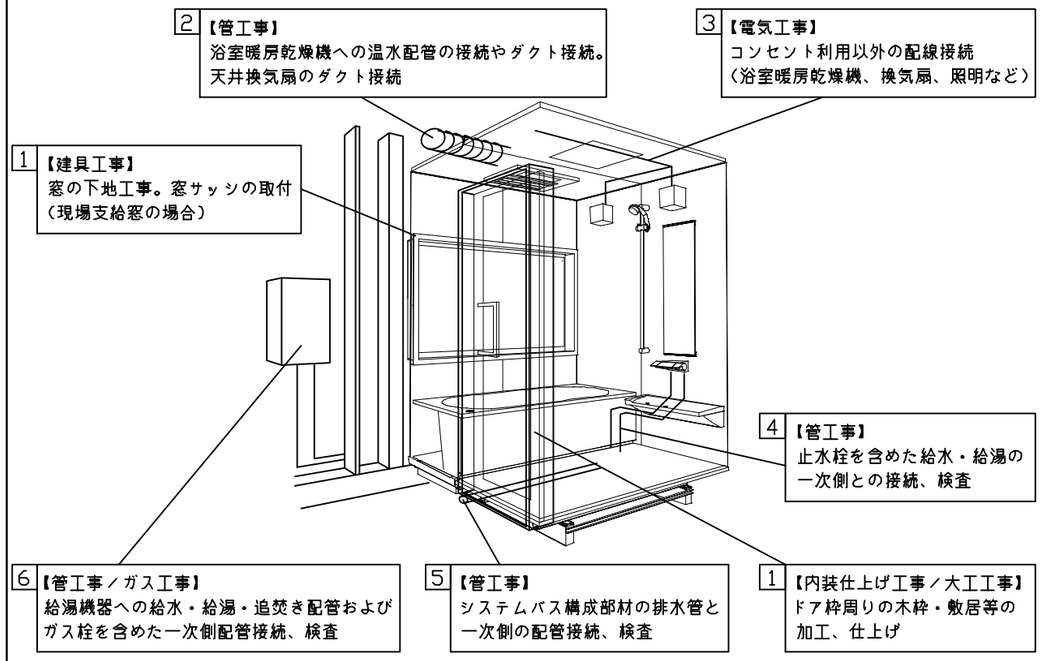

■システムバス　工事区分　　参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位（図）	業種区分	作業名称（区分）	建設工事 大工工事	建設工事 とび土工工事	建設工事 建具工事	建設工事 管工事	建設工事 電気工事	建設工事外 給湯機器設備	建設工事外 システムバス設置	作業内容
設置前工事		大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
	1	管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
	2		換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
	3		給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス本体取付・設置		建設工事外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置　【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付　【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付　【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付　【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付　【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充塡							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充塡
			試運転・完成検査　【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事			建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
	1	管 大工 電気	排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
	2		浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	3		浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	5		建築側排水配管との接続工事　【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
	6		給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
	3		浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　名古屋ー豊橋SR　SB8様邸	GRANSPA　グランスパ	工事区分表
	現場番号：　C2944592	プラン番号：　1503C-2405-0026T	作成日：　2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業　：SB8	担当アドバイザー：

■ 排水配管工事注意事項

●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
●2重トラップにしないでください。
●配管途中で配管径を狭めないでください。
●排水勾配は1/100～1/50設けてください。
●排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
●給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

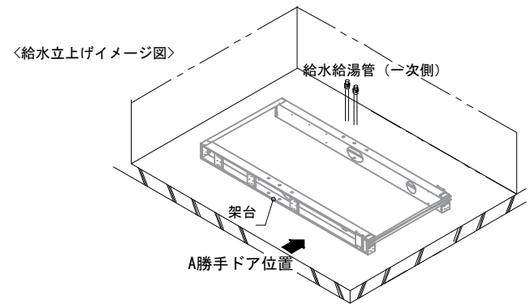

■土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より２６５mm下がりで打設してください。

■設備記号

記号	記号の意味
⊠	給水位置
◙	給湯位置



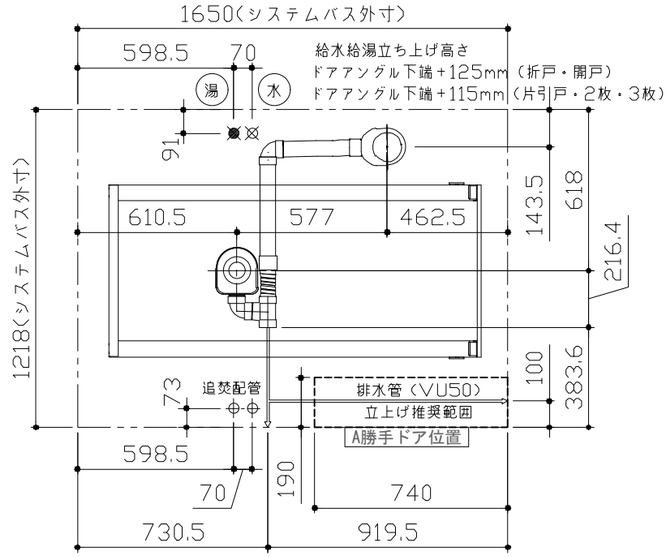



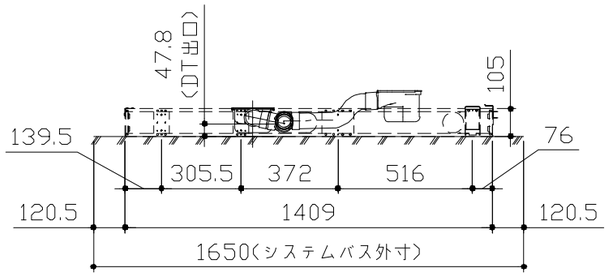

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

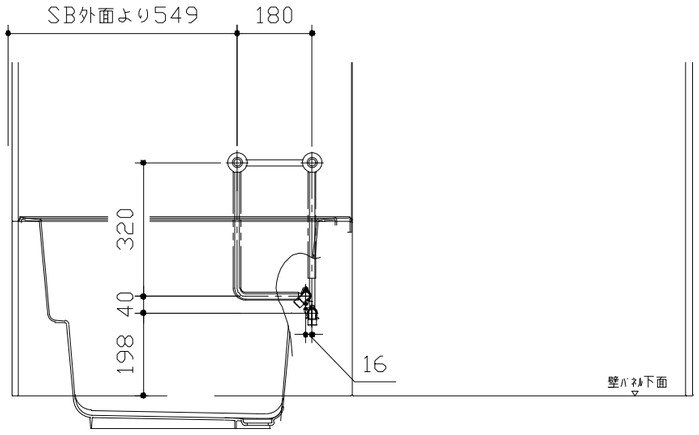



ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・２枚引戸・３枚引戸	173

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	排水配管図
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：

■必ずご確認ください
（１）図面の見方
・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
・マス表示：□=20mm角

（２）留意事項
・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

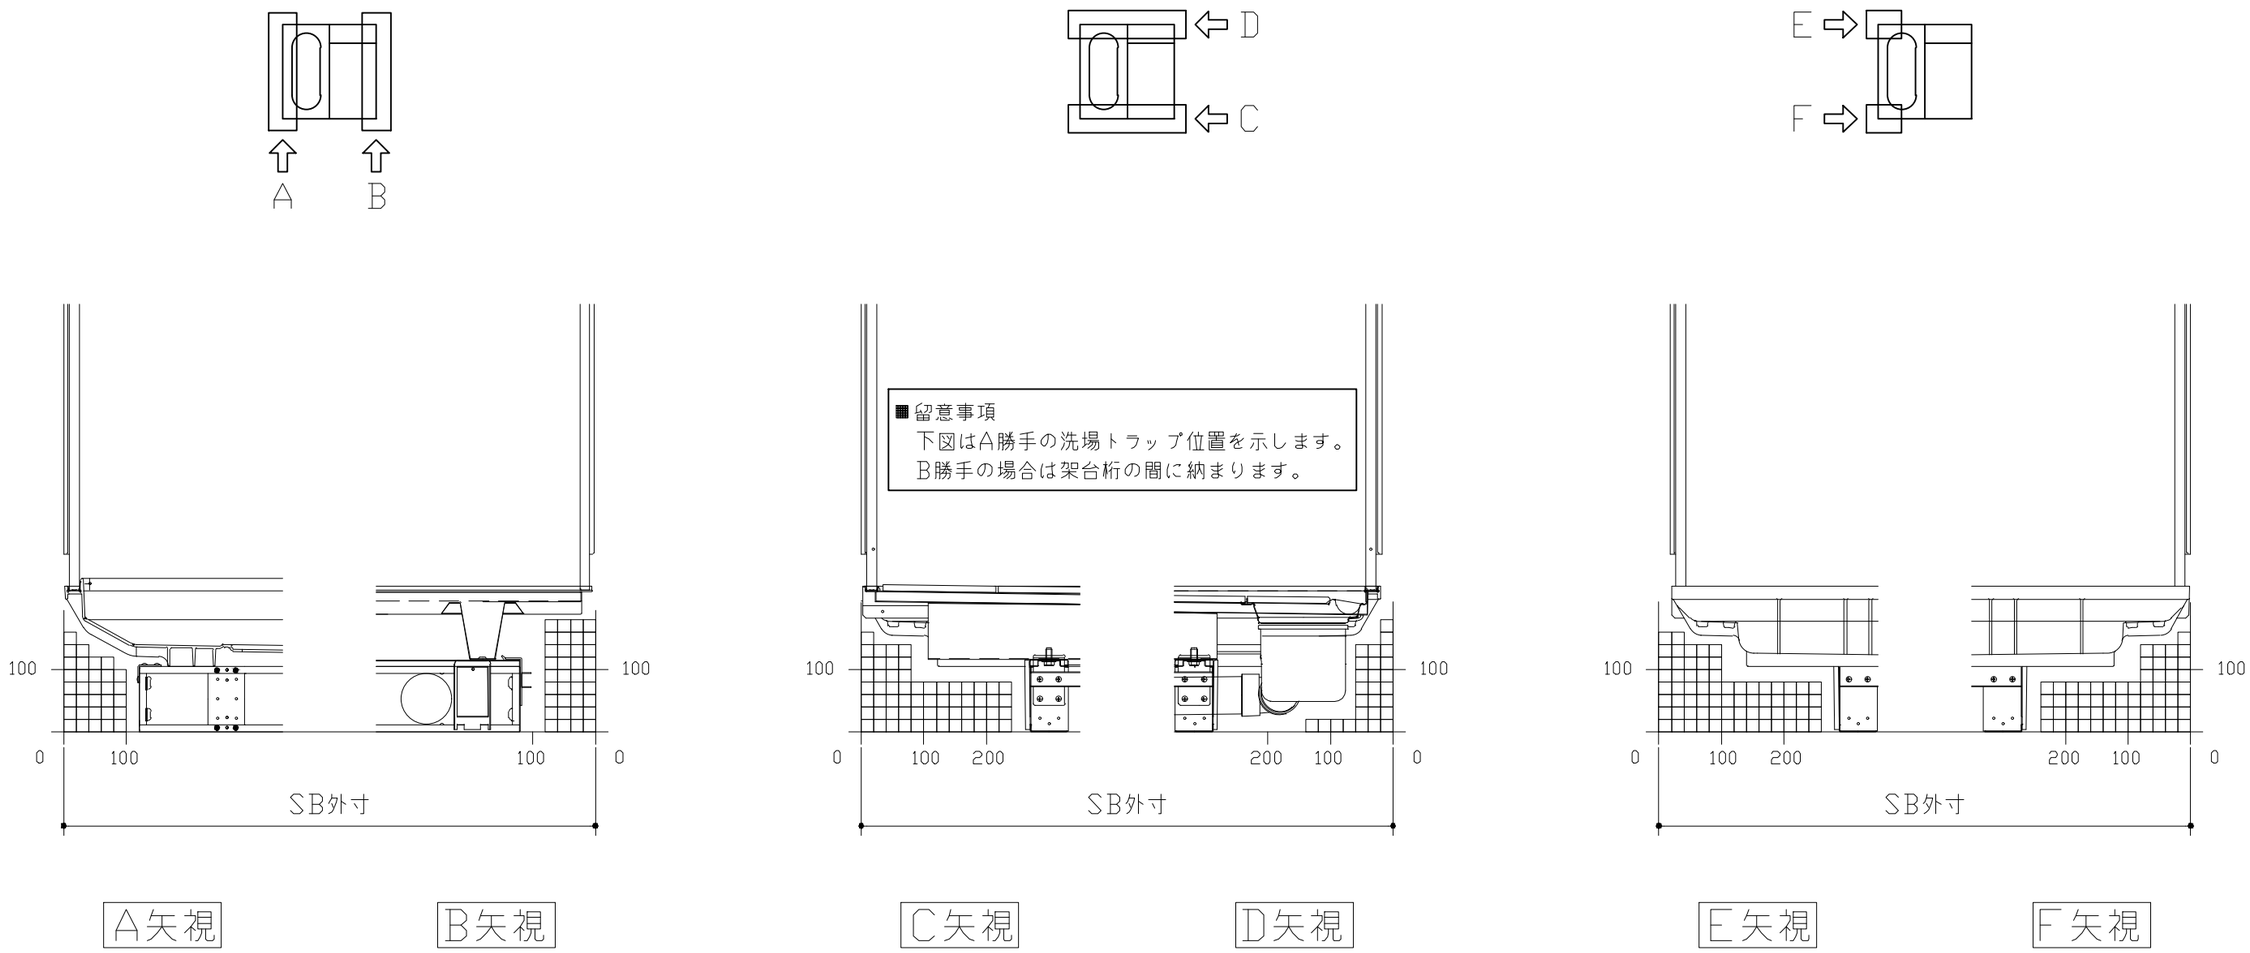

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	床下空間図
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：

キープクリーンドア：片引戸・タテ型換気口

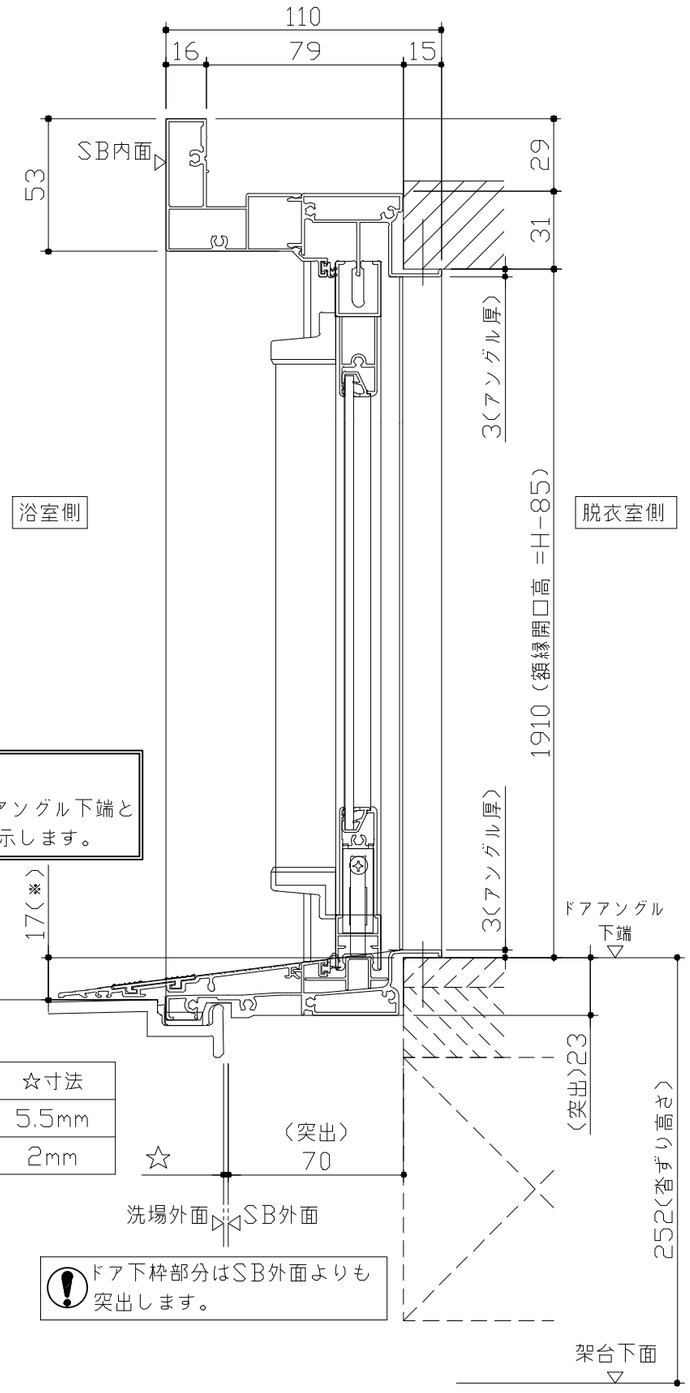

■留意事項
※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

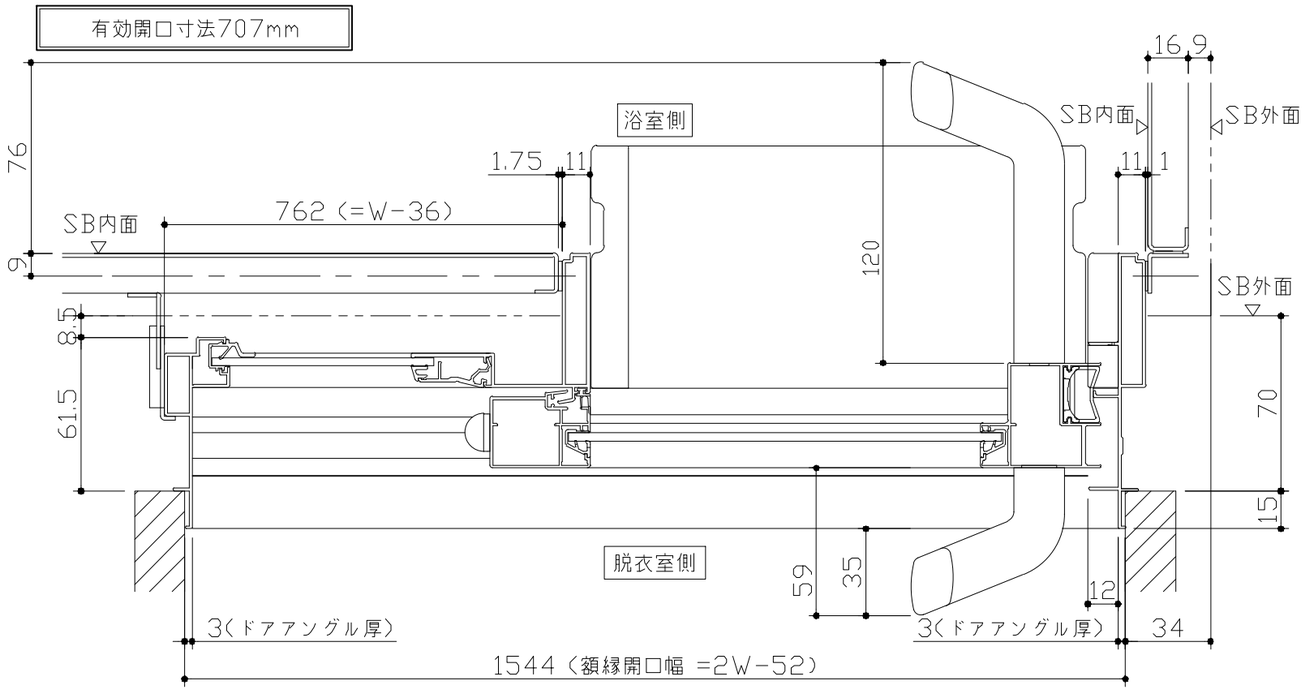

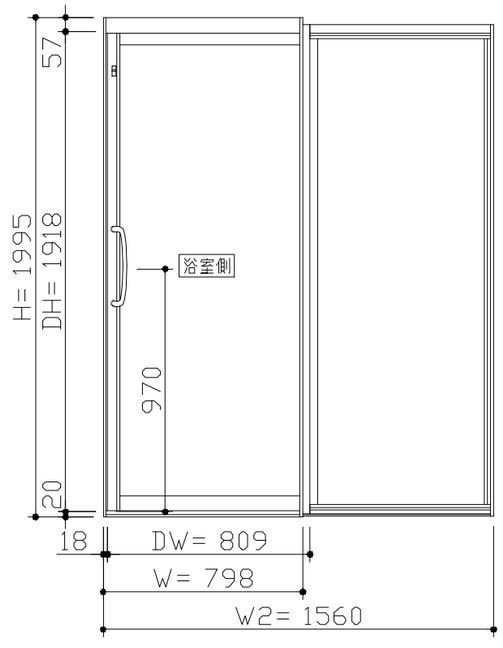

〈姿図〉

■ドア横の管柱、間柱について
- ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	ドア取合詳細図
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：

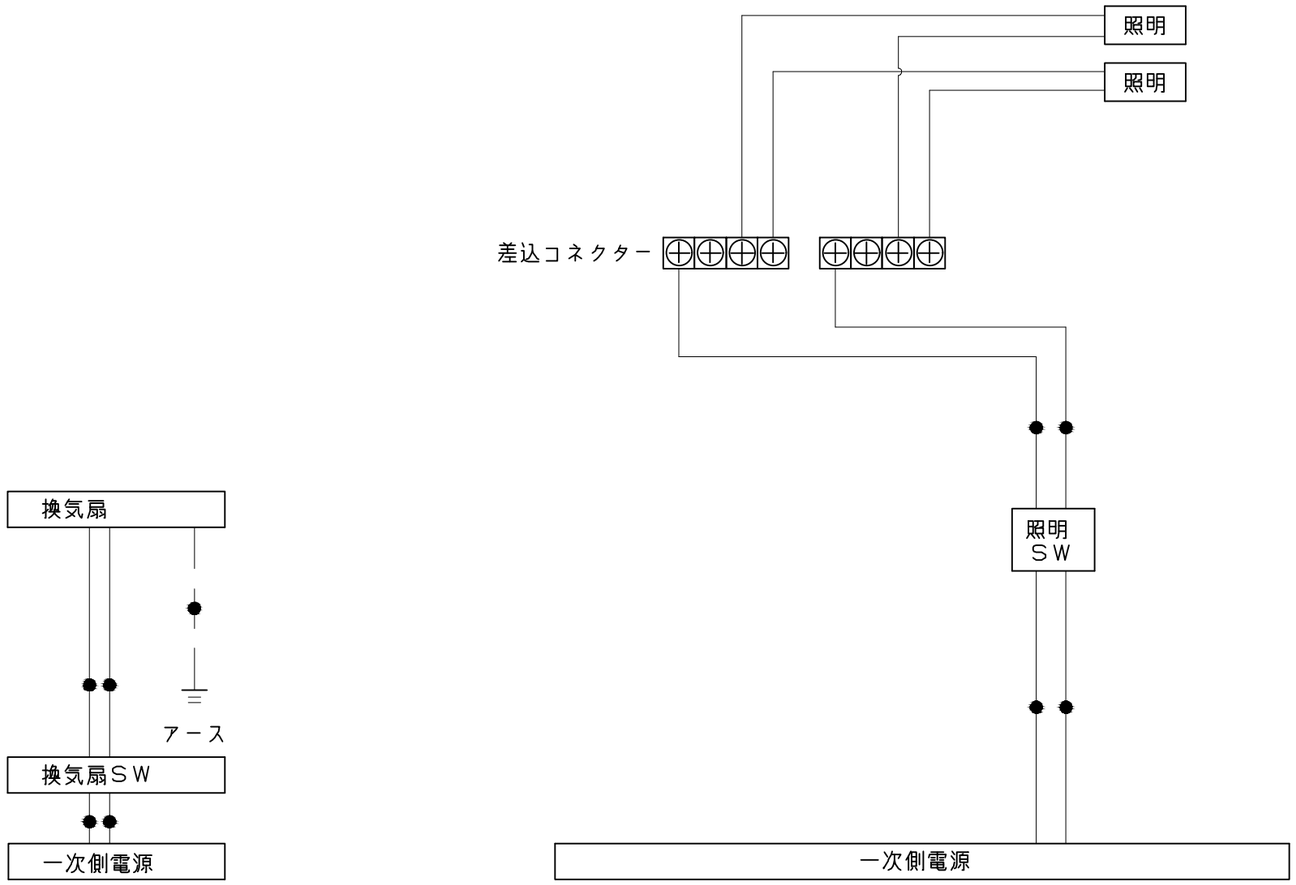

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、
電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR　SB8様邸	ＧＲＡＮＳＰＡ　グランスパ	電気配線図
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業　：SB8	担当アドバイザー：

浴槽

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法 L	浴槽奥行寸法 A
規格 1218	1145	27.5
1243	1170	40

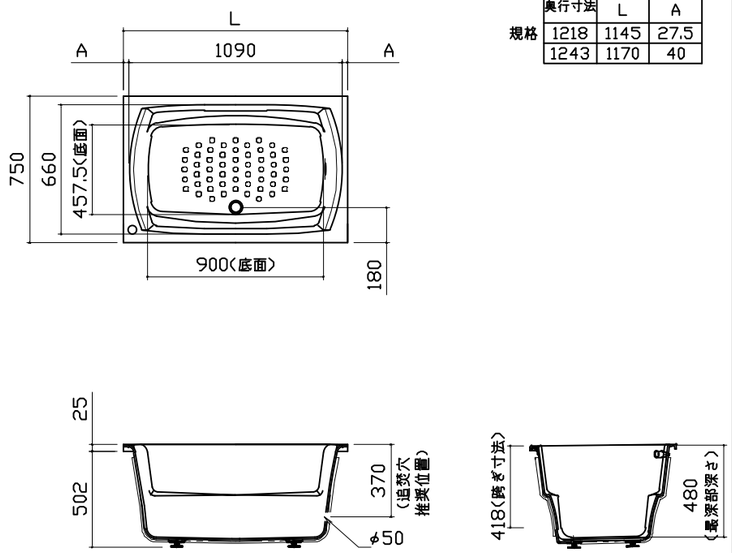

兼用水栓



照明

キュービッククリアライト
LED 6.5W (1灯あたり) 口金E17



換気機器

管工事

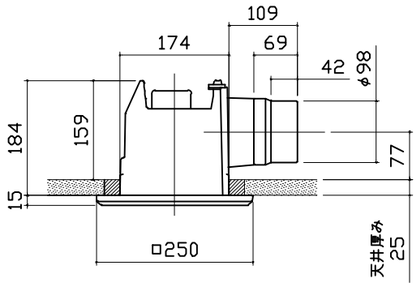

シャワーフックスライドバー

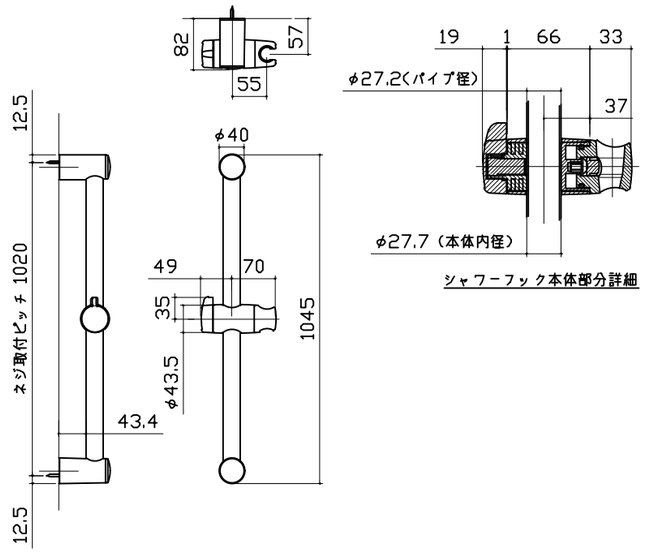

ミラー

枠：SUS304 t0.8
ミラー：表面防曇コートなし

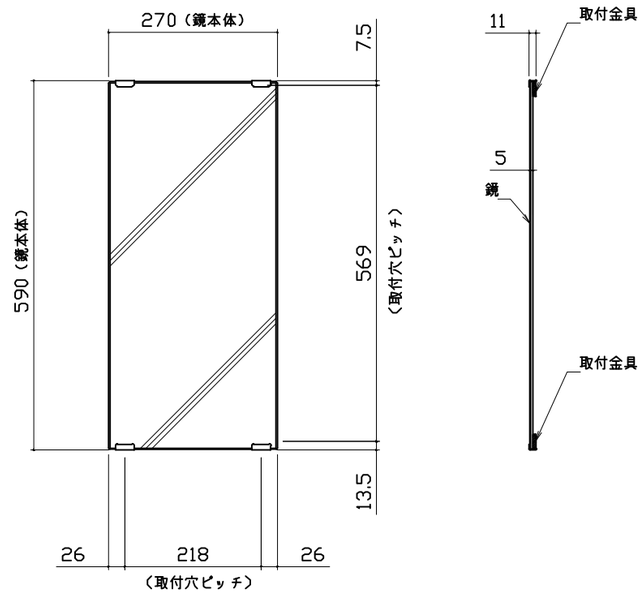

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	部材詳細図 1/2
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：

中間棚

本体：AS

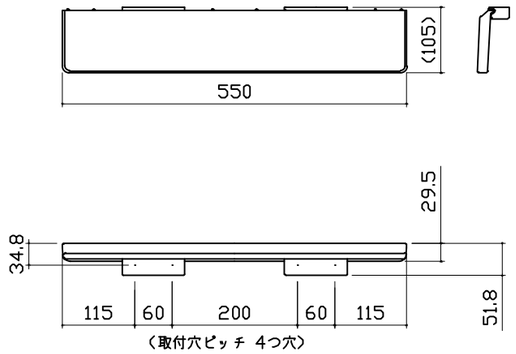

ハンドバー支持部取合詳細図

安心ハンドバー（風呂フタフック付）以外の場合

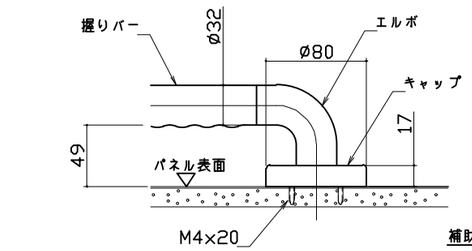

安心ハンドバー（風呂フタフック付）の場合

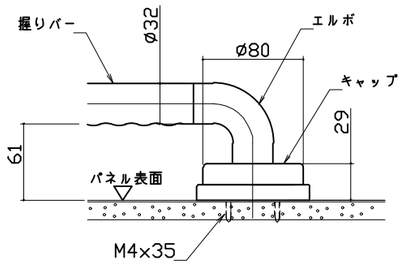

補助スペーサー



風呂フタ受け本体

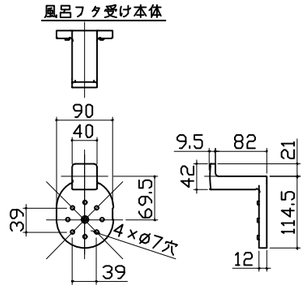

風呂蓋　フロフタMVAH-S12WT

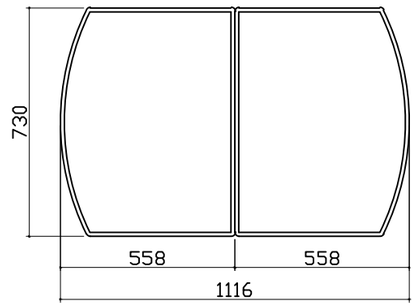



洗い場側排水トラップ

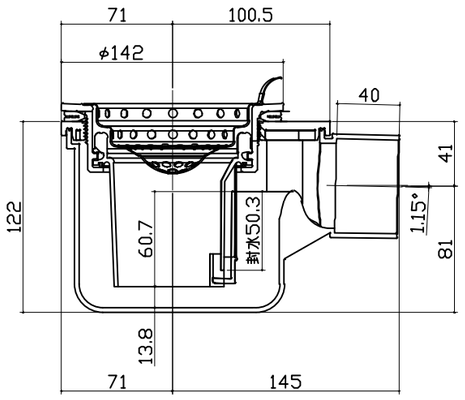

浴槽側排水トラップ

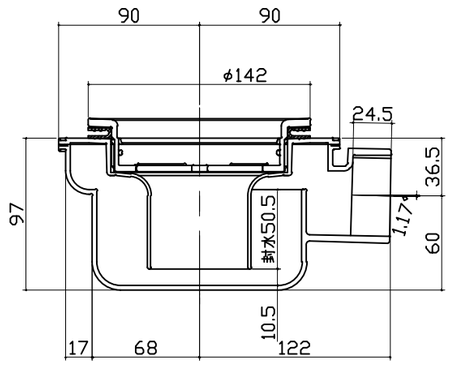

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　名古屋ー豊橋SR　SB8様邸	GRANSPA　グランスパ	部材詳細図　2/2
	現場番号：　C2944592	プラン番号：　1503C-2405-0026T	作成日：　2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業　：SB8	担当アドバイザー：

パネル割図

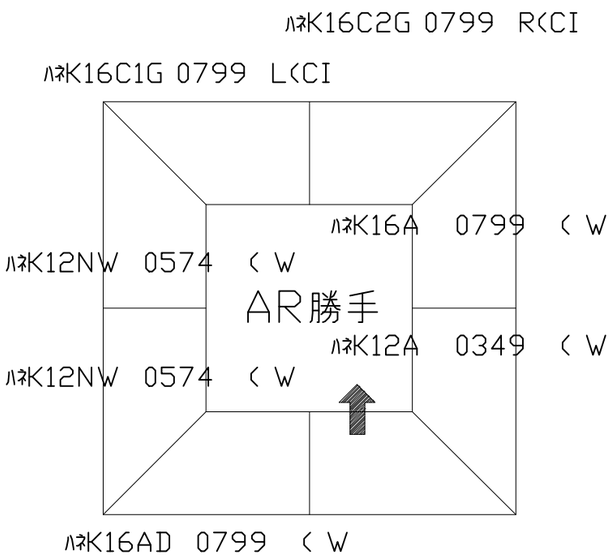

ミラー

ﾊﾈK16C2G 0799 R(CI

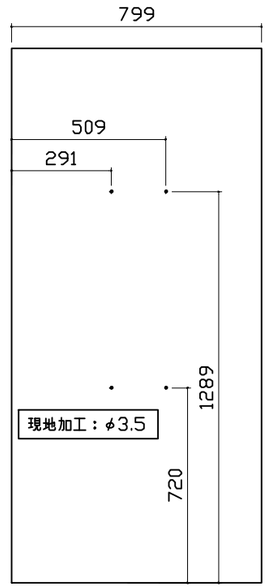

シャワーフックスライドバー

ﾊﾈK16C2G 0799 R(CI

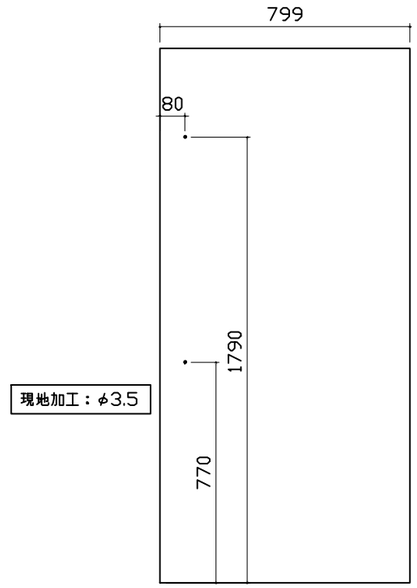

中間棚

ﾊﾈK16C2G 0799 R(CI

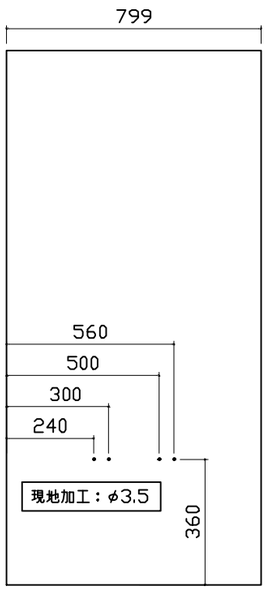

兼用水栓取付穴

ﾊﾈK16C1G 0799 L(CI

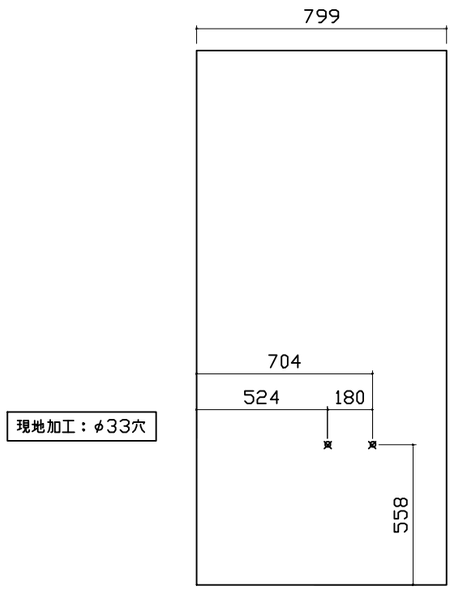

照明

ﾊﾈK16C2G 0799 R(CI

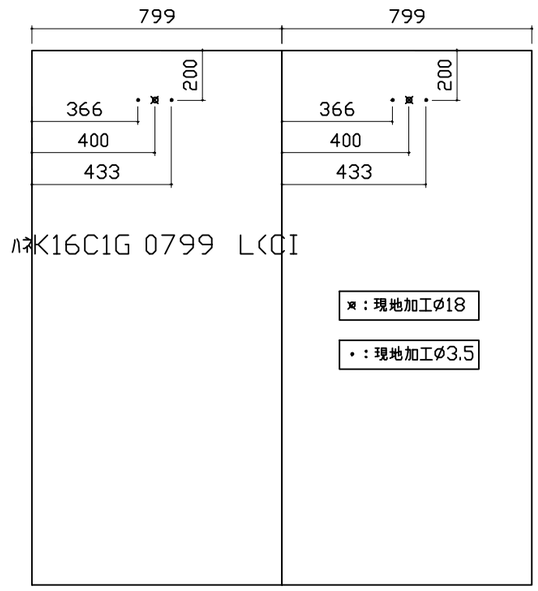

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 名古屋ー豊橋SR SB8様邸	GRANSPA グランスパ	穴開け指示図 1/1
	現場番号： C2944592	プラン番号： 1503C-2405-0026T	作成日： 2024年8月23日
	豊橋営業所	担当営業 ：SB8	担当アドバイザー：
