システムバス 御見積書

御名前　横浜-横浜SR SB33　様

業者　様

商品名　GRANSPA　グランスパ

作成日　2024年8月31日
プラン番号　2701A-2404-0893T
現場番号　C3420942

タカラスタンダード株式会社
◆横浜支店 販売課
神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
TEL 045-435-8033 / FAX 045-435-8051

◆横浜ショールーム
TEL 045-435-8039 / FAX 045-435-8055

商品
御見積金額　¥898,900　（ 税込 ¥988,790 ）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　¥164,000　（税込 ¥180,400）

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
	横浜SR	横浜SR

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616（BR勝手）
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームダークグレー
浴槽材質	アクリル人造大理石
浴槽カラー	シュガーライトグレー
浴槽形状	セミスクエア浴槽
カウンター材質	ー
カウンター/下カバーカラー	ー
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	ステンレス　/　ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー（正面）	スタッコグレー
パネルカラー（周辺）	スタッコグレー
ガス種　/　周波数	未定　/　50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

No.*

御名前 横浜-横浜SR SB33 様

現場番号	C3420942	プラン番号	2701A-2404-0893T	作成日	2024/8/31

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸＜800幅＞（ブラック）／強化ガラス（透明）（19サイズ）	1	+59,500	+59,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・全面デザインハイクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア（ハイクラス・カームダークグレー）	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>（高断熱浴槽）（シュガーライトグレー）	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス（保温材あり）（ブラック）	1		
11	浴槽形状	人大セミスクエア浴槽	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯（ジェットバス機能付）	なし	1		
14	うるぽか湯	なし	1		
15	オートウォッシュ	なし	1		
16	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
17	浴槽パン	あり	1		
18	洗い場用水栓	サーモ水栓：樹脂製ホース（メタル調）SB182-H	1	+46,000	+46,000
19	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド：SB182-HB1	1		
20	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
21	カウンター	カウンターなし（洗い場1水栓）	1	−51,000	−51,000
22	シャワーフックスライドバー	あり	1		
23	浴室パネル	ハイクラス（全面デザインハイクラス）（Kパネル）	1	+40,000	+40,000
24	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
25	天井	高光沢フラット天井	1		
26	換気機器	浴室暖房乾燥機（100V）ホワイト	1	+45,500	+45,500
27	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ（1本）	1		
28	換気機器開口	工場開口	1		
29	照明	ダウンライト照明（3灯）（白色）	1	−3,000	−3,000
30	天井照明開口	工場開口	1		
31	ミラー	ミラーなし	1	−18,000	−18,000

御名前 横浜-横浜SR SB33 様

現場番号	C3420942	プラン番号	2701A-2404-0893T	作成日	2024/8/31

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
33	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,000	-1,000
34	収納棚	収納棚なし	1		
35	どこでもラック	小物置きS＋フック＋タオルハンガー（チャコールグレー）	1	+4,400	+4,400
36	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
37	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
38	トラップカバー	なし	1		
39	ブロック積用ボンド	2段用	1	+2,000	+2,000
	システムバス合計		39		¥898,900

商品総合計	39	¥898,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

システムバス商品組付費 ¥164,000 (税込 ¥180,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

（ ）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

パース

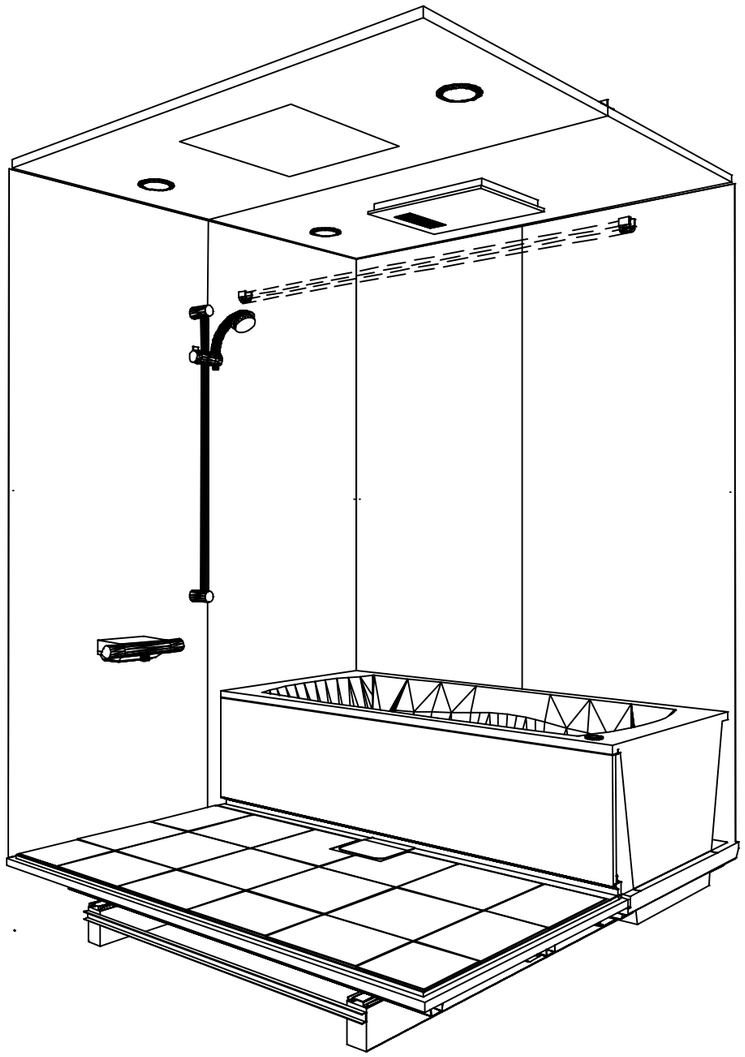

鳥瞰図

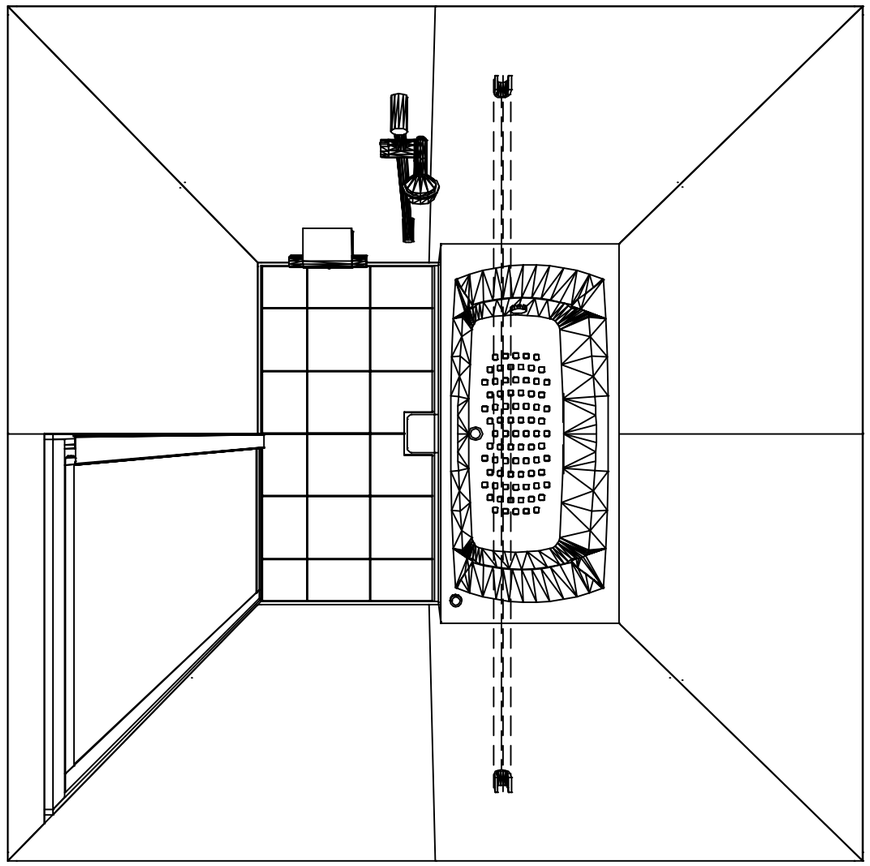

1616

高光沢フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜−横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	姿図
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A−2404−0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR

縮尺：A3サイズ等倍

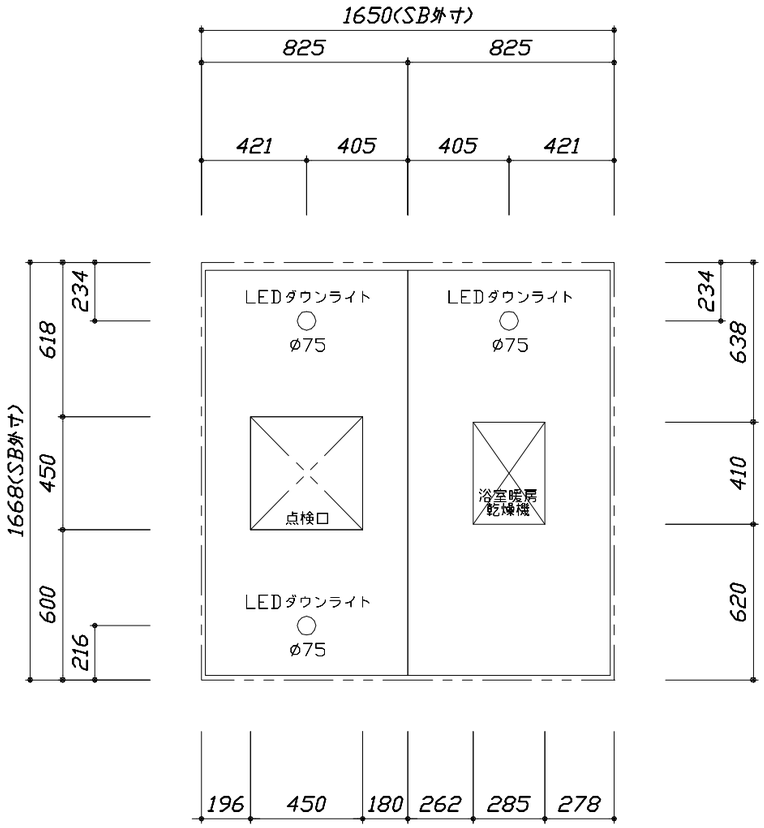

＜天井伏図＞

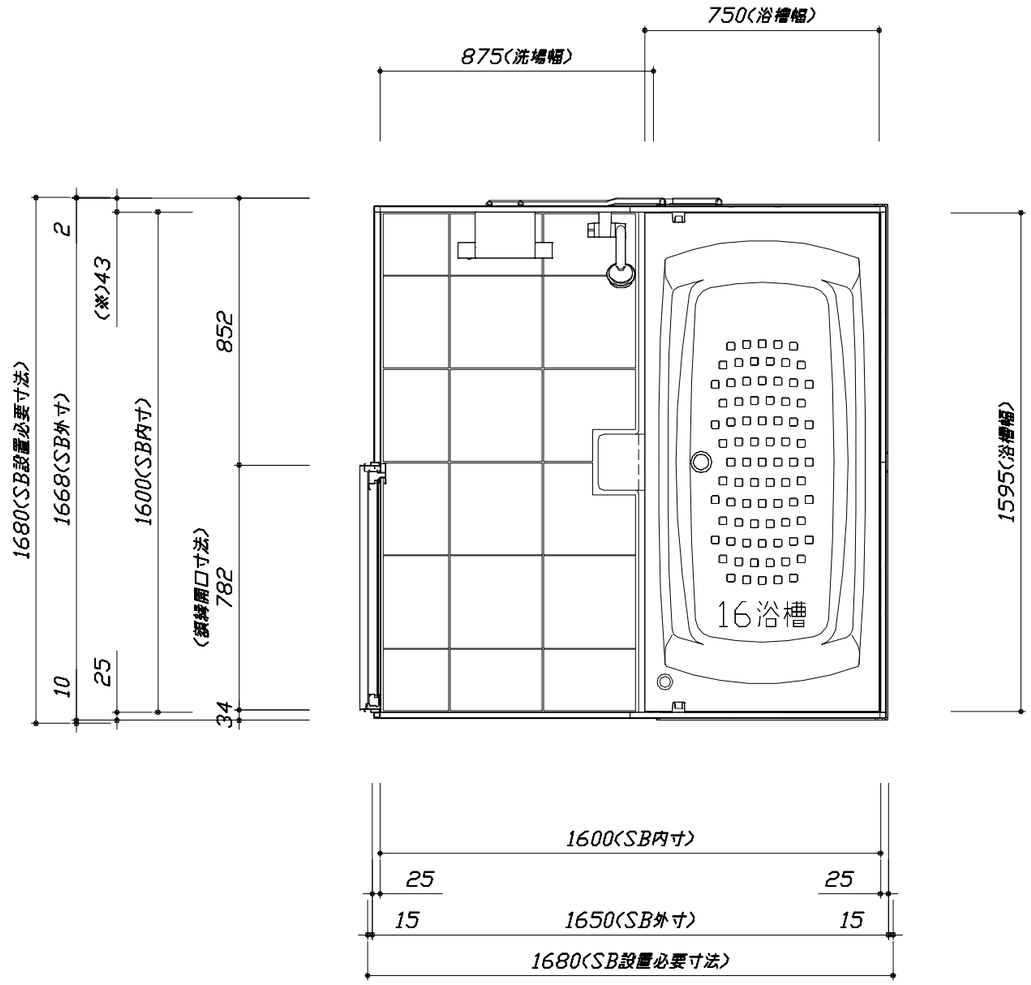

＜平面図＞

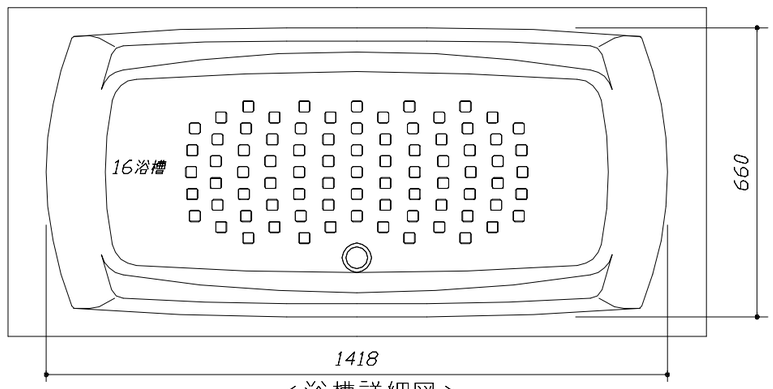

＜浴槽詳細図＞



■留意事項
※印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜ー横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	施工図1	縮 尺： 1:25,20
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日	
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



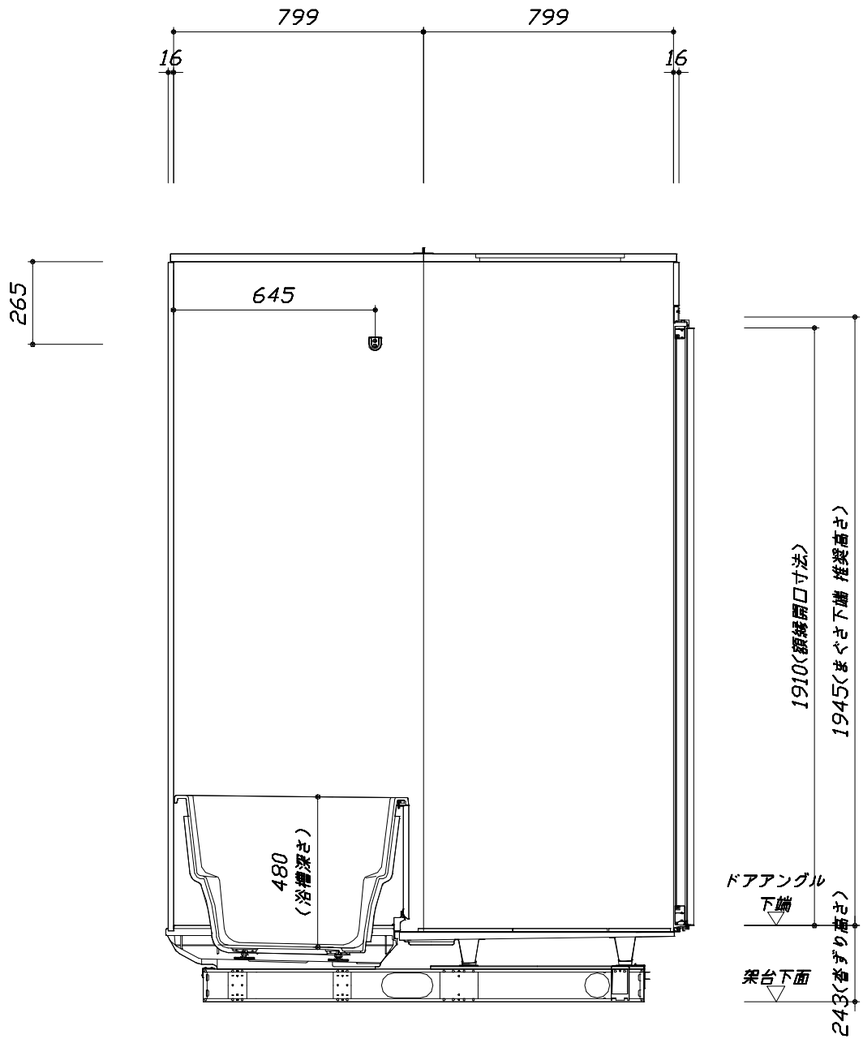

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

＜カウンター対面図＞

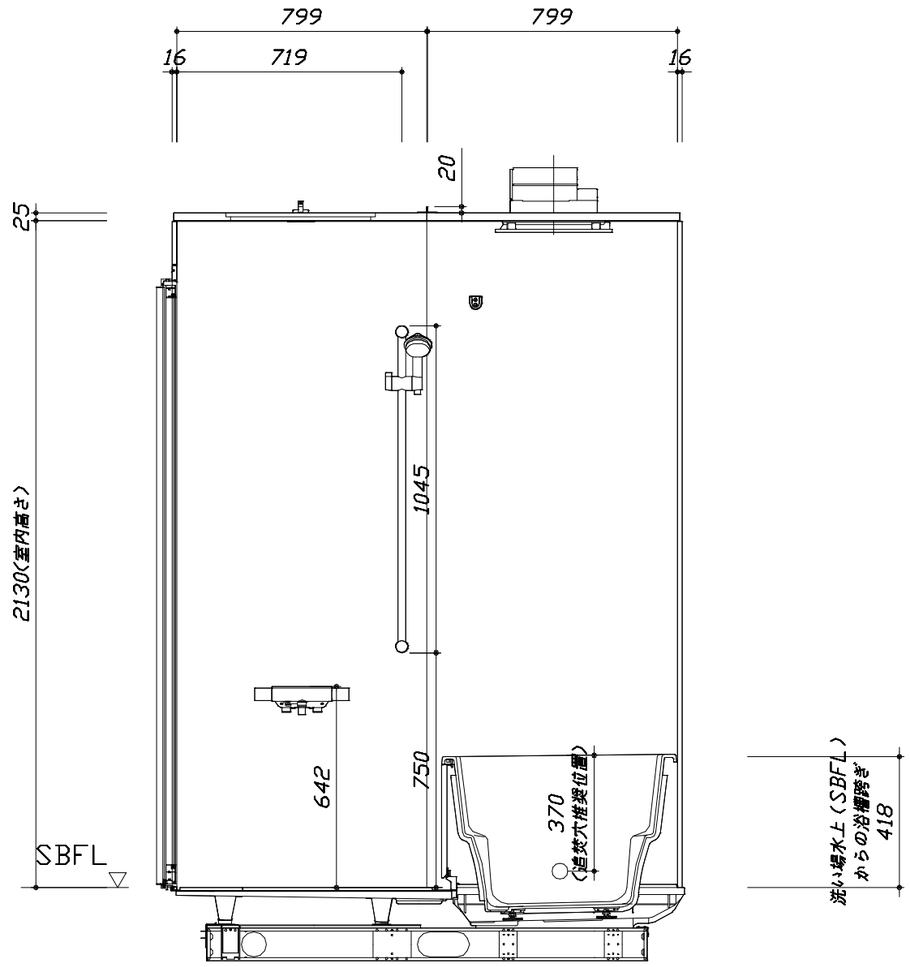

＜カウンター面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜−横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	施工図2	縮 尺： 1:20
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A−2404−0893T	作成日： 2024年8月31日	
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR	

縮尺：A3サイズ等倍

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細に
ついては注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
・天井の寸法はご確認お願いします。
・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。
・外寸は突出部を含みます。



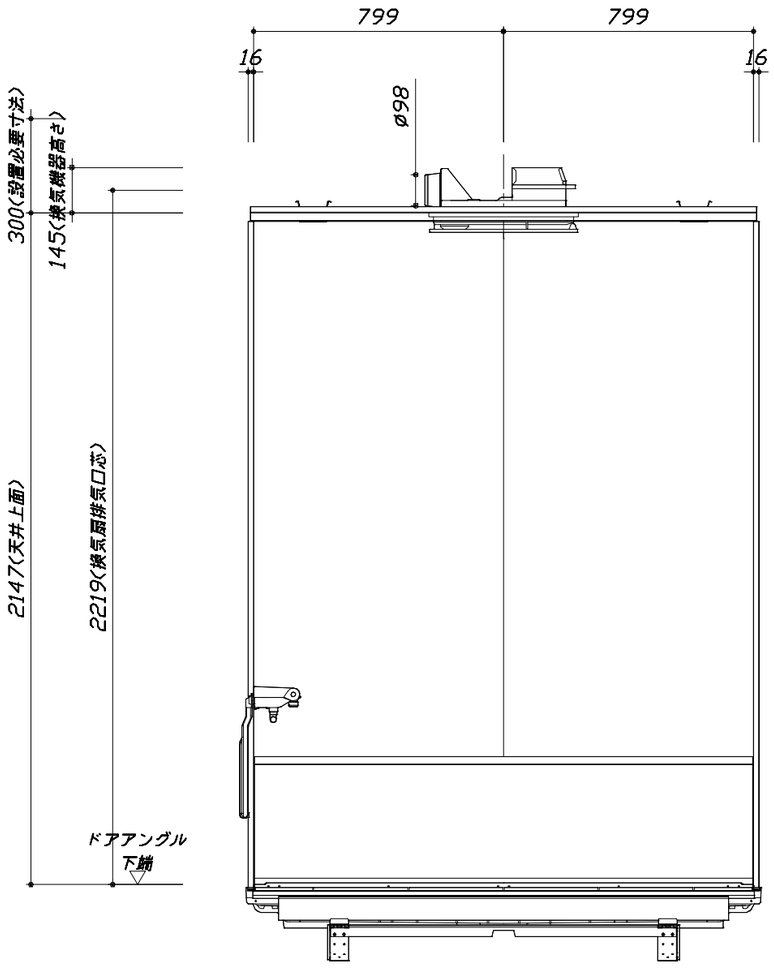

<浴槽側面図>

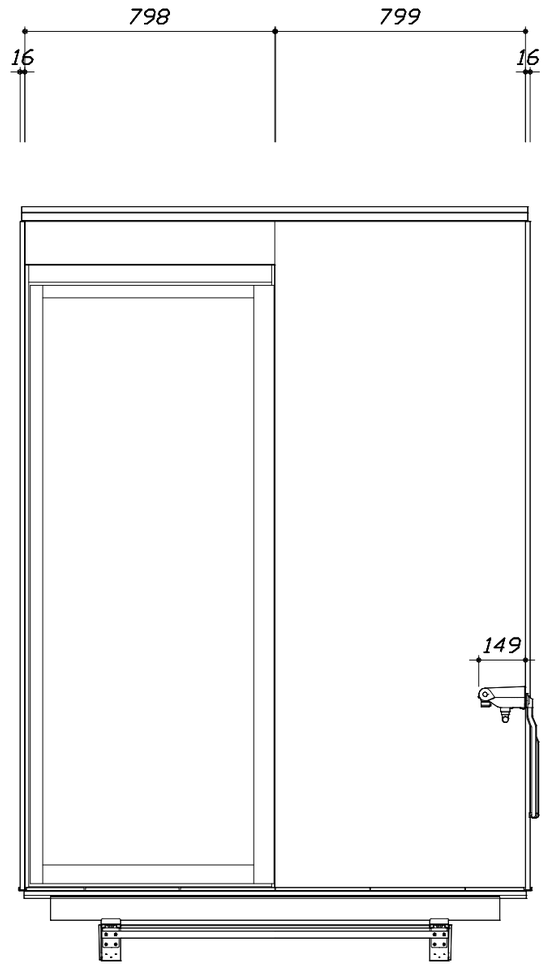

<洗場側面図>

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
265mm下がり
（クリア寸法含む）

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜ー横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	施工図3	縮 尺： 1:20
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日	
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR	

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1616サイズ(室内容量5.5立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(戸建用)：亜鉛メッキ鋼板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼　保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（310リットル）追い焚き穴:あり
浴槽パン	ガラス繊維強化樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング)　裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	ー
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー　裏面保温材　タオル掛け穴:なし
天井	高光沢ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	ｷｰﾌﾟｸﾘｰﾝﾄﾞｱ:19高さ開き戸(ｱﾙﾐ框/飛散防止ﾌｨﾙﾑ付強化ｶﾞﾗｽ/ﾀﾃ型換気口)
窓１	ー
窓２	ー
窓枠１	ー
窓枠２	ー
排水トラップ	洗い場:ＡＢＳ樹脂,　浴槽:ＡＳＡ樹脂　　封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ　VU50
製品重量	300kg

アクセサリー仕様表

ミラー	ー
収納棚	ー
タオル掛け	ー
洗場側水栓	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ(SB182-HB1)(樹脂ﾎｰｽ:ﾒﾀﾙ調)
浴槽側水栓	ー
兼用水栓	ー
ﾌｯｸ/ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰ	シャワーフックスライドバー（ｽﾗｲﾄﾞﾊﾞｰTN-1020）
照明	LEDダウンライト（LED 12.3W白色）（3灯）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機(100V･最大消費電力1250W)(ﾀﾞｸﾄ径φ98)（常時換気対応品)ホワイト
フロフタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	循環金具セットPLLX：ホース先端部G1/2袋ナット仕様
ハンドバー①	ー
ハンドバー②	ー
ハンドバー③	ー
ハンドバー④	ー
ハンドバー⑤	ー
ハンドバー⑥	ー
ハンドバー⑦	ー

本体カラー

浴槽	GN：シュガーライトグレー
カウンター	ー(カウンターなし)
ﾊﾟﾈﾙ(ｶｳﾝﾀｰ面)	MSG：スタッコグレー
ﾊﾟﾈﾙ(周辺･3面)	MSG：スタッコグレー
水栓上部ｶｳﾝﾀｰ	ー
浴槽エプロン	K：ブラック
洗場	HC：カームダークグレー
ドア / 天井	B：ブラック / HW：ホワイト
収納棚	ー
タオル掛け	ー
ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾｯﾄ	ホワイト

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　横浜－横浜SR　SB33様邸	ＧＲＡＮＳＰＡ　グランスパ	仕様表
	現場番号：　C3420942	プラン番号：　2701A-2404-0893T	作成日：　2024年8月31日
	横浜支店　販売課	担当営業　　：	担当アドバイザー：　横浜SR

基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕、建具工事などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

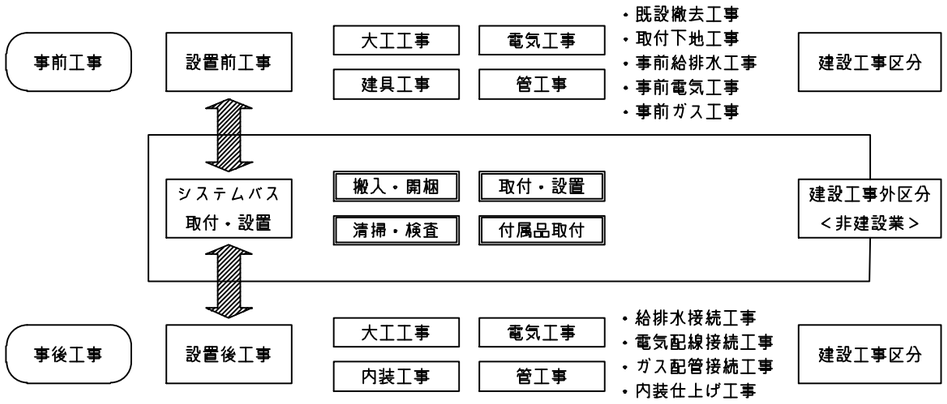

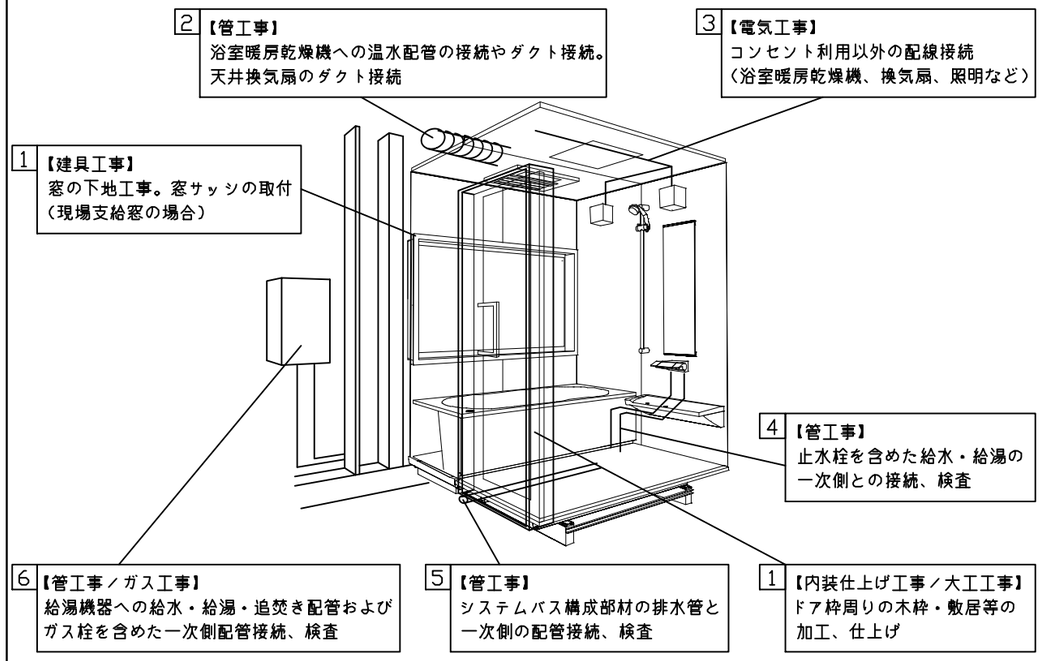

■システムバス　工事区分　　参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位（図）	業種区分	作業名称（区分）	建設工事 大工工事	建設工事 とび土工工事	建設工事 建具工事	建設工事 管工事	建設工事 電気工事	建設工事外 給湯機器設備	建設工事外 システムバス設置	作業内容
設置前工事		大工 土工 建具	設置基礎、設置床の工事	○	○						浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○					建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
	1	管	給排水配管事前工事				○				浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
	2		換気機器のダクト配管事前工事				○	○			浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
	3		給湯機器専用配管事前工事				○		□		風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
		電気	浴室専用電気配線事前工事					○			浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
システムバス本体取付・設置		建設工事外区分	架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置							□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トラップ・配管セットの取付・設置							□	洗い場・浴槽パンへの排水トラップ取付
			壁パネルの組立・設置							□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置							□	天井部材・浴槽部材の取付
			内装品、器具類の取付・設置　【注記 1】							□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付　【注記 1】							□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付　【注記 1】							□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付　【注記 1】						□	□	循環追焚き金具の取付
			浴室内給湯機器用リモコンの取付						□	□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付							□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付　【注記 1】							□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付							□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付　【注記 1】							□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充塡							□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充塡
			試運転・完成検査　【注記 2】							□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事			建築外壁の穴あけ	○			○				建築壁の躯体加工作業
	1	管 大工 電気	排気ダクトの敷設工事				○				浴室換気機器のダクト敷設工事
	2		浴室換気機器と排気ダクト接続工事				○				建築側ダクトと換気機器の接続、検査
	3		浴室換気機器の電気・アース接続工事					○			建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付				○	○			建築の外装仕上げ工事
	4	管	給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事				○				給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
	5		建築側排水配管との接続工事　【注記 3】				○				浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
	6		給湯機器本体工事（試運転・確認）				○		□		機器の設置工事（ガス、電気工事を含む）
	1	電気 他	内装仕上げ工事	○		○					床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
	3		浴室用電源配線、接続工事					○			浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事					○			浴室全体の電気器具、配線接続工事

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する
※【注記 3】浴室内への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　横浜−横浜SR　SB33様邸	GRANSPA　グランスパ	工事区分表
	現場番号：　C3420942	プラン番号：　2701A−2404−0893T	作成日：　2024年8月31日
	横浜支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：　横浜SR

■ 排水配管工事注意事項

●雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
●2重トラップにしないでください。
●配管途中で配管径を狭めないでください。
●排水勾配は1/100～1/50設けてください。
●排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
●立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項

●給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
●給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
●給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。

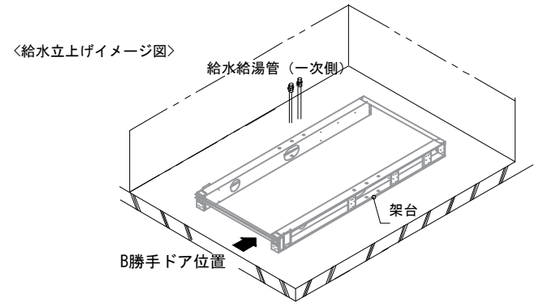

■土間コンクリート仕上げ寸法
ドアアングル下端より２６５mm下がりで打設してください。



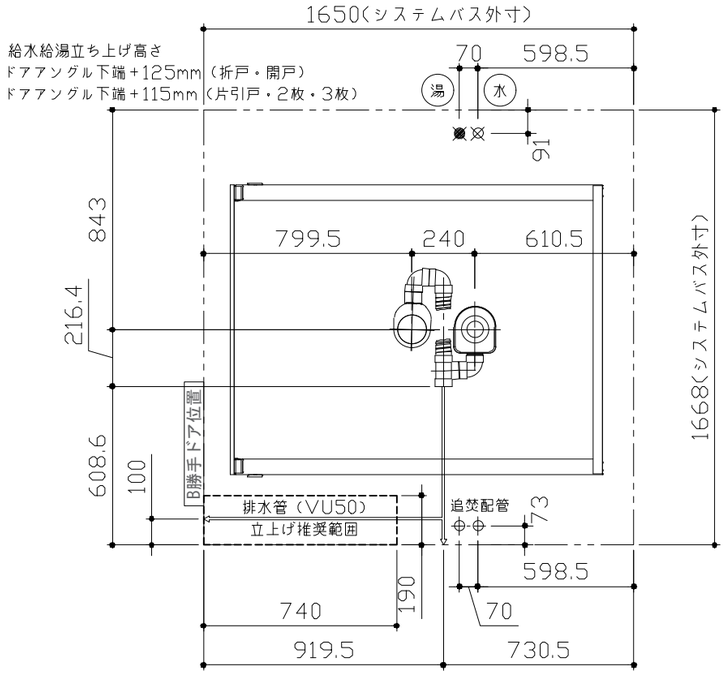

■設備記号

記号	記号の意味
⊠	給水位置
⊠	給湯位置



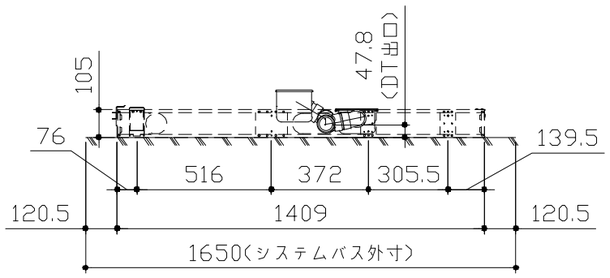

〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

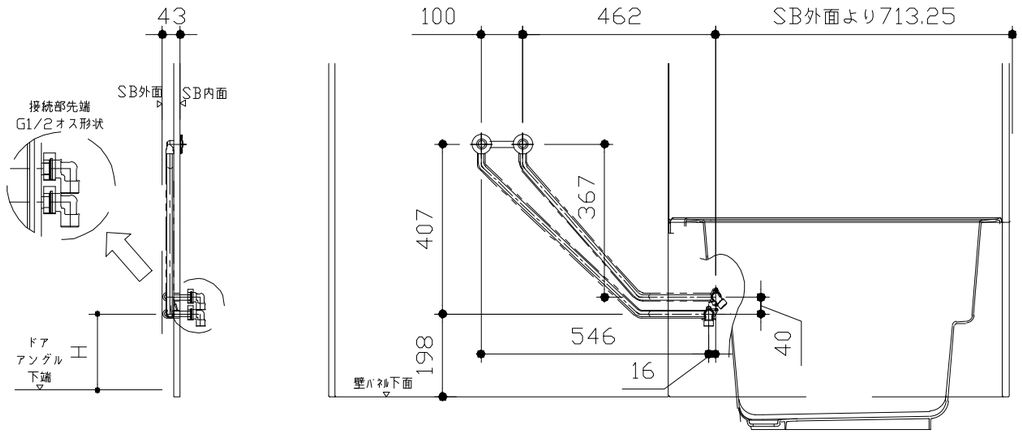

ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・２枚引戸・３枚引戸	173

〈給水給湯管取合詳細図〉

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	排水配管図
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR

■必ずご確認ください
（１）図面の見方
・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
・マス表示：□=20mm角

（２）留意事項
・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。

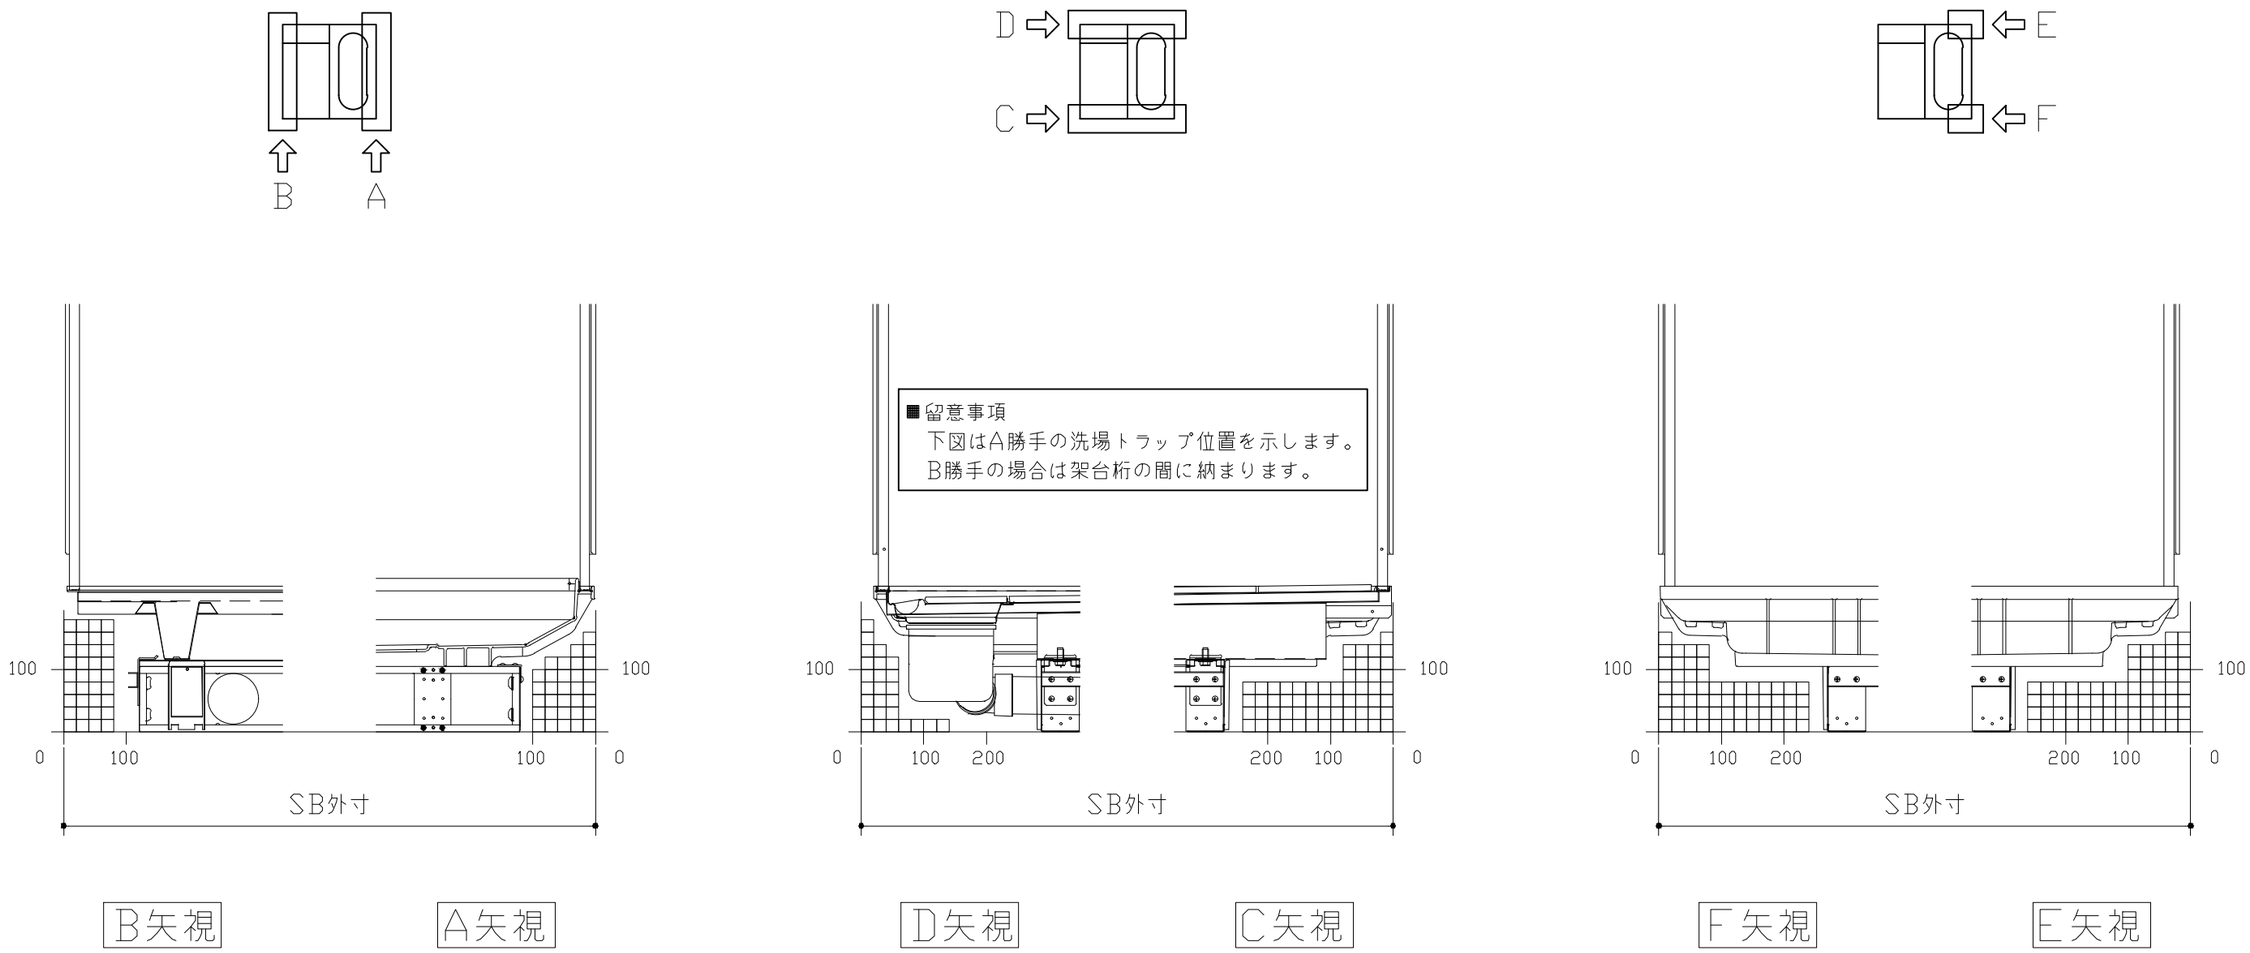

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜−横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	床下空間図
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口

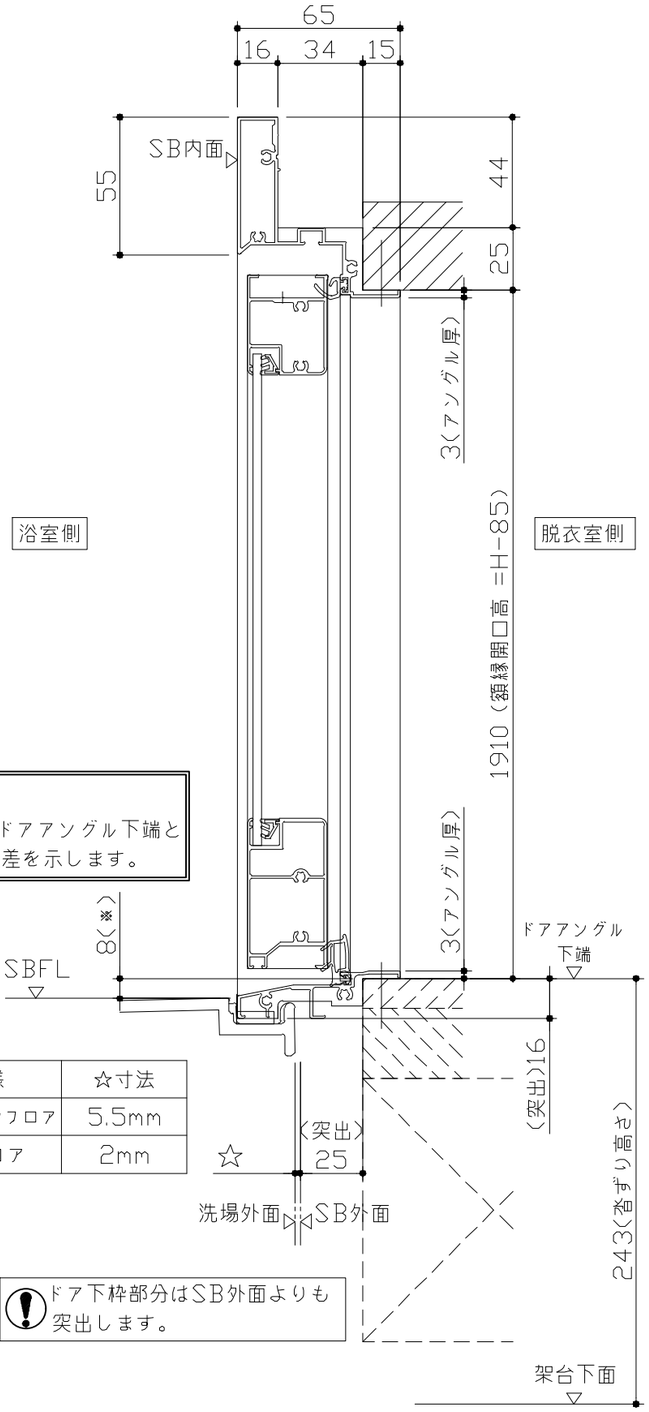

■留意事項
※印寸法はドアアングル下端とSBFLの段差を示します。

ドア仕様	☆寸法
キープクリーンフロア	5.5mm
FRPフロア	2mm

ドア下枠部分はSB外面よりも突出します。

有効開口寸法720mm

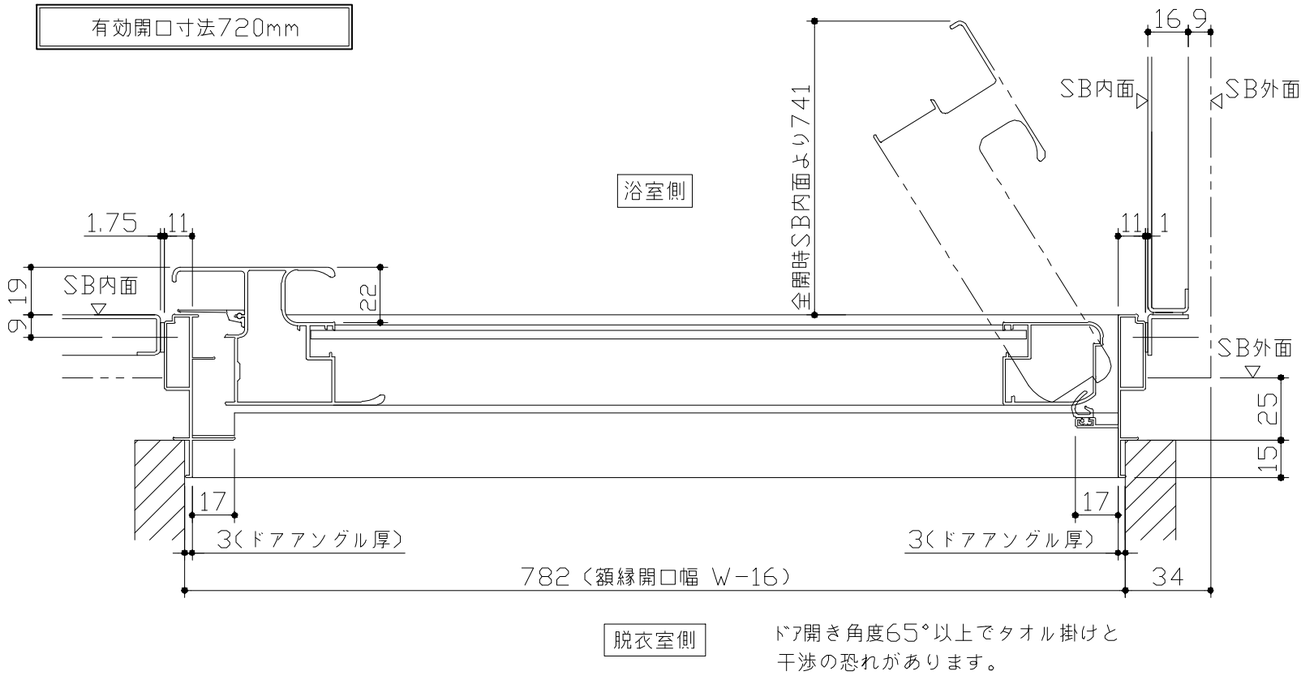

ﾄﾞｱ開き角度65°以上でタオル掛けと干渉の恐れがあります。

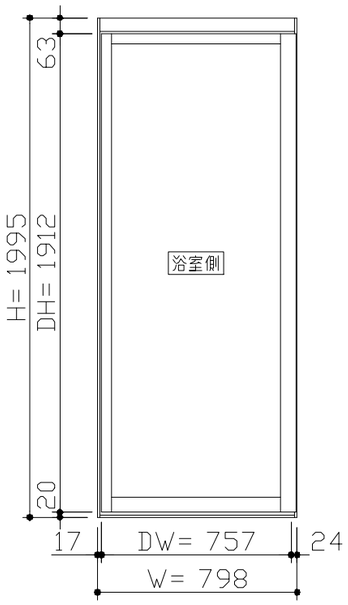

〈姿図〉

■ドア横の管柱、間柱について
- ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

〈参考寸法図〉



Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	ドア取合詳細図
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR

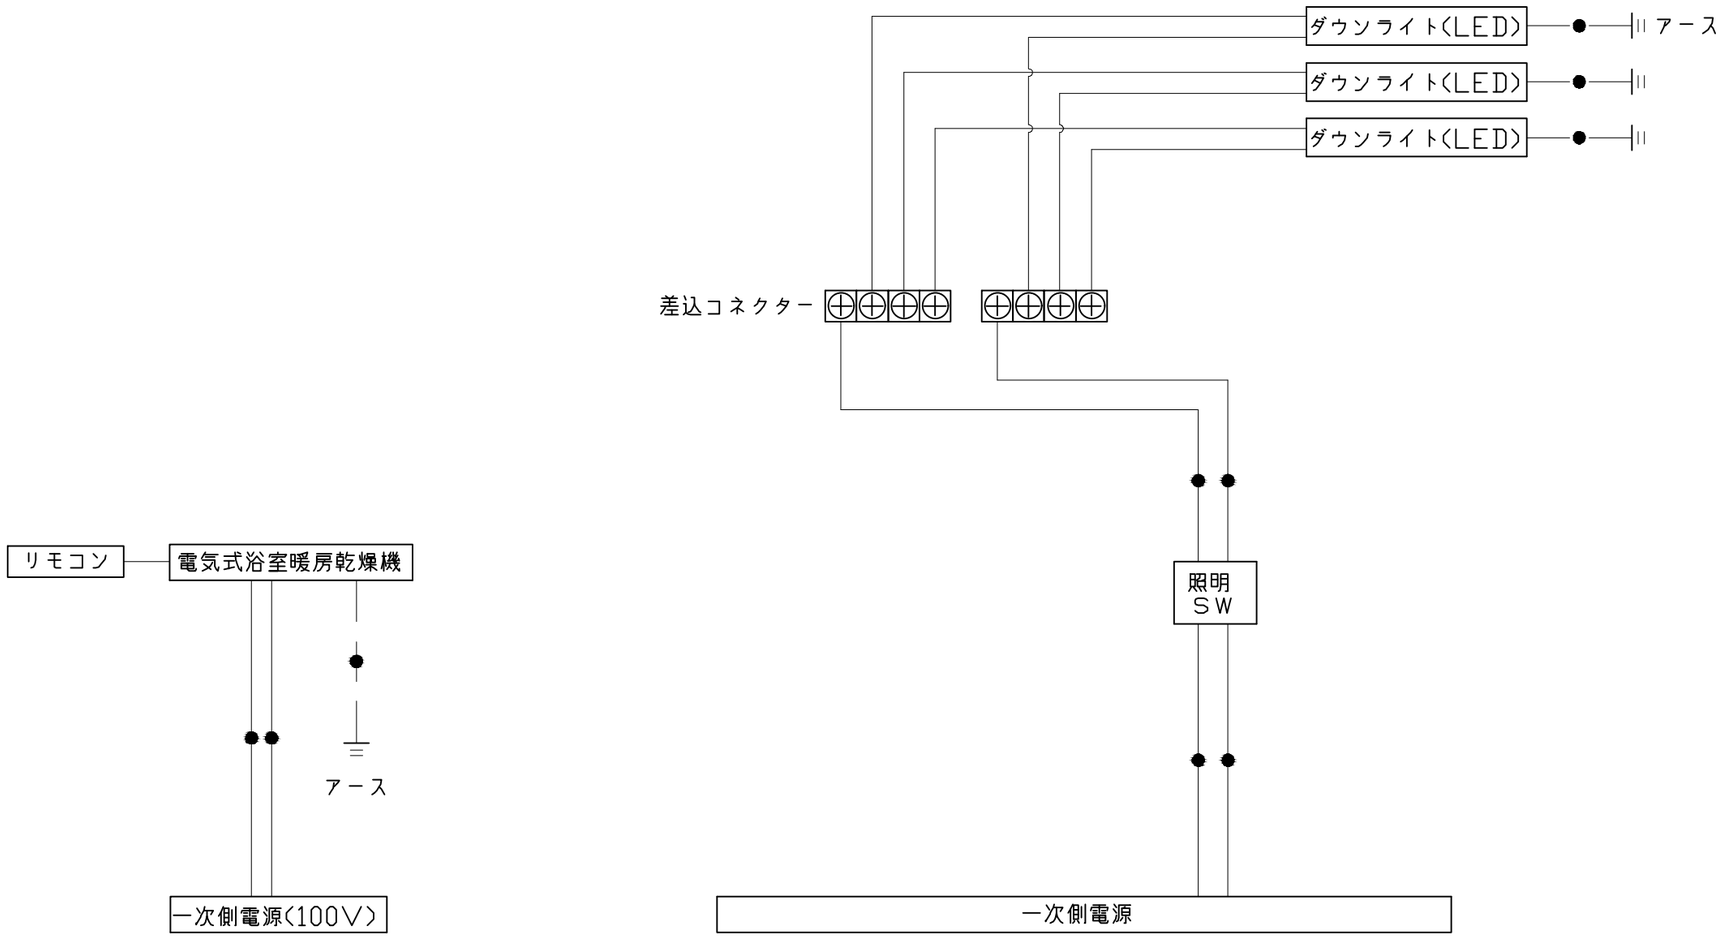

※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、
電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地（アース）工事を行ってください。
→アースが不完全な場合、感電の原因になります。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜−横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	電気配線図
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR

浴槽

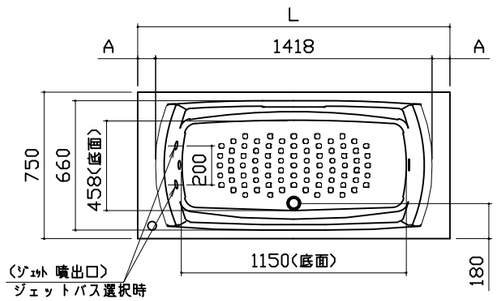

SB 奥行寸法	浴槽奥行寸法 L	浴槽奥行寸法 A
1568	1495	38.5
1593	1520	51
1618	1545	63.5
1643	1570	76
規格 1668	1595	88.5
1693	1620	101
1718		
1743		
1768		
1793		
1818		
1843		
1868		

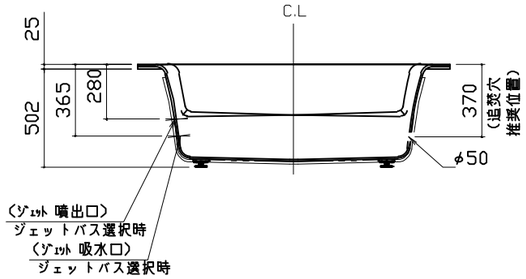

本図は参考図面です

洗い場用水栓

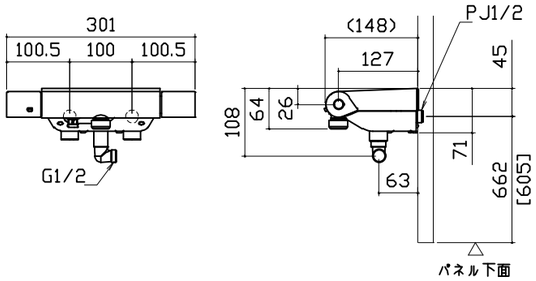

※[ ]内寸法はカウンターが無い場合

照明

ダウンライト
LED 3.1W (1灯あたり)

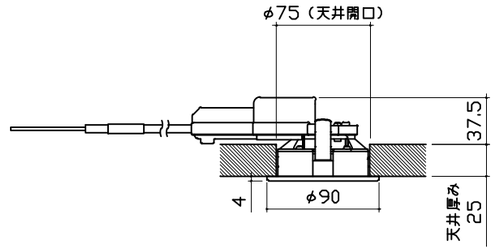

換気機器

リモコンコード長さ：5m
外形：縦120mm×横116mm

管工事

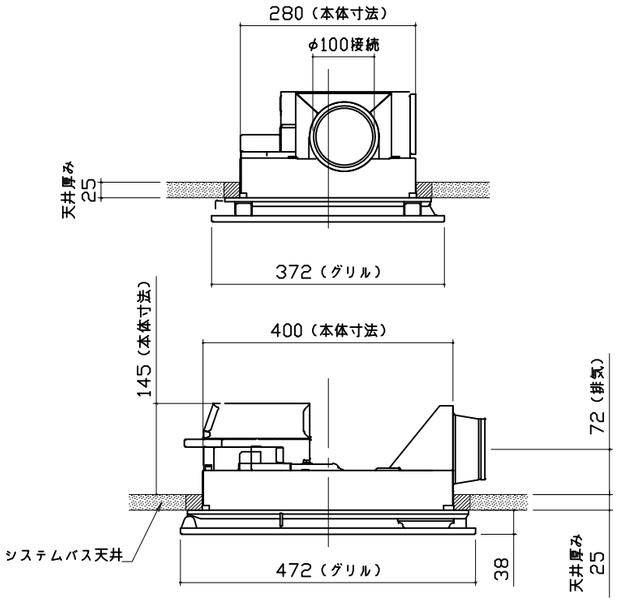

シャワーフックスライドバー

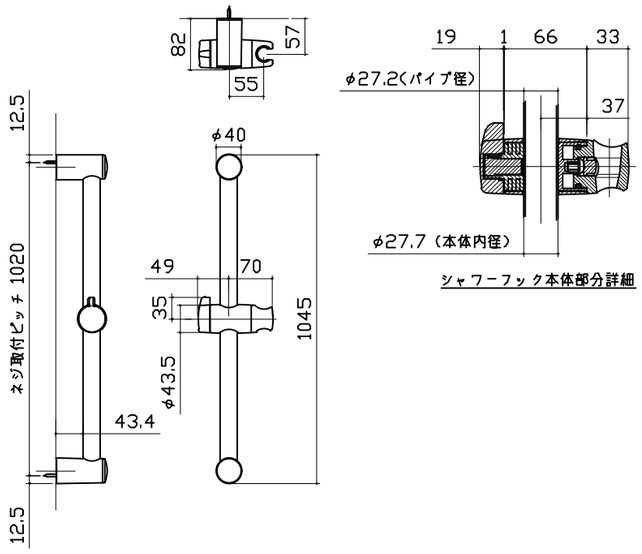

循環金具・フロアダプタ関連

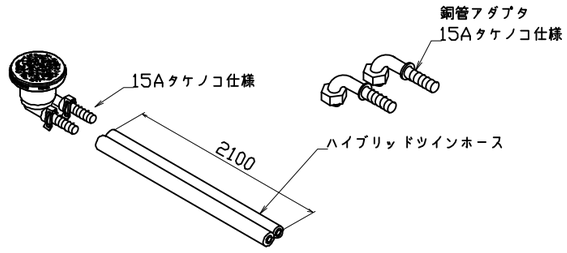



追焚配管立上図

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜−横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	部材詳細図 1/2
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR

風呂蓋　ﾌﾛｱﾀMVA-16W	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ
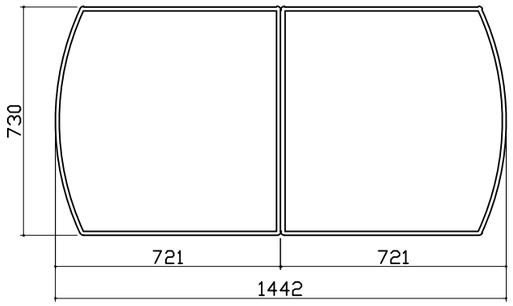  断面図	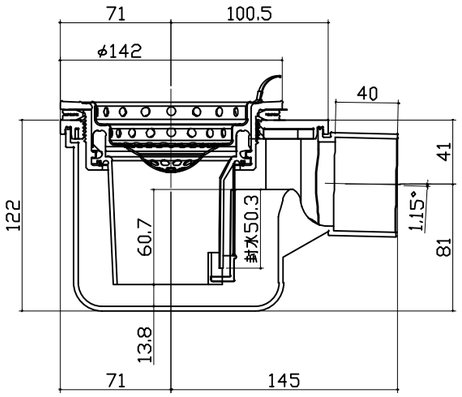	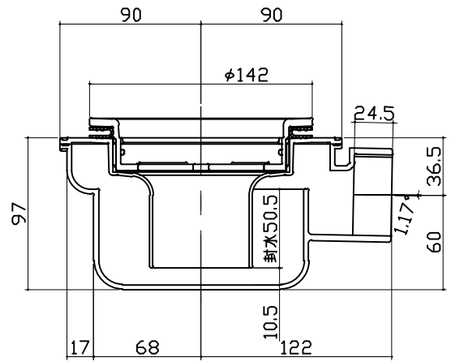

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　横浜−横浜SR　SB33様邸	GRANSPA　グランスパ	部材詳細図	2/2
	現場番号：　C3420942	プラン番号：　2701A-2404-0893T	作成日：　2024年8月31日	
	横浜支店　販売課	担当営業　：	担当アドバイザー：　横浜SR	

パネル割図

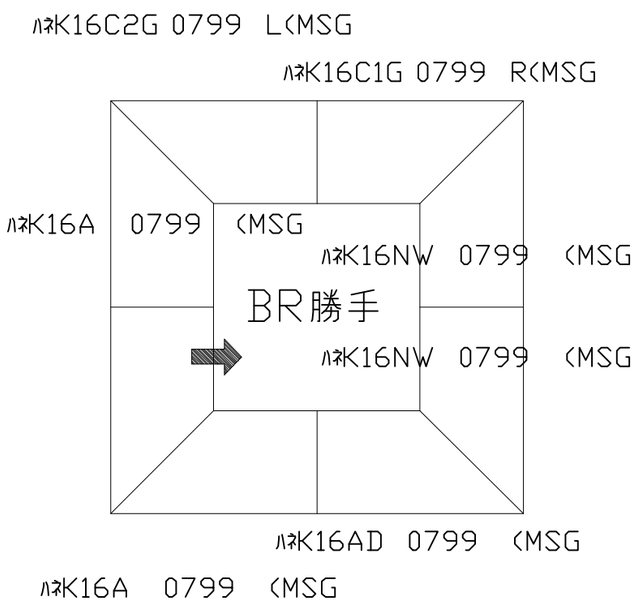

シャワーフックスライドバー

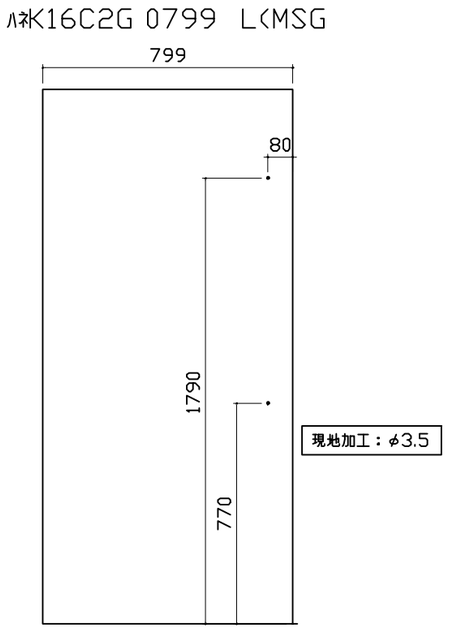

洗い場水栓取付穴

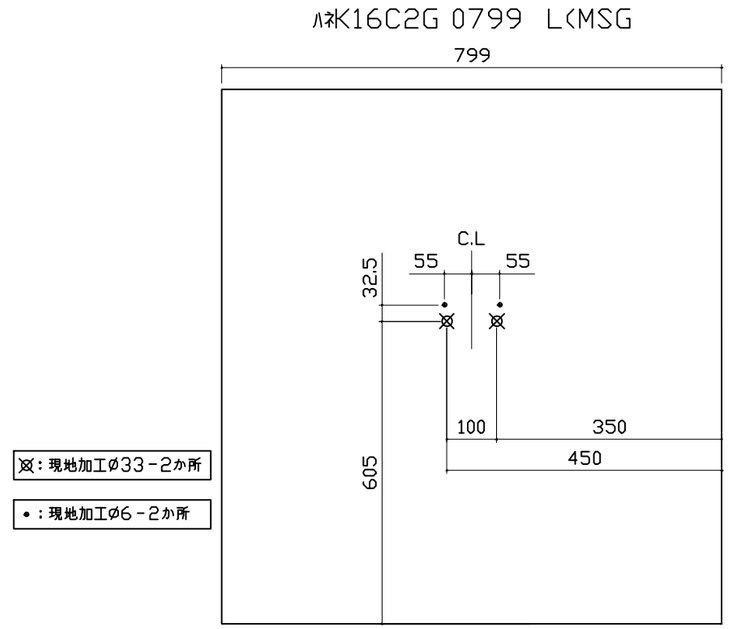

ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｲﾌﾟ

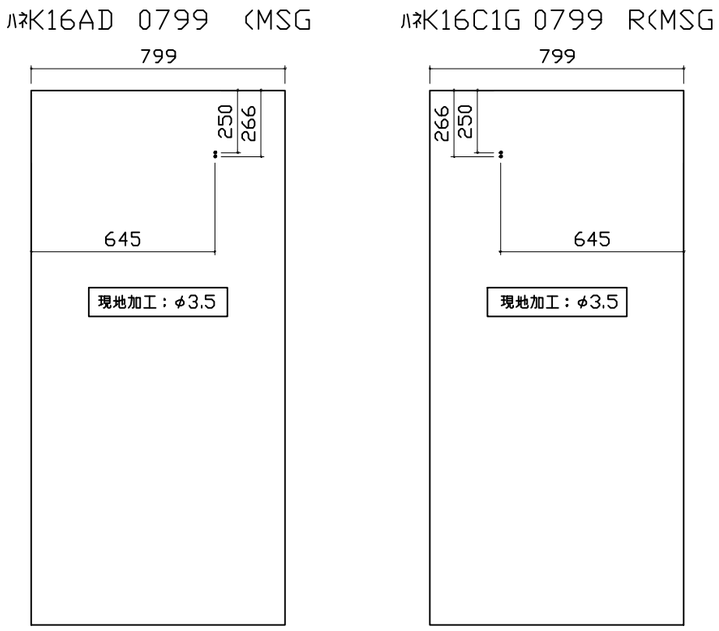

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 横浜－横浜SR SB33様邸	GRANSPA グランスパ	穴開け指示図 1/1
	現場番号： C3420942	プラン番号： 2701A-2404-0893T	作成日： 2024年8月31日
	横浜支店 販売課	担当営業 ：	担当アドバイザー： 横浜SR
