システムバス 御見積書

御名前　青森-弘前SR SB5　様

業者　様

商品名　GRANSPA　グランスパ

商品
御見積金額　¥753,100　（税込 ¥828,410）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

※　商品御見積金額には商品組付費が含まれております。
※　給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日　2024年8月25日
ﾌﾟﾗﾝ番号　2510B-2405-0100T
現場番号　C4023380

タカラスタンダード株式会社
◆青森支店
青森県青森市中央1丁目23番1号
TEL 017-776-1121 / FAX 017-776-3499

◆青森ショールーム
TEL 017-776-1125 / FAX 017-776-0205

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
	FRP×KCF	SB-5

◆ 御見積仕様

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616（BL勝手）
洗い場仕様	キープクリーンフロア:ハイクラス
洗い場カラー	カームダークグレー
浴槽材質	FRP
浴槽カラー	ホワイト
浴槽形状	スクエア浴槽
カウンター材質	ー
カウンター/下カバーカラー	ー
浴槽前カウンターカラー	ー
エプロン材質/カラー	樹脂　/　ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー（正面）	ブリックダーク
パネルカラー（周辺）	ホワイト
ガス種　/　周波数	未定　/　50Hz

◆ 備考

◆ 御確認事項

No.*

御名前 青森-弘前SR SB5 様

現場番号	C4023380	プラン番号	2510B-2405-0100T	作成日	2024/8/25

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	グランスパ 1616サイズ		1	761,000	761,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸＜800幅＞(ブラック)／樹脂ガラス(半透明)(2Oサイズ)	1	+26,500	+26,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	B勝手・移動なし・1面デザイン・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームダークグレー)	1		
7	排水口カバー	ステンレス	1		
8	浴槽	FRP(高断熱浴槽)(ホワイト)	1	−85,000	−85,000
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	FRP浴槽用保温材なし(ホワイト)	1		
11	浴槽形状	FRPスクエア浴槽	1		
12	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
13	浴槽パン	なし	1		
14	洗い場用水栓	サーモ水栓:樹脂製ホース(メタル調)KF3000LHCN	1	+7,000	+7,000
15	洗い場用水栓	ｴｺｼｬﾜｰ(節水+手元止水+3Way):KF3000LHCE	1	+13,000	+13,000
16	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
17	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	−51,000	−51,000
18	シャワーフックスライドバー	なし	1	−5,000	−5,000
19	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kパネル)	1		
20	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
21	天井	カラーフラット天井(チャコールブラック)	1		
22	換気機器	天井換気扇ブラック	1	+3,000	+3,000
23	換気機器開口	工場開口	1		
24	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	−3,000	−3,000
25	天井照明開口	工場開口	1		
26	ミラー	マグネットショートミラー	1	−3,000	−3,000
27	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+3,000	+3,000
28	タオル掛け	タオル掛けなし	1	−1,000	−1,000
29	収納棚	収納棚なし	1		
30	どこでもラック	シャワーフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
31	給水給湯管	洗い場1水栓	1		

御名前 青森-弘前SR SB5 様

現場番号	C4023380	プラン番号	2510B-2405-0100T	作成日	2024/8/25

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
33	トラップカバー	浴槽側トラップカバー（浴槽パンなし）	1		
	システムバス合計		33		¥667,600

商品総合計		33	¥667,600

	商品組付費	数量	金額
1	本体組付費	1	85,500
	商品組付費合計		¥85,500

商品御見積金額	¥753,100

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。
※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

パース

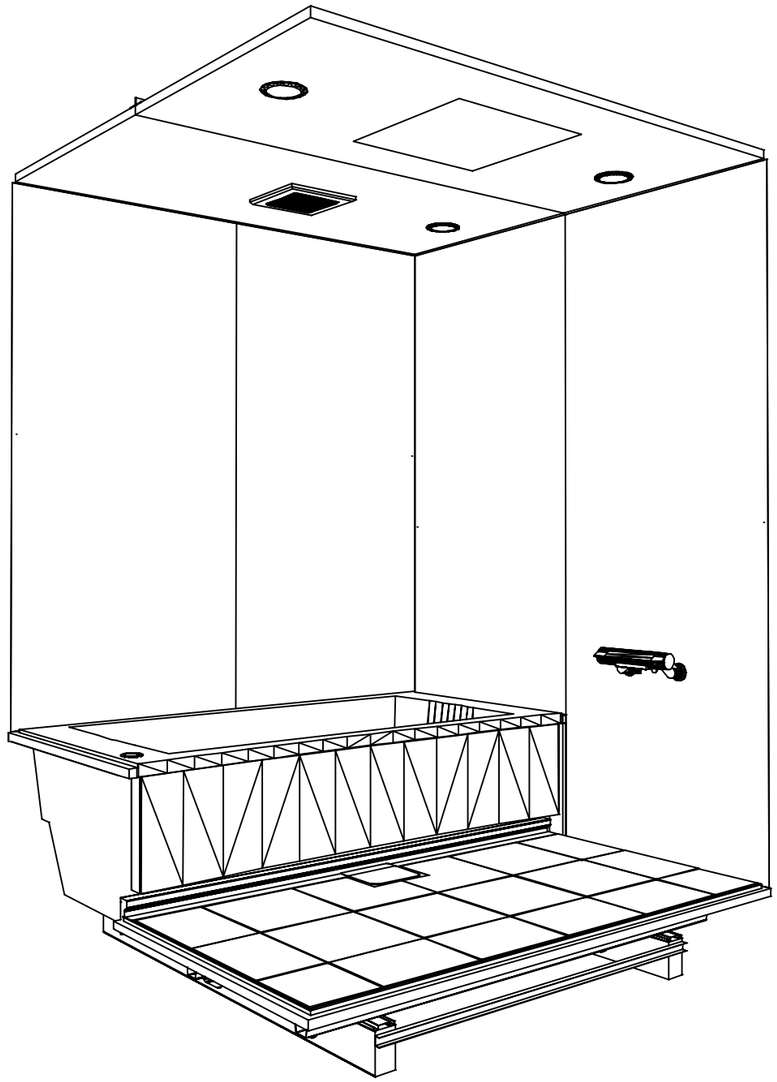

鳥瞰図

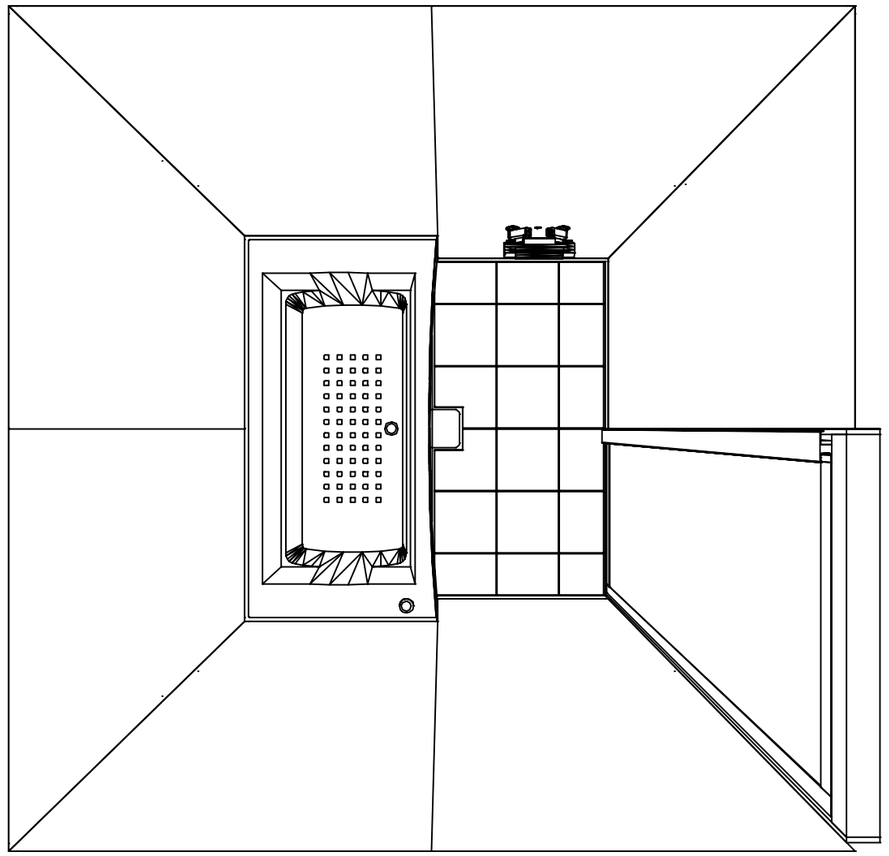

1616

フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 青森−弘前SR SB5様邸	GRANSPA グランスパ	姿図
	現場番号： C4023380	プラン番号： 2510B−2405−0100T	作成日： 2024年8月25日
	青森支店	担当営業 ：	担当アドバイザー： FRP×KCF

縮尺：A3サイズ等倍
